


|  |   |                                    |          |                |
|--|---|------------------------------------|----------|----------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>GENERAL DE BOYACÁ | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 1 de 10 |
|  | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|  | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|  | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |

|                |  |
|----------------|--|
| DEPENDENCIA    | SECRETARÍA GENERAL   |
| RADICADO       | D – 25 – 045   |
| IMPLICADO      | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO   |
| DENUNCIANTE    | JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA   |
| FECHA DENUNCIA | 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025  |
| ASUNTO         | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONFORME A LA LEY 1757 DE 2015 Y RESOLUCIÓN INTERNA 072 DE 2023 |

**INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA N° 002**  
(16 de enero de 2026)

**I. ANTECEDENTES**

El día 9 de septiembre de 2025 se recepcionó denuncia mediante traslado efectuado por la Gerencia Departamental Colegiada Boyacá de la Contraloría General de la República, la cual fue presentada por el señor JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA (folios 1-) dando cuenta de presuntas irregularidades respecto de la ejecución del Convenio Interadministrativo N°2772 de 2023 suscrito entre el departamento de Boyacá y el municipio de Sogamoso PARA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO” - Proceso Contractual N°CD-2872-2023, relacionado con el alumbrado público para la vía El papayo – El cruce en el municipio de Sogamoso, cuyo objeto era el mejoramiento de la infraestructura eléctrica rural. Dicho trámite fue identificado inicialmente por este Ente de Control Fiscal bajo el Radicado CGB N° 20251103096.

Adjunto al traslado se allegaron 24 archivos, entre ellos el traslado de la Contraloría General de la República, los datos básicos de la denuncia, el traslado efectuado por la Policía Nacional, el CDP expedido por el municipio de Sogamoso, el CDP expedido por la Gobernación, el Certificado del origen de los recursos, el Convenio, los Estudios previos, los Informes de supervisión del Convenio y el Acta de suspensión (166 folios digitales).

El 29 de septiembre se comunicó el Auto S.G. N°045 que avoca conocimiento (folio 5) respecto de las presuntas irregularidades fiscales puestas en conocimiento por el señor JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA.


**II. DE LA DENUNCIA**

En el traslado efectuado por la Gerencia Departamental Colegiada Boyacá de la Contraloría General de la República contenía la denuncia realizada por el señor JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA (folio 1) se manifestó lo siguiente:

|         |                                       |        |                                      |        |                                      |
|---------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| FIRMA   |                                       | FIRMA  |                                      | FIRMA  |                                      |
| ELABORÓ | <i>Eliana Carolina Sánchez Forero</i> | REVISÓ | <i>César David Buitrago Velandia</i> | APROBÓ | <i>César David Buitrago Velandia</i> |
| CARGO   | Profesional Universitario             | CARGO  | Secretario General                   | CARGO  | Secretario General                   |

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá  
Teléfono: 608 - 7405880  
[cgb@cgb.gov.co](mailto:cgb@cgb.gov.co) / [www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co)

**mipg**

|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 2 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |

"A través de la llamada recepcionada por la Línea Anticorrupción 157 de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, un ciudadano se identificó como José Ignacio Álvarez Ponguta, el cual manifestó denunciar unos posibles hechos asociados a la corrupción, señalando al exalcalde Rigoberto Alfonso del Municipio de Sogamoso, Boyacá, donde las irregularidades en el contrato de alumbrado público para la vía el Papayo - Crucero en Sogamoso, con una inversión aproximada de Dos Mil Noventa y Ocho Millones de Pesos \$2.098.000.000, en donde su objeto era el mejoramiento de la infraestructura eléctrica rural en la instalación de "382 iluminarias" SIC a lo largo de 12.5 kilómetros de distancia. Su financiación provino de la Gobernación de Boyacá, asignándole un valor de Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones de pesos \$1.498.000.000 y el aporte por la Alcaldía de Sogamoso fue entonces de Seiscientos Millones de pesos \$600.000.000.

Indica el denunciante que el proyecto no se ejecutó en su totalidad, pues, aunque se evidenció la instalación de unos postes de iluminarias no se realizó el montaje de las subestaciones de media tensión, lo que dejó inconcluso el contrato, adjudicado bajo la modalidad de contratación directa, dejando interrogantes sobre la obtención de recursos y la ejecución de los mismos".

#### ASPECTOS DE INTERÉS:

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2772 DE 2023, número de proceso CD-2872-2023.
- Objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"
- Contratante Gobernación de Boyacá
- Contratista municipio de Sogamoso
- Interventor SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
- Valor del contrato DOS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS (\$2.098.774.106,00)
- Plazo de ejecución CINCO (5) meses
- Fecha acta inicio de contrato 04 de julio de 2023
- Fecha acta de liquidación de convenio 07 de mayo de 2025
- Presuntamente no se instalaron las subestaciones de media tensión para el óptimo funcionamiento de las iluminarias."

### III. DE LO ACTUADO

3.1.- Mediante Auto S.G. N°045 del 29 de septiembre de 2025 (folio 5-7) se avocó conocimiento respecto de las presuntas irregularidades fiscales puestas en conocimiento por el señor JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ PONGUTA; trasladadas por la Gerencia Departamental Colegiada Boyacá de la Contraloría General de la República; así mismo, se ordenó librar los requerimientos a que hubiera lugar, en aras de obtener el material probatorio necesario y pertinente para dar respuesta de fondo a la respectiva denuncia.

3.2.- Mediante Oficio SG-2025-748 del 24 de octubre de 2025 (folio 9) se solicitó a la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales para que emitiera concepto técnico relacionado con el Convenio Interadministrativo N°2772 de 2023 suscrito entre el departamento de Boyacá y el municipio de Sogamoso PARA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO" - Proceso Contractual N°CD-2872-2023, alumbrado público para la vía El papayo – El crucero en el municipio de Sogamoso cuyo objeto era el mejoramiento de la infraestructura eléctrica rural".


### IV. DE LO ALLEGADO

4.1.- Atendiendo a la solicitud del numeral del acápite anterior, el día 16 de diciembre de 2025 se allegó Informe DOOCVCA N°111 proveniente de la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales (folio 10-13).

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá  
Teléfono: 608 - 7405880  
[cgb@cgb.gov.co](mailto:cgb@cgb.gov.co) / [www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co)

mipg



|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 3 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |

## **V. PROCEDIMIENTO APLICABLE DESDE LA SECRETARÍA GENERAL TRÁMITES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL FISCAL**

La misión de la Contraloría General de Boyacá es la de vigilar que los administradores facultados por la Ley utilicen con: eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, legalidad, objetividad y responsabilidad los recursos destinados para los planes y programas propuestos, velando por la buena gestión del correcto uso del patrimonio público.

Que el artículo 267 de la Constitución Política otorga la función del control fiscal a la Contraloría General de la República, con el propósito de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Que el artículo 272 de la Constitución Política faculta a los Contralores Departamentales para ejercer en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268.

En cuanto al control posterior y selectivo del que hace referencia el Decreto 403 de 2020 en su Título VI, los definió como:

*"la fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, con el fin de determinar si las actividades, operaciones y procesos ejecutados y sus resultados se ajustan a los principios, políticas planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado. Este tipo de control se efectuará aplicando el principio de selectividad..."*

En lo que respecta a la vigilancia de la Gestión Fiscal del Estado, el Decreto 403 en su artículo 3° establece que dicha vigilancia se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, concurrencia, la equidad, desarrollo sostenible, coordinación, disuasión, integridad, oportunidad y la valoración de los costos ambientales de tal manera que permita determinar en la administración, en un periodo determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados.

La Ordenanza 039 de 2007, artículo g numeral 3°, presupuestan como funciones de la Secretaría General, entre otras, la promoción de los mecanismos de participación ciudadana para el adecuado ejercicio de control y vigilancia fiscal.


En esta etapa procesal es menester traer a colación lo dispuesto por los artículos 69° y 70° de la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Ciudadana, e introdujo en el ordenamiento jurídico en materia fiscal, lo siguiente:

*"(...) ARTÍCULO 69°. La denuncia. Definición en el control fiscal. La denuncia está constituida por la narración de hechos constitutivos de presuntas irregularidades por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, puestos en conocimiento de los organismos de control fiscal, y podrá ser presentada por las veedurías o por cualquier ciudadano.*

*ARTÍCULO 70°. Del procedimiento para la atención y respuesta de las denuncias en el control fiscal. La atención de las denuncias en los organismos de control fiscal seguirá un proceso común, así:*

- a) Evaluación y determinación de competencia;
- b) Atención inicial y recaudo de pruebas;
- c) Traslado al proceso auditor, responsabilidad fiscal o entidad competente;
- d) Respuesta al ciudadano."



|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 4 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |

Es claro que dicho artículo dispone un objeto dentro de esta etapa pre-procesal, encaminada a determinar la posibilidad de que se promueva o no la acción fiscal.

Así las cosas, propone que es necesario profundizar en uno o varios supuestos a saber; se determinará competencia de esta Contraloría Territorial, se recaudarán pruebas y valorarán para emitir un informe de fondo en sede de participación ciudadana y con ello dar respuesta de fondo al denunciante, dejando la claridad que en este punto no se surte un proceso de responsabilidad fiscal formal, puesto que el mismo sólo surgiría cuando haya lugar a trasladar el informe aludido a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General Boyacá, la cual es la dependencia competente para tal efecto.

En caso tal de estipularse un hallazgo con presunto alcance fiscal, se dará traslado a la oficina competente y, se dará una respuesta al ciudadano denunciante.

En esa medida, esta Secretaría se estará a lo allí consignado y atinará a establecer si con la denuncia y la documental allegada estos postulados se materializan, con el fin de dar traslado a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, o si por el contrario los hechos luego del estudio previo como resultado de este finalizan en el marco del archivo de las diligencias, sin dejar de lado el axioma de reapertura procesal, que bastante estudio ha tenido en sede de la Corte Constitucional y que ha dejado en claro que el archivo no es un acto absoluto. – Este particular en caso de ser necesario se estudiará más adelante.

## **VI. SUPUESTOS DE LA ACCIÓN FISCALIZADORA EN SEDE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

### **6.1. - DE LA COMPETENCIA**


La Secretaría General de la Contraloría General de Boyacá es competente para conocer y resolver de fondo la presente denuncia fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución Política, artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015, artículo 4° del Decreto Ley 403 de 2020 y Resolución interna 072 de 2023.

El municipio de Sogamoso es un ente territorial perteneciente al Departamento de Boyacá y, de conformidad con la Resolución Interna N° 571 de 2023 se encuentra definido como sujeto de control de la Contraloría General de Boyacá; por lo tanto, se concluye que este Ente de Control Fiscal es competente para conocer y adelantar el trámite de la presente Denuncia Fiscal en sede de participación ciudadana.

### **6.2. - DE LA OCURRENCIA DE LA CONDUCTA**

Esta dependencia acoge lo determinado en el Informe DOOCVCA N°111 proveniente de la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales en aras de esclarecer los hechos avocados respecto del análisis fiscal del Convenio Interadministrativo N°2772 de 2023 suscrito entre el departamento de Boyacá y el municipio de Sogamoso PARA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO" - Proceso Contractual N°CD-2872-2023, alumbrado público para la vía El papayo - El crucero en el municipio de Sogamoso, como se muestra a continuación:



|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 5 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |

"Indica el denunciante que el proyecto no se ejecutó en su totalidad, pues, aunque se evidenció la instalación de unos postes de iluminarias no se realizó el montaje de las subestaciones de media tensión, lo que dejó inconcluso el contrato, adjudicado bajo la modalidad de contratación directa, dejando interrogantes sobre la obtención de recursos y la ejecución de los mismos".

#### ASPECTOS DE INTERÉS:


- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2772 DE 2023, número de proceso CD-2872-2023.
- Objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO".
- Contratante: Gobernación de Boyacá.
- Contratista: Municipio de Sogamoso.
- Interventor: SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE.
- Valor del contrato: DOS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS (\$2.098.774.106,00).
- Plazo de ejecución: CINCO (5) meses.
- Fecha acta inicio de contrato: 04 de julio de 2023.
- Fecha acta de liquidación de convenio: 07 de mayo de 2025.
- Presuntamente no se instalaron las subestaciones de media tensión para el óptimo funcionamiento de las iluminarias".

Con relación a lo mencionado en la denuncia "que el proyecto no se ejecutó en su totalidad", la Dirección de Obras Civiles se traslada al tramo de instalación de luminarias sector El Crucero en el municipio de Sogamoso y procede a contar cada uno de ellos, con el fin de verificar y validar las cantidades del acta de entrega y recibo final de fecha del 04 de febrero de 2025.

| MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA<br>PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  |   | S.G.C.  |                          |                  |                   |
|--|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|
| NIT: 891 855 130   | CÓDIGO: MGI-01-07-F-27  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL | FECHA: 2011/12 VERSIÓN 1 |                  |                   |
| TIPO DE CONTRATO   | OBRA  |   |                          |                  |                   |
| CONTRATO No.   | 20230944  |   |                          |                  |                   |
| CONTRATISTA  | IGS INGENIERIA E U  |   |                          |                  |                   |
| OBJETO   | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ   |   |                          |                  |                   |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  | MUNICIPIO DE SOGAMOSO - SECTOR VÍA EL CRUCERO   |   |                          |                  |                   |
| INTERVENTOR  | NUS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S   | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.                         | 20230913                 |                  |                   |
| SUPERVISOR   | IVÁN DARIO RAMÍREZ SANABRIA   |   |                          |                  |                   |
| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO   |   |   |                          |                  |                   |
| PLAZO ACTUAL   | 7 MESES Y 29 DÍAS   |   |                          |                  |                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN   | 18 DE DICIEMBRE DE 2024   |   |                          |                  |                   |
| VALOR EJECUTADO  | \$ 2.963.962.290,43   |   |                          |                  |                   |
| LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025   |   |   |                          |                  |                   |
| LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS |   |   |                          |                  |                   |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS   |   |   |                          |                  |                   |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD  | CANTIDAD                 | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL       |
| 1.01   | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  | Kilómetro   | 18,507                   | \$ 2.241.582,30  | \$ 37.001.799,03  |
| 1.02   | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN   | Unidad  | 304                      | \$ 1.179.813,11  | \$ 358.663.185,44 |
| 1.03   | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M 1050 KG EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN  | Unidad  | 86                       | \$ 1.717.213,11  | \$ 147.680.327,46 |
| 1.04   | PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (2000 PSI)   | metros  | 348,4                    | \$ 750.548,85    | \$ 262.004.944,98 |
| 1.05   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO TANGENCIAL CIRCUITO BIFÁSICO (P-2510)   | Unidad  | 0                        | \$ 823.398,05    | \$ -              |
| 1.06   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DOBLE SIMÉTRICA CIRCUITO BIFÁSICO (P-2515)  | Unidad  | 0                        | \$ 876.373,05    | \$ -              |
| 1.07   | SUMINISTRO, TENIDDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR NO. 2  | Kilómetro   | 0,00                     | \$ 7.874.734,74  | \$ -              |
| 1.08   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN BAJA TENSIÓN CON ACOMETIDA  | Unidad  | 17                       | \$ 1.108.534,87  | \$ 18.811.092,79  |
| 1.09   | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KV   | Unidad  | 0                        | \$ 7.438.815,06  | \$ -              |
| 1.1  | SUMINISTRO, TENIDDO Y TENSIONADO DE CABLE TRIPLEX XLPE-SR NO. 2   | Kilómetro   | 13,60                    | \$ 15.240.585,74 | \$ 207.271.968,07 |
| 1.11   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LINEA, RED TRENZADA (PT-1001)  | Unidad  | 443                      | \$ 93.811,42     | \$ 41.469.858,95  |
| 1.12   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO SENCILLO, RED TRENZADA (PT-1003)  | Unidad  | 248                      | \$ 35.375,64     | \$ 8.773.158,72   |
| 1.13   | CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO RED TRENZADA DE B.T. INSTALACIÓN AL EXTERIOR DEL POSTE   | Unidad  | 104                      | \$ 240.429,78    | \$ 25.004.698,60  |
| 1.14   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.  | Unidad  | 527                      | \$ 198.953,22    | \$ 104.848.348,52 |
| 1.15   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 84 W TIPO O FORMA CLÁSICA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETLAP CON FLUJO LUMINOSO DE 12864 LUMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 140 LUMENES/WATIO DE 4.000 KELVIN.  | Unidad  | 358                      | \$ 1.340.792,79  | \$ 480.003.817,37 |
| 1.16   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 111 W TIPO O FORMA CLÁSICA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETLAP CON FLUJO LUMINOSO DE 16609 LUMENES Y EFICIENCIA MÍNIMA DE 140 LUMENES/WATIO DE 4.000 KELVIN. | Unidad  | 169                      | \$ 1.421.122,83  | \$ 240.169.757,59 |

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá  
Teléfono: 608 - 7405880  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co


mipg


|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 6 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |


| NO PREVISTOS                              |   |           |        |                     |
|---|---|-----------|--------|---------------------|
| 2.01                                      | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMANA EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M 150 KG - INCLUYE ELEVACIÓN | Unidad    | 137.00 | \$ 1.004.980,11     |
| 2.02                                      | SUMINISTRO, TENDIDO Y HINCADO DE CABLE CABLE TRIPLEX XLPE SR NO. 16                                 | Kilometro | 4.30   | \$ 21.291.585,74    |
| SUBTOTAL                                  |   |           |        | \$ 22.296.565,85    |
| ADMINISTRACIÓN                            |   |           | 22%    | \$ 4.905.242,51     |
| IMPREVISTOS                               |   |           | 5%     | \$ 1.114.828,29     |
| UTILIDAD                                  |   |           | 7%     | \$ 1.560.759,61     |
| IETE                                      |   |           |        | \$ 20.000.000,00    |
| RETELAP                                   |   |           |        | \$ 14.799.887,70    |
| PMT                                       |   |           |        | \$ 9.000.000,00     |
| VALOR TOTAL ELICITADO                     |   |           |        | \$ 2.983.982.790,45 |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)           |   |           |        |                     |
| VALOR TOTAL FINAL (ELICITADO MAS AJUSTES) |   |           |        | \$ 2.983.982.790,45 |


EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELIEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA:   
 JORGE EDUARDO ARRIETA BOLA  
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA:   
 JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ  
 REP. LEGAL INTERVENTORA

FIRMA:   
 IVAN DAVID RAMÍREZ SANABRIA  
 SUPERVISOR

FIRMA:   
 HELBER GAITANERO MARTÍNEZ CHAPARRO  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Comprometidos por la CALIDAD del servicio  
"SUAMOX, Ciudad del sol"

Figura 1. Acta de entrega y recibo final 04 de febrero de 2025

Obteniendo como resultado los 527 luminarias referenciadas en el acta anteriormente mencionada, en un tramo de 16 kilómetros como lo menciona el ítem 1,01 localización y replanteo.

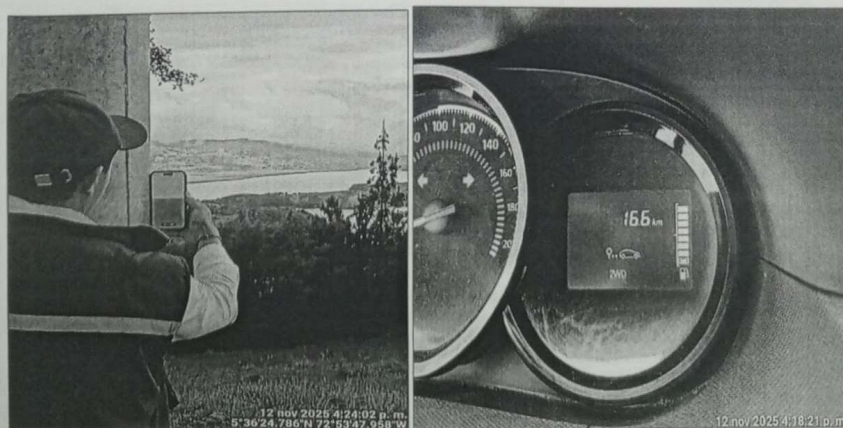



Figura 2. Izq. verificación de aplome de postes. Der. Longitud del tramo tomada con el Odómetro del carro de apoyo de la CGB

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá  
Teléfono: 608 - 7405880  
[cgb@cgb.gov.co](mailto:cgb@cgb.gov.co) / [www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co)



mipg



|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 7 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |

Por otra parte, no se identificó ningún ítem relacionado con "montaje de las subestaciones de media tensión", por lo tanto, no se tiene comentarios al respecto.

Como complemento de la información revisada en campo a esta Dirección fue enviada la georreferenciación de cada una de las luminarias instaladas en formato KMZ, la cual nos confirma las 527 luminarias instaladas.

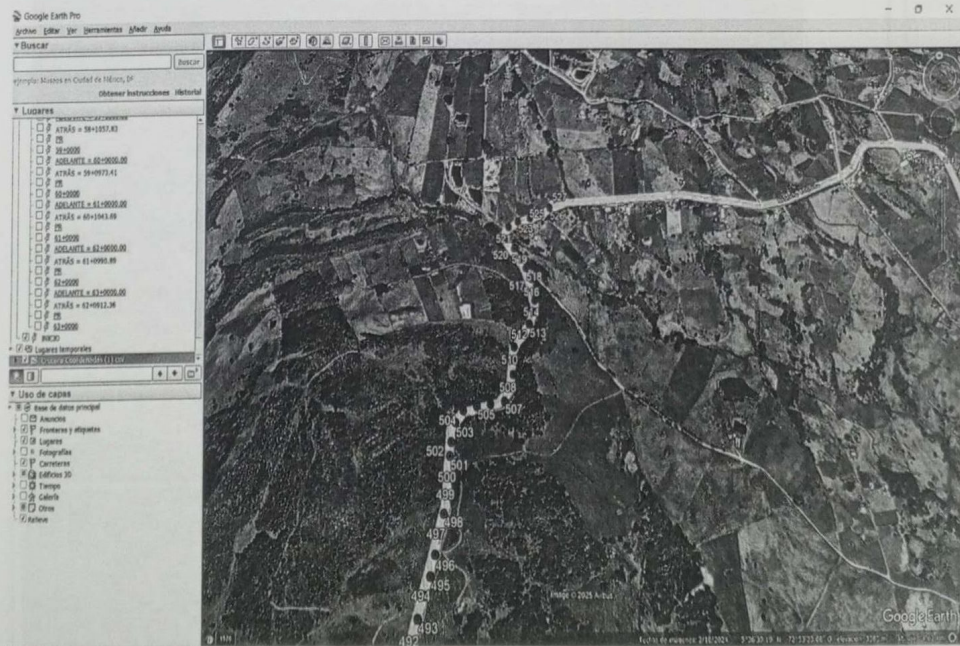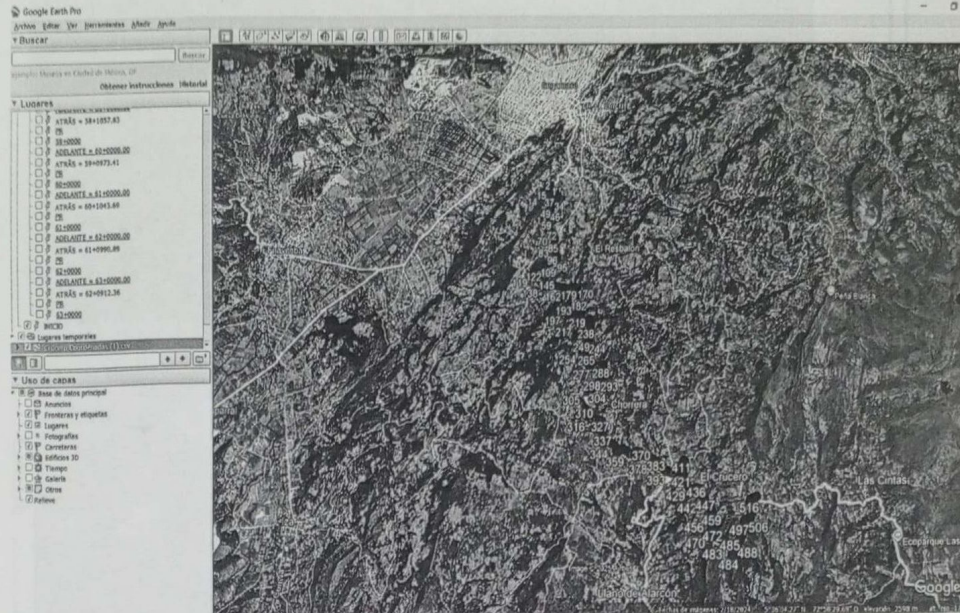


### Conclusiones

- Se identificó que se ejecutó el proyecto en su totalidad
- No se identificaron ítems de subestaciones de media tensión en la ejecución y liquidación del contrato


Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá  
Teléfono: 608 - 7405880  
[cgb@cgb.gov.co](mailto:cgb@cgb.gov.co) / [www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co)

mipg



|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 8 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |


### Registro fotográfico

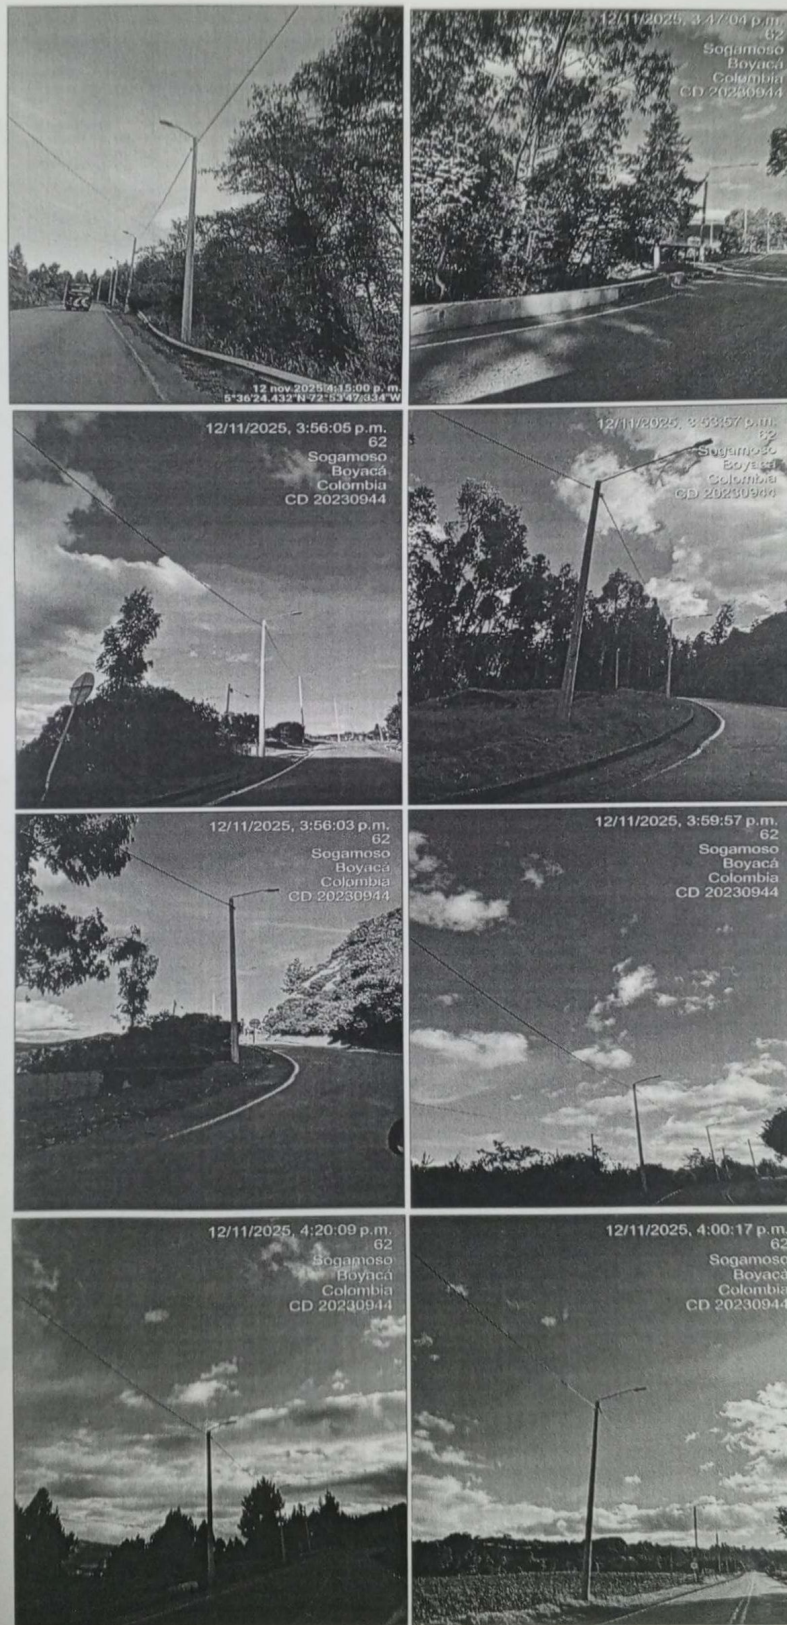

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4, Tunja - Boyacá  
Teléfono: 608 - 7405880  
[cgb@cgb.gov.co](mailto:cgb@cgb.gov.co) / [www.cgb.gov.co](http://www.cgb.gov.co)

mipg



|   |   |                                    |          |                |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 9 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05     |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01             |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021     |

## **VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Del análisis de la información antes relacionada, esta Secretaría puede concluir:

i). Se realizó inspección y conteo de cada una de las luminarias instaladas, verificando las cantidades del acta de entrega y recibo final de fecha del 04 de febrero de 2025 obteniendo como resultado las 527 luminarias en un tramo de 16 kilómetros.

ii). No se identificó ningún ítem relacionado con "*montaje de las subestaciones de media tensión*", por lo tanto, esta Secretaría advierte que al respecto no se pronunciará.

iii). Como complemento de la información revisada en campo a esta Dirección fue enviada la georreferenciación de cada una de las luminarias instaladas en formato KMZ, la cual nos confirma las 527 luminarias instaladas.

Se concluye que se cumplió con las cantidades contratadas; es decir, se ejecutó el proyecto en su totalidad y no se identificaron ítems de subestaciones de media tensión en la ejecución y liquidación del contrato.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, pues para deducirla es necesario determinar si los presuntos implicados quienes tenían a su cargo la administración y vigilancia de los bienes del Estado, obraron con dolo o con culpa grave.

Por lo expuesto anteriormente, se debe comprobar la existencia del nexo causal, entre el actuar de los presuntos responsables fiscales y un posible daño patrimonial, soportados en el material probatorio recaudado.

En consecuencia, es claro que no cualquier error, imprecisión o confusión puede dar lugar a la presunción legal de culpa grave, sino sólo aquellos que sean manifiestos; es decir, evidentes y propios de un obrar descuidado o falta de diligencia; es así que, se debe cumplir con los presupuestos sustanciales contenidos en la Ley 610 de 2000, que determinen que el daño patrimonial causado al Estado sea indemnizable, y que deba ser cierto, cuantificable, anormal, actual y real; es decir, debe estar demostrada su existencia, que no se trate de un daño hipotético basado en suposiciones, teniendo que estar cimentado en datos y pruebas incontrovertibles.

Así las cosas, esta Secretaría General determina archivar los hechos objeto de denuncia en Sede de Participación Ciudadana.


En mérito de lo expuesto, la Secretaría General de la Contraloría General de Boyacá, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 072 de 2023,

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** INCORPORAR al expediente de la Denuncia Fiscal D - 25 - 045 la documental generada a partir del Auto S.G. N° 045 del 29 de septiembre de 2025.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** ARCHIVAR el expediente de la Denuncia Fiscal D - 25 - 045 adelantada en sede de participación ciudadana en contra del municipio de



|   |   |                                    |          |                 |
|---|---|------------------------------------|----------|-----------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ<br>NIT. 891800721-8 |                                    | Página   | Página 10 de 10 |
|   | Macroproceso                                      | MISIONAL                           | Código   | GP-F-IP-05      |
|   | Proceso   | GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Versión  | 01              |
|   | Formato   | INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vigencia | 23/11/2021      |

Sogamoso - Boyacá por las razones expuestas en la parte motiva del presente Informe.

**ARTÍCULO TERCERO:** COMUNICAR la presente decisión de conformidad con la Ley 1757 de 2015 y Resolución interna N° 072 de 2023.

**ARTÍCULO CUARTO:** Contra el presente informe no procede recurso alguno.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**CÉSAR DAVID BUITRAGO VELANDIA**  
Secretario General  
Contraloría General de Boyacá

Revisó: César David Buitrago Velandía  
Secretario General

Proyectó: Eliana Carolina Sánchez Forero  
Profesional Universitario
