PROCESO AUDITOR

AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS

SUJETO AUDITADO

VIGENCIA 2025

INFORME FINAL APROBADO N° 048
Acta Nº 048 del 30 de septiembre de 2026, por medio de la cual se validan los hallazgos por parte del comité Técnico de Auditoria

Tunja - Boyacá

Memorando de Asignación A.F.G.R. No 001
Febrero 16 de 2026

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Myriam L. Archila de Reina*	REVISÓ	*Nabor Felipe Londoño*	APROBÓ	Diana Constanza Castillo Caro
CARGO	*Equipo Auditor*	CARGO	*Supervisor*	CARGO	Directora Operativa de Control Fiscal

CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ
CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO

DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
DIANA CONSTANZA CASTILLO CARO

EQUIPO DE AUDITORÍA

NABOR FELIPE LONDOÑO
Supervisor

MYRIAM L. ARCHILA DE REINA
Líder de auditoría

JOSÉ DOMINGO SALAZAR NIÑO
Auditor

SALVADOR PEÑA CORTÉS
Auditor

JOSÉ ANTONIO DAZA PINZÓN
Ingeniero Civil - Apoyo Técnico

CAMILO CRUZ LARGO
Ingeniero Civil - Apoyo Técnico

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 5

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

CARTA DE CONCLUSIONES 7

2. HECHOS RELEVANTES 8

3. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 9

4. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 9

5. PRONUNCIAMIENTOS DEFINITIVO 11

5.1. OPINIÓN FINANCIERA DEFINITIVA 2025 11

5.2. CONCEPTO CONSOLIDADO DEFINITIVO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS 2025 14

5.2.1. Concepto Definitivo Sobre El Presupuesto 15

5.2.2. Concepto Definitivo Sobre La Gestión Y Resultados 2025 17

5.3. FENECIMIENTO DEFINITIVO DE LA CUENTA FISCAL 18

5.4. CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO 18

5.5. CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 19

5.6. CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA OPORTUNIDAD SUFICIENCIA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RENDIDA EN LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA. 20

6. DENUNCIAS FISCALES 20

7. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 29

8. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 29

9. RESUMEN DE HALLAZGOS 30

10. MUESTRA DE AUDITORIA 31

10.1. GESTIÓN FINANCIERA 31

10.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL 31

10.2.1 Ejecución Contractual 32

10.2.2. Planeación Y Resultados 39

11. ATENCIÓN A DENUNCIAS FISCALES 45

12. DESARROLLO PROCESO AUDITOR 86

12.1. MACROPROCESO FINANCIERO 86

12.2. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS 254

12.2.1. PRESUPUESTO 254

12.2.2. Gestión Contractual 285

12.2.3. Componente Ambiental 367

12.2.4. Planeación Y Resultados 368

12.3.CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 384

12.4. CONTROL FISCAL INTERNO 385

12.5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 390

13. RELACIÓN DE HALLAZGOS 399

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados que se practicará al sujeto de control, **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** Vigencia 2025, es determinar si la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados está conforme con el marco regulatorio aplicable y si cumple los principios de la gestión fiscal en especial los de Eficiencia, Eficacia, Economía, Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales, permitiendo emitir concepto sobre los estados financieros, gestión presupuestal, calidad y eficiencia del control fiscal interno y el cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que la información financiera cumpla con toda la normatividad aplicable que emite la CGN y que es de obligatorio cumplimiento.
- Verificar los saldos finales y los saldos iniciales que reportó la entidad en la vigencia anterior y la vigencia auditada, con el fin de dar fe pública de la razonabilidad de los estados financieros.
- Analizar y verificar los saldos del Libro Mayor y Balances sin cierre y con cierre al final de la vigencia auditada.
- Determinar las sobrevaloraciones, subvaloraciones y las incertidumbres de la muestra tomada del activo, pasivo más patrimonio, con el fin de tener los criterios técnicos suficientes para la opinión de los estados financieros.
- Realizar análisis, verificación y trazabilidad de los estados financieros rendidos ya sea en el aplicativo SIA Contralorías suministrado por la AGR o en cualquier otro aplicativo dispuesto por la CT; y la información rendida en el CHIP de la CGN.
- Evaluar las Revelaciones a los estados financieros y su coherencia con las cifras reportadas.
- Verificar el cumplimiento del Manual de Políticas Contables y su actualización periódica, de acuerdo con la normatividad que emite la CGN.
- Determinar la confiabilidad de los valores reportados de las depreciaciones, deterioro, amortizaciones y que estos saldos hayan sido técnicamente aprobados y que estén acorde con lo que se determina en la política contable.
- Analizar y comparar el informe del Control Interno Contable con los resultados de los estados financieros.
- Análisis horizontal y vertical del Estado de la Situación Financiera Comparativo (Balance general: activo, pasivo y patrimonio) y Estado de Resultados Integral (Cuentas nominales: ingresos, costos, gastos); con el fin de identificar datos que pudieran conllevar riesgos fiscales en las cuentas de

mayor representación en el activo y en el pasivo; igualmente se podrá determinar la variación en cifras de cuentas contables de un año a otro. Posteriormente comparar el resultado de este análisis vertical y horizontal con las revelaciones a los estados financieros y evaluar la aplicación de las políticas contables en las diferentes cuentas contables. Si el auditor requiere puede utilizar el *Modelo 03-AFGR Análisis Horizontal y vertical*.

- Verificar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Presupuestal: equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.
- Evaluar el ciclo presupuestal: programación, aprobación, liquidación o desagregación, modificaciones, ejecución y seguimiento.
- Evaluar la ejecución del presupuesto; que se cumplan con las reglas y normas sobre nomenclatura, afectación presupuestal de los conceptos del ingreso y los objetos el gasto, dado aplicabilidad al estatuto presupuestal vigente aplicable según la naturaleza del sujeto de control.
- Evaluar el cierre presupuestal de acuerdo con el régimen presupuestal aplicable al sujeto de control: cuentas por pagar (obligaciones) y reservas presupuestales (compromisos) y la constitución de vigencias expiradas.
- Verificar que se encuentre aprobado el plan anual de adquisición de bienes o servicios o planes generales de compras.
- Valorar la justificación de la constitución de las reservas presupuestales y que no hayan sido inducidas, además que se encuentren acompañadas por las respectivas vigencias futuras ordinarias, excepcionales o de contratos en ejecución, teniendo en cuenta las excepciones normativas y las normas aplicables del sujeto vigilado.
- Evaluar el resultado de la vigencia: Superávit o déficit presupuestal.
- Emitir un concepto sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestal de la entidad auditada.
- Determinar la eficacia de las metas físicas programadas: en el plan de desarrollo territorial - PDT, estratégico o institucional, para la vigencia auditada *(Ver Papel de Trabajo 04-AFGR Matriz de planeación de la auditoría y evaluación de gestión - Hoja 7 Planeación y resultados),* dependiendo de la muestra seleccionada, identificando los contratos a través de los cuales se cumplieron dichas metas.

CARTA DE CONCLUSIONES

Tunja, 30 de septiembre de 2026

Doctor
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador
Departamento de Boyacá
despachogobernador@boyaca.gov.co
despacho.hacienda@boyaca.gov.co
dirección.financiera@boyaca.gov.co
Ciudad

Asunto: Informe final de auditoría financiera, de gestión y resultados vigencia 2025

Respetado doctor Amaya Rodríguez:

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Financiera de Gestión y Resultados a la Gobernación de Boyacá**,** a los componentes Gestión Presupuestal y Gestión Financiera, con el objeto de Emitir una opinión sobre el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, si se encuentra libre de errores materiales, ya sea por fraude o error y sobre la ejecución el presupuesto así mismo comprobar que las operaciones presupuestales y administrativas se hayan realizado teniendo en cuenta la normatividad aplicable; igualmente con el objeto de Emitir concepto sobre la Gestión de inversión y el gasto.

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT Versión 4.0 adaptada mediante la Resolución de la Contraloría General de Boyacá No 131 del 4 de abril de 2024, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, el concepto sobre la gestión presupuestal y de resultados.

Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la Gobernación de Boyacá, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la Entidad emitiera respuesta.

2. HECHOS RELEVANTES

Son aquellas cuestiones que, según el juicio del equipo auditor de la Contraloría consideran que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión y resultados.

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y la gestión y los resultados en la formación de la opinión de la CT sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CT ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son hechos relevantes de esta auditoría:

El proceso de auditoría a la Gobernación de Boyacá se organizó a partir de dos macroprocesos: Gestión financiera y gestión presupuestal.

Dentro del macroproceso de gestión financiera se evalúo a nivel de estados financieros los tipos de transacciones, saldos e información durante la vigencia 2025, respecto a ocurrencia, integridad, exactitud, corte de operaciones, clasificación y presentación de las transacciones y hechos, los saldos de los estados financieros y la correspondiente información revelada al cierre de la vigencia auditada, respecto a existencia, derechos y obligaciones, integridad, exactitud, clasificación y presentación.

Dentro de lo revisado en este macroproceso se encuentran diversos aspectos a destacar y que serán desplegados durante el desarrollo de la presente auditoria: Inconsistencias en Reportes y Principios Contables (Plataforma CHIP).

Gestión de recaudo: Para la vigencia auditada se evidencia deficiencias en el registro de la acusación de la vigencia 2025, por concepto de Impuesto sobre Vehículos Automotores, sanciones e intereses, por cuanto en el análisis se encontró que existe inconsistencias.

Administración de bienes muebles e inmuebles: de acuerdo con lo reportado en los estados financieros comparativos en las dos últimas vigencias se evidencia que estos bienes no se reconocen por sus avalúos y/o, no se tiene en cuenta el avalúo catastral, situación que no permite tener una certeza razonable respecto de la veracidad de los estados financieros.

Presentación, revelación de estados financieros y documentación allegada: la información contenida dentro de las revelaciones a los estados financieros es

demasiado general y no muestra un punto concluyente sobre el hecho a reconocer, si no por el contrario deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones, siendo esto contrario al objeto mismo de la revelación el cual es aclarar aquello que no se puede concluir desde la simple observancia de los estados financieros.

Evaluación del Control Interno Contable: de acuerdo con lo contemplado en el informe anual ejecutivo del estado control interno para la vigencia 2025, se evidencia recomendaciones, efectuadas en los informes de auditoría, a las cuales no han cumplido a pesar de ser de forma repetitiva y por parte de Control Interno no han efectuado un seguimiento para garantizar su cumplimiento, tanto en la parte de macro proceso financiero, como presupuestal, de lo cual se puede determinar que no hay un acompañamiento o una debida investigación a las recomendaciones surgidas.

Se evidencia que en la elaboración de la reserva presupuestal de la vigencia 2025 se incumplió el principio de anualidad según lo definido en el Decreto 111 de 1996, decreto 4836 de 2011 entre otras. Igualmente se presentan inconsistencias en la contratación y en el diligenciamiento de los formatos presentados en las plataformas.

3. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD

De acuerdo a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la Resolución No. 356 de 2022 de la CGN y Ley 314 de 2009, la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ es responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Boyacá se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error.

4. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no

garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o presupuesto.

La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera, de gestión y resultados, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General de Boyacá aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:

- Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y gestión presupuestal y resultados, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión y el concepto. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.

- Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

- Evaluación integral del presupuesto: sistema presupuestal, libros de contabilidad presupuestal, el ciclo presupuestal hasta culminar con el rezago presupuestal.

- Evalúa la eficiencia, eficacia y economía de la gestión contractual, y de la planeación y sus resultados.

- Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

- Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y las observaciones significativas, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

5. PRONUNCIAMIENTOS DEFINITIVO

5.1. OPINIÓN FINANCIERA DEFINITIVA 2025

La Contraloría General de Boyacá, ha auditado los estados financieros de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, que comprenden al balance general, estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2025, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Fundamento de la opinión

Se practicó auditoría financiera al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados consolidado del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025 de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, conforme a la metodología de auditoría implementada por la Contraloría General de Boyacá, de forma integral a través de la evaluación de cada una de las etapas del proceso contable, de lo cual fue posible extraer:

ACTIVOS

El valor total de activos entre los años 2024 – 2025 fueron de $4.790.164.257.278 y $5.205.863.684.712 respectivamente, presentándose una variación positiva en el activo de 8.681% por un valor de $415.699.427.434.

Efectivo: El valor total en el efectivo entre los años 2024 – 2025 fue de $407.624.136.235 y $438.799.283.537 respectivamente. Se presenta una variación en el efectivo de $31.175.147.302 equivalente al 7.65%. De igual forma, el rubro de efectivo presenta una participación para el año 2024 en el total de activos de 8.51% y una participación para el año 2025 en el total de activos de 8.43%, evidenciando un aumento en la participación del 0.08%. De acuerdo a la trazabilidad de la información presentada por la Secretaria de Hacienda se establecen inconsistencias que serán detalladas en el presente informe.

Cuentas por cobrar: El valor total en las rentas por cobrar entre los años 2024 – 2025 fueron de $468.279.058.250 y $571.438.792.674 respectivamente. Se presenta una variación positiva en las rentas por cobrar por valor de $103.159.734.424, equivalente al 22.03%, con una participación para el año 2024 en el total de activos de 9.78% y una participación para el año 2025 en el total de activos de 10.98%, evidenciando un aumento en la participación de 1.20%. Se presentan en el informe las inconsistencias presentadas en la trazabilidad de la información presentada.

Propiedades, planta y equipo: El valor total en las propiedades, planta y equipo entre los años 2024 – 2025 fueron de $459.285.769.693 y $509.823.901.270 respectivamente. Se presenta una variación positiva en las propiedades, planta y equipo por valor de $50.538.131.577, equivalente al 11.0%. De igual forma, el rubro de propiedades, planta y equipo presenta una participación para el año 2024 en el total de activos de 9.59% y una participación para el año 2025 en el total de activos de 9.79%, evidenciando un incremento en la participación de 0.21%. Dentro de la trazabilidad realizada de acuerdo a la información reportada por parte de Secretaria de Hacienda versus las carpetas de cada uno de las inmuebles inconsistencias que serán determinadas en el transcurso del presente informe.
Bienes de Uso Público e Históricos y culturales: El valor total entre los años 2024 – 2025 fueron de $1.707.121.064.814 y $1.721.050.209.321, respectivamente. Se presenta una variación positiva por valor de $13.929.144.507, equivalente al 0.82%. De igual forma, el rubro presenta una participación para el año 2024 en el total de activos de 35.64% y una participación para el año 2025 en el total de activos de 33.06%, evidenciando una disminución en la participación de -2.58%.

Se evidencia que en cuenta **17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES** y de acuerdo con la muestra analizada, se presentan

SUBESTIMACIONES por valor de $6.323.262.133. De igual forma, en la cuenta 17 se presenta una participación para el año 2024 en el total de activos de 35.64% y una participación para el año 2025 en el total de activos de 33.06%. Los Auditores dentro del análisis realizado a la subcuenta 1710 **Bienes de Uso Público en Servicio** detectaron dentro de la trazabilidad de la información denominada REPORTE CONTABLE RED CARRETERA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ versus la información reportada en el Estado de Situación Financiera, unas inconsistencias las cuales serán expuestas en el contenido del presente informe

Otros Activos: El valor total en otros activos entre los años 2024 – 2025 fueron de $1.743.142.197.602 y $1.959.505.147.301 respectivamente. Se presenta una variación en otros activos por valor de $216.362.949.699, equivalente al 12.41%. De igual forma, el rubro de otros activos presenta una participación para el año 2024 en el total de activos de 36.39% y una participación para el año 2025 en el total de activos de 37.64%.

Para la realización de esta auditoría, se tiene en cuenta la materialidad **del activo**, siendo el más representativo**.** Las incorrecciones en cantidad, tienen un efecto en los estados financieros, siendo los casos más representativos en: efectivos, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo; bienes de beneficio y uso público; otros activos, entre otros.

Para la realización de esta auditoría, se tiene en cuenta la materialidad **del activo**, siendo el más representativo**.** Las incorrecciones en cantidad, tienen un efecto en los estados financieros, siendo los casos más representativos en: efectivos, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo; bienes de beneficio y uso público; otros activos, entre otros.

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $259.112.072.742, el 4.98% del total de activos, es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un efecto no generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, en la cuenta 16 propiedad planta y equipo, entre otros.

Opinión con salvedades

De acuerdo con los resultados de la auditoría, el equipo auditor determinará el tipo de opinión a emitir sobre los estados financieros siendo la opción la que se presenta a continuación.

Con salvedades. En opinión de la Contraloría General de Boyacá, salvo los descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.

En consecuencia, de lo anterior se evidencia el resultado obtenido de la evaluación de la gestión fiscal aplicado al macroproceso financiero a través del papel de trabajo ***PT04-AFGR Matriz_de_Gestion_Fiscal,*** de conformidad con la Guía de Auditoría Territorial dando alcance a las normas ISSAI, en donde, la **GESTION FINANCIERA** tiene un valor de evaluación total del 40%, en el cual arroja como resultado el 75.0%, como se indica a continuación:

GESTIÓN FINANCIERA	**40%**	ESTADOS FINANCIEROS	100%	75.0%			**OPINION ESTADOS FINANCIEROS**
							Con salvedades

5.2. CONCEPTO CONSOLIDADO DEFINITIVO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS 2025

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada.

La Contraloría General de Boyacá, emite Concepto **Con salvedades** sobre el Macroproceso gestión presupuestal y de resultados, mediante la consolidación del Concepto sobre la Gestión presupuestal y el Concepto sobre la Gestión y Resultados, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT Versión 4.0, en el marco de las normas internacionales ISSAI, así:

MACROPROCESO		PROCESO		PONDERACIÓN	PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL			CONCEPTOS Y OPINIÓN	
					EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA	CONCEPTO CONSOLIDADO MACROPROCESO PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	60%	GESTIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN DE INGRESOS	20%	100.0%			CONCEPTO GESTIÓN PRESUPUESTAL	Con salvedades
			EJECUCIÓN DE GASTOS	20%	75.0%			Con salvedades	
		GESTIÓN Y RESULTADOS	PLANEACIÓN Y RESULTADOS	30%	59.6%	98.6%		CONCEPTO GESTIÓN Y RESULTADOS	
			GESTIÓN CONTRACTUAL	30%	81.5%	81.0%	82.4%	Favorable	
		TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL		100%	77.3%	89.8%	82.4%		

Fuente: PT04-AFGR Matriz_de_Gestion_Fiscal Gobernación de Boyacá, Vigencia 2025.

5.2.1. Concepto Definitivo Sobre El Presupuesto

La Contraloría General de Boyacá ha auditado la cuenta gestión presupuestal de la vigencia 2025, que comprende:

- Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto

- Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo presupuestal

- Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;

- Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante

- Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro.

Fundamento del Concepto

La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de Boyacá, de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de este informe.

Este ente de control es independiente del sujeto auditado, de conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética contenidos en el Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría.

Además, la Contraloría General de Boyacá ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Por lo cual, se considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión.

También se registran observaciones basadas en las siguientes circunstancias:

- Las reservas constituidas en la vigencia 2025, no se presentan acordes con la respectiva ejecución de gastos.
- Las reservas presupuestales ejecutadas en la vigencia 2025 no se pagaron en su totalidad, violando el principio de anualidad.
- Las cuentas por pagar constituidas para ejecutar en la vigencia 2025 se pagaron en su totalidad.

Concepto con salvedades

En opinión de la Contraloría General de Boyacá las incorrecciones evidenciadas, individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas.

MACROPROCESO		PROCESO		PONDERACIÓN	PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL			CONCEPTOS Y OPINIÓN	
					EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA	CONCEPTO CONSOLIDADO MACROPROCESO PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	60%	GESTIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN DE INGRESOS	20%	100.0%			CONCEPTO GESTIÓN PRESUPUESTAL	Con salvedades
			EJECUCIÓN DE GASTOS	20%	75.0%			Con salvedades	
		GESTIÓN Y RESULTADOS	PLANEACIÓN Y RESULTADOS	30%	59.6%	98.6%		CONCEPTO GESTIÓN Y RESULTADOS	

								Favorable	
			GESTIÓN CONTRACTUAL	30%	81.5%	81.0%	82.4%		
		TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL		**100%**	**77.3%**	**89.8%**	**82.4%**		

Fuente: PT04-AFGR Matriz_de_Gestion_Fiscal Gobernación de Boyacá, Vigencia 2025.

5.2.2. Concepto Definitivo Sobre La Gestión Y Resultados 2025

La Contraloría General de Boyacá emite concepto sobre la gestión y resultados, evaluando si la planeación, sus resultados y contratos examinados, cumplen con los fines esenciales del estado, con los principios de la gestión fiscal y de la gestión contractual. El concepto se sustenta en los resultados obtenidos en la fase de ejecución y en la evaluación la planeación y resultados (Plan de desarrollo) y la Gestión de adquisición, recepción y uso de bienes y servicios.

Fundamento del concepto

El equipo auditor evaluó la muestra seleccionada de los procesos contractuales en donde identificó: Que en la ordenanza 009 de fecha 01 de junio de 2024, por la cual se adopta el plan departamental de desarrollo de Boyacá y el plan – “Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024 – 2027” dio cumplimiento en el cuarto trimestre 2025, a 380 indicadores con calificación sobresaliente, 96 en blanco, 73 en estado crítico, le sigue en estado crítico 53, en revisión 28, satisfactorio 9, bajo 5, medio 1 y sobre ejecución 0.

Para el desempeño acumulado a 2025, la calificación es sobresaliente en 305 indicadores, en la ejecución de 123 indicadores 65 en estado crítico, en blanco 44, bajo 13 y satisfactorio 8 lo queda como resultado un concepto favorable.

Concepto Favorable.

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría realizada, conceptúa que la Gestión y resultados de la Gobernación de Boyacá es **Favorable** producto de la evaluación a la contratación y de la eficiencia y eficacia plan de desarrollo como se describe a continuación:

GESTIÓN Y RESULTADOS	PLANEACIÓN Y RESULTADOS	30%	59,6%	98,6%		23,7%	CONCEPTO GESTIÓN Y RESULTADOS
	GESTIÓN CONTRACTUAL	30%	81,5%	81,0%	82,4%	24,5%	Favorable

5.3. FENECIMIENTO DEFINITIVO DE LA CUENTA FISCAL

La Contraloría General de Boyacá, como resultado de la Auditoría adelantada, **Fenece** la cuenta rendida por la Gobernación de Boyacá de la vigencia fiscal 2025, como resultado de la Opinión Financiera **con salvedades** y el Concepto de Gestión y Resultados **con salvedades**, como se observa en la siguiente tabla:

MACROPROCESO		PROCESO		PONDERACIÓN	PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL			CONCEPTOS Y OPINIÓN	
					EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA	CONCEPTO CONSOLIDADO MACROPROCESO PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	60%	GESTIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN DE INGRESOS	20%	100.0%			CONCEPTO GESTIÓN PRESUPUESTAL	Con salvedades
								Con salvedades	
			EJECUCIÓN DE GASTOS	20%	75.0%				
		GESTIÓN Y RESULTADOS	PLANEACIÓN Y RESULTADOS	30%	59.6%	98.6%		CONCEPTO GESTIÓN Y RESULTADOS	
								Favorable	
			GESTIÓN CONTRACTUAL	30%	81.5%	81.0%	82.4%		
		TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL		100%	77.3%	89.8%	82.4%		
GESTIÓN FINANCIERA	40%	ESTADOS FINANCIEROS		100%	75.0%			OPINION ESTADOS FINANCIEROS	
								Con salvedades	
		TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA		100%	75.0%				
TOTAL PONDERADO	100%	TOTALES			72.0%	89.8%	82.4%	FENECE	
		CONCEPTO DE GESTIÓN			INEFICAZ	EFICIENTE	ECONOMICA		

Fuente: PT04-AFGR Matriz_de_Gestion_Fiscal Gobernación de Boyacá, Vigencia 2025.

5.4. CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la Contraloría General de Boyacá evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI.

Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control se determinó un resultado de la calidad y eficiencia del control fiscal interno arrojó un resultado de con deficiencia.

De 1.0 a 1.5	**Eficiente**
De > 1.5 a < 2.0	**Con deficiencias**
De 2.0 a 3.0	**Ineficiente**

Emite un concepto de ineficiencia, dado que, de acuerdo a los Criterios establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 1.6, como se ilustra en el siguiente cuadro:

MACROPROCESO	VALORACIÓN CALIDAD DEL DISEÑO DLE CONTROL (25%)	RIESGO COMBINADO	VALORACIÓN DE EFICIENCIA DE LOS CONTROLES (75%)	CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO
GESTIÓN FINANCIERA	Parcialmente adecuado	Medio	Con deficiencias	1.6
GESTIÓN_PRESUPUESTAL_Y_RESULTADOS	Adecuado	Bajo	Con deficiencias	
Total General	Parcialmente adecuado	Medio	Con deficiencias	CON DEFICIENCIAS

Fuente: PT04-AFGR Matriz_de_Gestion_Fiscal Gobernación de Boyacá, Vigencia 2025.

5.5. CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2024, y reportado a la Contraloría General de Boyacá, comprende dieciséis (16) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución interna de planes de mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Gobernación de Boyacá fueron **Efectivas** (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 80.00, como se evidencia en el siguiente cuadro:

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	**Calificación Parcial**	**Ponderación**	**Puntaje Atribuido**
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	80.0	0.20	16.0
Efectividad de las acciones	80.0	0.80	64.0
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		**1.00**	**80.00**
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento		**Cumple**	

Fuente: PT 06-AFGR Evaluación Plan de mejoramiento de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, Vigencia 2024.

5.6. CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA OPORTUNIDAD SUFICIENCIA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RENDIDA EN LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA.

La Gobernación de Boyacá rindió la cuenta de la vigencia 2025, dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Boyacá, a través de la Resolución No 494 de 2017, “Por medio de la cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de Boyacá”.

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto **Favorable** de acuerdo, con una calificación de 81.4 sobre 100 puntos, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 1

CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RENDIDA EN LA CUENTA			
VARIABLES	**CALIFICACIÓN PARCIAL**	**PONDERADO**	**PUNTAJE ATRIBUIDO**
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100.0	10%	10.00
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	90.0	30%	27.00
Calidad (veracidad)	74.0	60%	44.40
TOTAL PUNTAJE			**81.4**
Concepto información rendida a emitir			**Favorable**

Fuente: PT 01-AFGR Evaluación cuenta rendida_V_4.0 de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, Vigencia 2025

6. DENUNCIAS FISCALES

Fueron incorporadas denuncias fiscales de origen ciudadano a la presente auditoría relacionadas, así:

1. Mediante oficio SG-2026-059, firmado por el doctor CESAR DAVID BUITRAGO VELANDIA, en su condición de Secretario General de la Contraloría General de Boyacá, pone en conocimiento la denuncia allegada por la Personería de Cuítiva, la cual gira en torno al Convenio Interadministrativo No. 0657 de 2025, celebrado por la Gobernación de Boyacá.

SG-2026-059

Tunja, 03 de febrero de 2026

Señores
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
controlfiscal@cgb.gov.co
Ciudad

Asunto: **PONE EN CONOCIMIENTO PARA FINES PERTINENTES**

Respetuoso saludo,

La presente tiene la intención de poner en conocimiento denuncia allegada por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE CUITIVA la cual gira entorno al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0657 de 2025, celebrado por la Gobernación de Boyacá.

Sobre la base de lo anterior, se solicita se incluya el citado negocio jurídico dentro de la muestra contractual a desarrollarse en el marco del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT – 2026. En ese sentido, se hace remisión del escrito de la denuncia junto con sus anexos, para que de manera particular se incluya el citado convenio dentro del proceso auditor.

Atentamente,

CESAR DAVID BUITRAGO VELANDIA
Secretario General
Contraloría General de Boyacá

2. Mediante correo electrónico con fecha 25 de febrero de 2026, la Dirección de Control Fiscal envía denuncia relacionada con un traslado de la oficina de Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá, con fecha 25 de febrero de 2026, cuyo asunto es: Traslado radicado CGB No. 20261100843 que dice:

Asunto: **TRASLADO RADICADO CGB N° 20261100843**

Respetuoso Saludo,

En atención al radicado de la referencia, por medio del cual el señor Andrés Felipe Cifuentes Perdomo, en calidad de Director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, allegó copia de oficio, refiriendo lo siguiente:

"... Con mérito en lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política modificado por el Acto legislativo 04 de 2019, y en el marco de las atribuciones que le otorga a este órgano de control el Decreto Ley 403 de 2020, la Dirección de Análisis de Información y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, se encuentra verificando en tiempo real los procesos de contratación en los entes territoriales.

En ejercicio de lo anterior, la DIARI evidenció una alerta con ocasión del criterio Discrepancia en la valoración de aportes, el siguiente contrato.

Contratista	Número Contrato	Objeto del contrato	Cuantía
TIERRASUA S.A.S	CO1.PCCNTR.8374718/3261	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"	**$11.541.976.480**

..."

Al respecto y una vez analizado el asunto, se observa que el requerimiento hace mención a trámites propios de su dependencia. En consecuencia, se remite para que sea incluido en la auditoría de la Gobernación y de TIERRASUA S.A.S., y se adelanten las actuaciones a que haya lugar.

Se remite adjunto el radicado **CGB N° 20261100843** con su anexo.

Atentamente,

Cesar David Buitrago Velandia
Secretario General
Contraloría General de Boyacá (CGB)
Cr 9 # 17-50 Piso 4
Horario de Atención: Jornada continua de 8:00 am a 5:00 pm

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2026EE0037966

Doctor
Juan Pablo Camargo Gómez
Contralor Departamental de Boyacá
cgb@cgb.gov.co

Asunto. Comunicación de Alerta

Respetado señor Contralor

Con mérito en lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política modificado por el Acto legislativo 04 de 2019, y en el marco de las atribuciones que le otorga a este órgano de control el Decreto Ley 403 de 2020, la Dirección de Análisis de Información y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, se encuentra verificando en tiempo real los procesos de contratación en los entes territoriales.

En ejercicio de lo anterior, la DIARI evidenció una alerta con ocasión del criterio Discrepancia en la valoración de aportes, el siguiente contrato.

Contratista	Número Contrato	Objeto del contrato	Cuantía
TIERRASUA S.A.S	CO1.PCCNTR .8374718/3261	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"	**$11.541.976.480**

Por lo anterior, remitimos la información correspondiente, con la finalidad que se efectúe su revisión dentro del marco de su autonomía y competencia, esperando que este insumo sea de utilidad. Cualquier información adicional que usted requiera por favor no dude en solicitarla a este despacho.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE CIFUENTES PERDOMO
Director
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI

Elaboró: Adriana Ballena Santos -PUG01

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Con oficio de fecha 7 de abril de 2026, se solicita a la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta Contraloría, apoyo técnico a la realización de la Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados de la Gobernación de Boyacá, vigencia 2025, para lo cual se adjuntan carpetas digitalizadas de las denuncias trasladadas por la Contraloría General de la República de los municipios de Duitama y Cuítiva y carpetas digitalizadas de los siguientes contratos y/o Convenios:

No.	Contrato No.	Contratista	Objeto	Cuantía
1	CO1. PCCNTR.8374718/3261	TIERRASUA S.A.S.	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	$ 11.541.976.480.00
2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0657 de 2025	TIERRASUA S.A.S.	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	$5.049.996.400.00

3. Denuncia presentada por Colectivo de Víctimas por la Transparencia – Boyacá, solicitan que la respuesta y avance de la investigación sea notificada al correo palacioshilde4@gmail.com

DENUNCIA PÚBLICA POR PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL, FRAUDE A SUBVENCIONES Y MALVERSACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE VÍCTIMAS

DIRIGIDO A:

- Contraloría General de la República / Gerencia Departamental Boyacá
- Procuraduría Regional de Boyacá
- Fiscalía General de la Nación (Unidad de Delitos contra la Administración Pública)
- Defensoría del Pueblo (Delegada para la Orientación y Asistencia a las Víctimas)
- Gobernación de Boyacá

REFERENCIA: Irregularidades sistemáticas en el cobro de incentivos de participación y falta de gestión efectiva (Resolución 01668 de 2020) durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

I. OBJETO DE LA DENUNCIA: Ciudadanos y representantes de la comunidad de víctimas del departamento de Boyacá ponemos en conocimiento de las autoridades competentes una serie de irregularidades sistemáticas ocurridas durante los últimos tres (3) años en la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Departamento de Boyacá. Se denuncia el presunto cobro irregular de viáticos y transportes mediante el suministro de información falsa, sumado a una evidente inoperancia y falta de gestión de la mayoría de sus integrantes, lo que constituye un detrimento patrimonial frente a un presupuesto anual.

II. HECHOS SUSTENTADOS

1. Simulación de Participación y Falta de Gestión Real: Se solicita a los entes de control revisar exhaustivamente las actas de incidencia, gestión y trabajo de la Mesa. De los 24 integrantes que cobran incentivos, se puede verificar que:

- Únicamente un promedio de 10 integrantes participa de manera activa, presenta propuestas y realiza gestión real.
- Los integrantes restantes asisten exclusivamente con el fin de registrar su firma para asegurar el cobro del incentivo económico, sin expresar sugerencias, aportes o trabajo en favor de la población víctima.
- El derecho a la participación no debe ser utilizado como un mecanismo de enriquecimiento personal sin contraprestación de servicio a la comunidad, especialmente cuando en el departamento existen cerca de 50.000 víctimas con necesidades urgentes.

2. Falsedad en lugar de residencia y cobros improcedentes:

- Representante de Cubará: La integrante cobra gastos de desplazamiento y días adicionales como si viajara desde Cubará, cuando es de conocimiento público que por temas del salud del padre, reside en Duitama, eliminando la necesidad de dichos pagos extras.

- Representante de San Luis de Gaceno: Cobra pernotada adicional completa argumentando residencia en dicho municipio, a pesar de que reside y labora en la ciudad de Bogotá. Además, el trayecto no supera las 5 horas requeridas para el beneficio adicional según la autonomía de la Mesa.
- Representante de Socotá: su tiempo de desplazamiento a Tunja es inferior al rango establecido para beneficios extra. Cobra ruta de vereda y adicionales de alimentación residiendo en el casco urbano, y su tiempo de desplazamiento a Tunja es inferior al rango establecido para beneficios extra.
- Representante de Chiscas: el integrante cobra gastos de desplazamiento como si viajara desde Chiscas, cuando es de conocimiento que por temas de relación sentimental se desplaza desde Paipa.
- Representante de Moniquirá: Cobra incentivos de zona rural viviendo actualmente en el casco urbano.
- Representante de Sutatenza (Enfoque Discapacidad): Reside en el centro urbano y cobra como residente de vereda. Adicionalmente, se han aprobado 12 comités presenciales con el único fin de generar cobro de viáticos, cuando la necesidad técnica es mayoritariamente virtual.

3. Incumplimiento de Reglamentos y Beneficios de Acompañante:

- Representante de Caldas: Siendo Concejal activa y coordinadora de la Mesa Departamental, delega las sesiones de la Mesa para cumplir sus otras funciones, pero cobra el incentivo de la Mesa por día completo, adicional a ello en la vigencia 2025 le estaban garantizando la participación al CJT, cuando a este espacio según la resolución 01668 de 2020 dice que solo se le garantiza a seis, se puede comprobar con la resolución de pagos de los CJT de la vigencia 2025.
- Representante de Chiquinquirá: Cobra apoyos de acompañante sin llevarlo a las sesiones, y reside habitualmente en Sogamoso con su pareja, falseando la información de transporte.

4. Omisión de Vigilancia y Control por la Entidad Nominadora:

La Gobernación de Boyacá, a través de la dependencia encargada de la revisión y trámite de las cuentas de cobro, ha fallado sistemáticamente en su deber de control. Durante las vigencias 2024, 2025 y lo corrido de 2026, la entidad ha autorizado pagos de "adicionales" y viáticos sin verificar que los beneficiarios cumplan con el requisito reglamentario de un tiempo de desplazamiento superior a las cinco (5) horas. Resulta inexcusable que, existiendo pruebas de que ciertos integrantes residen en municipios cercanos o incluso en la capital, se les sigan garantizando estos recursos adicionales, permitiendo así una administración ineficiente y presuntamente irregular del erario.

5. Votación Irregular sobre Requisitos Legales: Se denuncia que la Coordinadora de la Mesa puso a consideración una encuesta en un grupo de WhatsApp, interna para validar pagos adicionales a los representantes de Socotá y San Luis de Gaceno. Es imperativo aclarar que la Mesa no tiene facultades legislativas ni presupuestales para decidir quién cumple o no los requisitos de lo estipulado en acta de sesión y resolución de la gobernación, para recibir dineros públicos. Someter a votación el cumplimiento de lo establecido y más en austeridad es un acto que vicia de nulidad cualquier pago derivado de dicha encuesta y compromete la responsabilidad disciplinaria de quien promueve tal consulta.

6. Creación de Espacios no Contemplados para Generar Cobros: Se evidencia que, bajo la excusa del Plan de Trabajo, la Mesa está creando y aprobando espacios que no están contemplados en la Resolución 01668 de 2020 ni en la Ley 1448. Esta práctica tiene como único fin justificar el cobro de apoyos de participación, convirtiendo el Plan de Trabajo en una herramienta para el beneficio personal y no en una hoja de ruta para la reparación de las 50.000 víctimas del departamento.

III. GRAVEDAD DE LA CONDUCTA. Estas prácticas se han vuelto una costumbre administrativa durante las vigencias 2024, 2025 y 2026. Es inaceptable que el recurso público destinado a la reparación y participación de las víctimas se convierta en una nómina paralela, para personas que no cumplen con su deber legal y ético de representación.

IV. PETICIONES

1. Investigación Contable: Realizar auditoría a los pagos de viáticos y transportes de las vigencias 2024 a 2026.
2. Auditoría de Actas: Cotejar las actas de sesión con los pagos realizados para verificar quiénes realmente trabajan y quiénes solo asisten a cobrar.
3. Cruce de Datos de Residencia: Solicitar pruebas de residencia real (certificados de vecindad verificados, contratos laborales o de arrendamiento) NO familiares, de los implicados. Vigencias 2024 a 2026.
4. Recuperación de Recursos: Iniciar los procesos de responsabilidad fiscal para que se devuelvan los dineros obtenidos mediante engaño al erario.
5. Extralimitación de funciones y violación al principio de legalidad: Se denuncia que la Mesa de Participación, bajo un concepto erróneo de "autonomía", pretendió legislar sobre el manejo de recursos públicos mediante votaciones internas en las vigencias 2024 y 2025, estableciendo un criterio de "cinco horas" para acceder a pagos adicionales. Es imperativo aclarar que la autonomía de la Mesa no le confiere facultades para modificar los requisitos de ley ni para flexibilizar los criterios de percepción establecidos en la normativa superior. Permitir que los propios beneficiarios voten las reglas de su remuneración constituye un claro conflicto de intereses y una burla a los principios de austeridad y transparencia del gasto público.

V. DEBER DE RESPUESTA Y TRÁMITE:

Aunque la presente denuncia se realiza bajo reserva de identidad (Denuncia Anónima), los hechos aquí narrados configuran presuntos delitos contra la administración pública y detrimento patrimonial. Por tanto, según lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y la Circular 002 de 2017 de la Procuraduría, la entidad tiene la obligación de iniciar la indagación preliminar de oficio. El incumplimiento en los términos de respuesta o la omisión en el trámite de esta denuncia darán lugar a quejas disciplinarias contra el funcionario encargado del área de correspondencia o control interno.

Se solicita a las autoridades destinatarias que, en cumplimiento del Principio de Eficacia y el Deber de Denunciar, se informe sobre el estado de la indagación preliminar en los términos de ley. La gravedad de los hechos aquí expuestos, que afectan el presupuesto de la población más vulnerable del departamento, exige una actuación de oficio inmediata para evitar que el presunto detrimento patrimonial siga creciendo durante la vigencia actual.

ACTUAMOS BAJO RESERVA DE IDENTIDAD POR SEGURIDAD, PERO SOLICITO QUE TODA RESPUESTA Y AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN SEA NOTIFICADA AL CORREO: palacioshilde4@gmail.com

Atentamente,

COLECTIVO DE VÍCTIMAS POR LA TRANSPARENCIA - BOYACÁ

Denunciantes bajo reserva legal de identidad

4. Denuncia Fiscal D-25-19, anónima, denuncia por daño fiscal a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, en la cual establece las siguientes precisiones:

PRECISIONES

1. El ente territorial compro mediante contrato de venta de 3 de agosto de 2023 a LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO (HOY BANCOLOMBIA S.A) 8 inmuebles en **Green Hills** de Tunja por un valor de $6.585.855.000 por medio de la **Escritura Pública No. 2142 del 22 de septiembre de 2023**, en la notaría cuarta del circuito de Tunja

2. De los 8 inmuebles, no todos están en funcionamiento, porque no se hizo un adecuado estudio de títulos por parte del comité de compra, y se adquirieron inmuebles que 2 años después es imposible su uso.

3. El valor por inmueble esta relacionado en la tabla que sigue, donde se puede evidenciar, que el valor esta triplicado con el valor del mercado para esa zona de tunja, siendo el total $6.585.855.000,00)M/CTE

FOLIO	INMUEBLE	VALOR
070-213729	BLOQUE C 1° PISO LOCAL 2C	$ 801.111.645
070-213730	BLOQUE C 1 PISO LOCAL 3C	$ 995.675.223
070-213731	BLOQUE C 2 PISO LOCAL 4C	$ 2.016.643.396
070-213740	BLOQUE C 3 PISO LOCAL 12C	$ 974.604.960
070-213732	BLOQUE C 2 PISO LOCAL 13C	$ 19.381.076
070-199815	BLOQUE G LOCAL 3	$ 749.632.412
070-213741	BLOQUE 1 LOCAL 1I	$ 1.017.144.218
070-213680	BLOQUE A 1 PISO CAJERO 1A	$ 11.662.070
	TOTAL	$ 6.585.855.000,00

4. Como se puede observar en el registro BP y P No. **2023 00415 0144,** la modalidad de contratación **fue directa**, no se entiende porque no hubo licitación, como es la regla general para la compra.

5. La dependencia que adelantó el proceso de compra fue la Secretaría general de la Gobernación de Boyacá y no el departamento de contratación

6. Revisados los archivos del secop, se puede evidenciar que los estudios previos de agosto de 2023, señalaron que el objeto resolvia la necesidad de la *"adquisición de inmuebles para el correcto funcionamiento del **archivo** departamental y **demás oficinas** de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"*

Sin embargo al revisar folio por folio, y estudio por estudio, salta a la vista de cualquier funcionario, que hay inmuebles de muy poco metraje que cuesta igual o mas que un apartamento, y que lo único que pude caber ahí es un baño y que los estudios previos NO hicieron visita de campo, es decir, que además que son un Copy page, los unos de los otros, quien adelanto esta tarea, no evidencio la realidad de los inmuebles.

7. Dentro de los 8 locales adquiridos se encuentra el Local 3, Segundo Piso del Bloque G, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070 – 199815, y sin numero de registro catastral el cual es un predio enclavado según escritura pública 0850 del 10 de mayo de 2012, ya que no cuenta con zonas comunes de uso exclusivo ni un ingreso común.

8. Es interesante ver, como el archivo histórico del departamento estaría ubicado cerca de las cuerdas de alta tensión que atraviesan el centro empresarial, que al comparar con la página oficial del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado- Colombia, ninguna oficina que manipule archivo podrá estar cerca a factores de riesgo:

a. Estación de gasolina
b. Ventanas
c. Cables de alta tensión

d. Hurto

9. Se evidencia que dentro del centro empresarial, hay empresas que manipulan alimentos, hay uso de gas, altos voltajes, y se encuentra fuera del casco histórico de tunja, lo que permite ver que el riesgo es alto.

10. Desde 2023, se ha observado que por cada local hay por lo menos 2 guardas de seguridad al tiempo, cuando en todo el centro empresarial, responden por la seguridad máximo 2, es decir, que los locales VACIOS de la gobernación, tiene un fortín laboral que cumple con las cuotas que prometieron en campaña, y que serian un daño fiscal. Y mas si se ve que la copropiedad ya tiene su sistema de seguridad dentro del presupuesto anual.

11. Hay locales de la gobernación que sin licencia están generando cambios con obras civiles, y se detecta que trabajan en las noches como las "ratas" políticas que no quieren mostrar.

12. De las acciones y demanda que presenta el cuerpo de abogados de la gobernación, no han ganado una, porque están convencidos que el régimen aplicable a una propiedad horizontal se rige por el CPACA y no por las normas civiles, pretenden con amenazas modificar los estatutos y los órganos de gobierno interno, es decir, le están pagando a un grupo de abogados de perfil publico y administrativo meses de trabajo, cuando no tienen idea de que el fuero privado es diferente al derecho publico. Se solicita se verifique en la rama judicial, las acciones que ha presentado en contra del centro empresarial y las respuestas dada por los jueces frente a sus "falsas" denuncias.

13. El centro empresarial Green Hills se rige por las escrituras 850 del 10 de mayo de 2013 y 0850 del 10 de mayo de 2012, presenta un riesgo inminente para cualquier entidad, pretender dejar su archivo histórico ahí o las oficinas de la gobernación, donde reposara, no solo el archivo sino documentos públicos

14. Los estudios previos **NO ANALIZAN** la **norma técnica colombiana NTC 5921** que fue consagrada **desde el año 2018** y donde se indican cuales **PROHIBICIONES** o **REQUISITOS** se deben cumplir para el **ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DOCUMENTAL EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS**, ya que si realmente se analizan los 8 locales comprados en Green Hills **NINGUNO** cumple con la **NTC 5921.**

15. Lo otro que es un claro daño fiscal es que cuanto tiempo lleva realizada la compra, **2 AÑOS** y no se han utilizado varios de esos inmuebles, ni puestos en arriendo siquiera, para pagar la vigilancia (aparte de la que hay en green hills) y los costos por administración que si están pagando muy puntualmente, es mas irrisorio y denota el grado de corrupción, que compraron un local -boque A 1 piso local 1 A- donde solo cabe un cajero automático, por $11.662.000, que es mas pequeño que un parqueadero que cuesta en valor real y NO INFLADO un aproximado de $18.000.000.oo

16. Las oficinas de la gobernación al igual que el mismo archivo, conlleva a pensar que se van a almacenar documentos privilegiados, como expedientes, una amplia variedad de materiales, como acetatos, películas, papel, vitelas, pergaminos, papiros, video, DVD´s, documentos fotográficos, documentos audiovisuales y formatos digitales, todos ellos en diversos tipos de soportes (mecánicos, fotográficos, magnéticos y ópticos), los cuales requieren de unas condiciones muy especiales por su alto grado inflamable, es por ahí que uno ve en la norma técnica colombiana NTC 5921, que esos lugares NO DEBEN tener ventanas, ni exposición, al sol, ni factores de riesgo cercanos *-estación de gasolina, equipos médicos porque hay varias IPS en Green Hills-*, ademas la cercania con la carrilera del tren y la doble calzada, genera el riesgo de ser una instalacion estratégica que serían objetivo en un conflicto armado, ataque terrorista o disturbios civiles, cerca al rio chulo, el cual esta plagado de rodedores, entre otros riesgos que no se vieron en los estudios previos que se encuentran en el SECOP

17. Del archivo de esta compra que se encuentra en el SECOP publicado, por demás, como una compra directa, se puede sorprender cualquier ingeniero, que faltaron los siguientes estudios, sobre que reformas requería la construcción para adecuarla para oficinas del orden institucional y el costo aproximado -principio de planeación-, estudio de seguridad, estudios técnicos, que analizaran el grado de protección, restricciones del uso y modificación, el estado de la estructura, su capacidad portante, la cimentación, las condiciones ambientales y sus variantes, el estado de las redes de servicios públicos domiciliarios.

18. No hay un estudio financiero, ni de la anterior administración ni de la actual, sobre que estos 8 locales están dentro de una Propiedad Horizontal, donde la gobernación entra a un régimen de propiedad horizontal, a generar unos gastos mensuales sobre la administración, no tiene prebendas por ser un ente territorial, dineros que son de orden publico.

19. No se ve dentro de los estudios previos el levantamiento topográfico de los 8 locales, estudio de condiciones climáticas para reducir los riesgos por los factores que la ubicación de green hills genera (transito, volumen, cercania doble calzada, seguridad, sol, lluvia, vientos) y así, disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía, agua, entre otros, y poder saber porque si la copropiedad tiene vigilancia privada y presupuestada en la cuota de administración que la gobernación paga mes a mes. **¿Porque la gobernación dispone de 2 puntos de seguridad por local?**

20. El contrato CD-3564-2023 firmado por el gobernador de Boyacá y el grupo empresarial Bancolombia S.A, padece nulidad por carecer de estudio de títulos claro, legal, pues la etapa precontractual, como se aprecia del SECOP fue en cada estudio un

Copy and Page, en lo que difieren fue en las matriculas y las ubicaciones por bloque, pero raya porque no hubo análisis del sector en el mercado, para tener esa cuantía el contrato se optó por contratación directa y no por contratos tipo y menos una subasta, o pliego de condiciones,

21. También salta a la vista si el objeto de contratación perseguido era la necesidad de garantizar que el archivo central de la entidad …." *el interior del Edificio Palacio De La Torre es insuficiente para garantizar el repose y la transferencia de los archivos documentales, por lo cual es necesario contar con que tenga la capacidad estructural para recibir las dependencias de la Gobernación de Boyacá y garantizar acceso a la información"* los inmuebles adquiridos en green hills, **ninguno tiene vocación para lograr satisfacer tal necesidad**, y asi se señala en un estudio que se registró en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental No 2023 00415 0144 y que fuera parte del **Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023**, el cual al final señala

7. PRUEBAS

1. Secop, contrato CD-3564-2023, en el cual versa: promesa de venta de 03 de agosto de 2023

2. Norma Técnica Colombiana NTC 5921 de 2018, el cual permite demostrar que las instalaciones adquiridas por la Entidad no cumplen con los lineamientos para su fin (12 folios)

6 attachments

- **3. CERT PAA-rPREDIOS GREEN HILLS.pdf** 140K
- **4. C4423 CDP.pdf** 197K
- **2. ESTUDIO PREVIO (1).pdf** 1055K
- **6. OFERTA GREEN HILLS DEPARTAMENTO.pdf** 1129K
- **2. ESTUDIO PREVIO.pdf** 1055K
- **1. DOCS PROYECTO.pdf** 995K

Las cuales fueron desarrolladas en el aparte 11 de este informe.

7. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Es responsabilidad del sujeto de control formular y ejecutar, para cada uno de los hallazgos contenidos en el presente Informe final, acciones correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. La verificación por parte del equipo auditor no implica aprobación de la efectividad o coherencia de las acciones de mejora propuestas.

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Boyacá, en el término de diez (10) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de comunicación del informe definitivo.

Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por ende diligenciar el formato adjunto.

Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo estipulado la Resolución 096 de 2025. Solo se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución.

8. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

En el desarrollo de la Auditoria Financiera de Gestión y Resultados, se realizaron acciones que dieron lugar a la configuración de beneficio de Auditoria tal como se indica en el cuadro siguiente:

Tabla 1 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO	Valor
1	**Proceso Auditor, verificación de los documentos propios del proceso contractual**	Revisada la información correspondiente a la etapa precontractual de los convenios inter administrativos 08667 DE 2026 **0657 DE 2025, . 0657 DE 2025, 3261 DE 2025, 3848/2024, 4394/2024, 4503/2024, 4586 DE 2024, 4722/2024,** No se encuentra publicada la propuesta presentada por los proponentes	Realizar el cargue correspondiente de la propuesta y los demás documentos que forman parte integral del expediente para dar cumplimiento al manual de contratación dispuesto por la Gobernación de Boyacá	Cualitativo	Al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad., se restable el Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica de Los proponentes. Cumpliendo al 100% de el control de legalidad verificado en la plataforma SIA Observa.	

Fuente: Documentos Gobernación de Boyacá, SECOP II y SIA OBSERVA.

9. RESUMEN DE HALLAZGOS

En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron cincuenta y dos (52) Hallazgos administrativos con las connotaciones relacionados a continuación:

Tabla 2 RESUMEN HALLAZGOS

Tipo de Hallazgos	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativos (total)	52	
2. Disciplinarios	12	
3. Penales	0	
4. Fiscales	0	0
5. Sancionatorios	0	

Fuente: Comisión Auditora

Atentamente,

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
Carlos Andrés Aranda Camacho
CONTRALOR

CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO
Contralor General de Boyacá

Opinión financiera avalada por:

Salvador Peña Cortes
Contador Público T.P. 2326
Auditor.

10. MUESTRA DE AUDITORIA

10.1. GESTIÓN FINANCIERA

Como parte del proceso de Auditoría de la vigencia 2025, se seleccionó una muestra selectiva y priorizada de las cuentas del Estado de Situación Financiera de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, determinada bajo criterios de materialidad, representatividad e impacto presupuestal. Esta evaluación se orientó a verificar la razonabilidad de los saldos, la veracidad de los registros y el cumplimiento de los marcos normativos contables aplicables al sector público. A través de este análisis, se contrastaron las cifras reportadas con sus respectivos libros auxiliares y soportes físicos, con el propósito de emitir opinión sobre los estados financieros y la efectividad de los controles internos institucionales. A continuación, se detallan las cuentas seleccionadas:

Tabla 3 MUESTRA FINANCIERA GOBERNACIÓN DE BOYACA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	**ACTIVOS**	**5,205,863,684,712.00**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	438,799,283,537.00
13	CUENTAS POR COBRAR	571,438,792,674.00
15	INVENTARIOS	556,908,078.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	509,823,901,270.00
1605	Terrenos	207,223,727,111.00
1640	Edificaciones	185,901,273,276.00
1655	Maquinaria y equipo	22,667,896,951.00
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	39,183,554,413.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1,721,050,209,321.00
1710	Bienes de Uso Público en servicio	2,141,294,853,466.00
1715	Bienes Históricos y Culturales	6,029,632,156.00
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio (CR)	-426,263,466,550.00
1786	Depreciación Acumulada de Restauraciones de Bienes Históricos y Culturales (CR)	-10,809,751.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,959,505,147,301.00
1906	Avances y Anticipos	214,339,377,819.00

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS GOBERNACIÓN DE BOYACÁ-CHIP CONTADURIA.

10.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL

La evaluación de la gestión presupuestal de la GOBERNACIÓ9N DE BOYACÁ para la vigencia fiscal 2025 se fundamentó en una muestra selectiva y priorizada de los registros, orientada a verificar el cumplimiento de los principios de legalidad, planificación y sostenibilidad financiera consagrados en el Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes. A través de este análisis integral, se validó la trazabilidad de los recursos desde su programación inicial hasta su efectiva

ejecución, sirviendo como soporte para la determinación de los hallazgos detallados en este informe respecto a los siguientes componentes:

- Programación, aprobación y Modificaciones del presupuesto
- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Conciliación de recursos estado de situación de tesorería
- Verificación de datos referente a la certificación Ley 617
- Constitución y ejecución de reservas
- Constitución y ejecución de cuentas por pagar
- Cobertura del Componente ambiental.

10.2.1 Ejecución Contractual

La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, rindió un total de **3.887** contratos por valor de **$801.367.160.860** con adiciones por valor **de $43.014.026.507** para un total por valor de **$844.381.187.367**, reflejados en la vigencia auditada en el SIA OBSERVA y SECOP, cuya fuente de financiación con recursos propios fueron **1100** contratos por valor total de **$84.000.659.612, del SGP** se realizaron 336, con valor total de $14.242.502.573, de Regalías 2.112 contratos y otros 339 contratos; de los cuales para el desarrollo de la auditoría se determinó una muestra de **63** contratos, equivalente al **10.92**% de la ejecución de los recursos, por la suma de **$92.179.173.522.40**; más los convenios interadministrativos Nos.: 0657 y 3261 de 2025, por valor total de $16.591.972.880, tal como se relaciona a continuación.

Tabla 4 CONTRATACION POR CLASE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ VIGENCIA 2025

No. CONTRATOS	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
3058	C1 Prestación de Servicios	233,311,841,925	28,343,702,791	261,655,544,716
9	C2 Consultoría	3,337,019,765	64,659,276	3,401,679,041
136	C5 Compra Venta y/o Suministro	64,119,093,809	1,269,737,264	65,388,831,073
31	C8 Arrendamiento	4,143,029,252	33,000,000	4,176,029,252
6	C9 Seguros	4,856,484,287	1,985,409,539	6,841,893,826
647	C10 Otros	491,599,691,822	11,317,517,637	502,917,209,459
3887	**TOTAL**	**801,367,160,860**	**43,014,026,507**	**844,381,187,367**

Fuente: SIA CONTRALORIAS FORMATO F13A_AGR.

La muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios contractuales, de la función administrativa y de la gestión fiscal, en especial los de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual

forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a los requisitos de ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación, entre otros. A continuación, se presenta la contratación rendida, la cual fue objeto de la muestra de contratación:

Tabla 5 MUESTRA CONTRATACIÓN - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ VIGENCIA 2025

No.	(C) Número Del Contrato	(C) Fuente De Recurso	(C) Objeto	(D) Valor Del Contrato	(C) Nombre Del Contratista	(D) Valor Adición
1	2344/2024	RENTAS PROPIAS	AUNAR ESPUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE ORGANIZACION DIFUSION Y GESTION DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DE LA AGENDA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN LA VIGENCIA 2024	800,000,000.00	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA	391,472,745.40
2	3848/2024	RENTAS PROPIAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y ENTIDAD DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL APROVECHAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE APRENDIZAJE EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	602,065,000.00	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	-
3	4003/2024	RENTAS PROPIAS	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA PARA APOYAR LA PARTICIPACION DE LOS ATLETAS DE DEPORTES CONVENCIONAL Y PARALIMPICO QUE REPRESENTAN AL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES VERSION I	2,099,109,889.00	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE INDEPORTES BOYACA	-
4	4362/2024	RENTAS PROPIAS	AUNAR ESFUERZOS CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	14,560,000,000.00	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA	5,200,000,000.00
5	4394/2024	RENTAS PROPIAS	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE POBLACION DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑIA VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	525,146,500.00	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	-
6	4503/2024	RENTAS PROPIAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICO DE AGUAS	531,136,032.00	AQUALAB SAS	-
7	136099-2024	RENTAS PROPIAS	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIONES MISIONALES	3,145,414,988.00	Yokomotor S. A	-
8	126901-2024	RENTAS PROPIAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, DIÉSEL, DIÉSEL PREMIUM,) PARA ELFUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE LOSVEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	568,500,000.00	Organización Terpel S.A.	271,869,274.00
9	1791/2024	RENTAS PROPIAS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,300,000,000.00	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	-
10	108	RENTAS PROPIAS	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 N.º 9-24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 070-207456 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2025.	109,525,118.00	MARIA DEL CARMEN BOTIA CRISTANCHO	-
11	111	RENTAS PROPIAS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA RED RADIOCOMUNICACIONES DE EMERGENCIAS	13,209,984.00	ALONSO AVILA MONTAÑA	-

12	177	RENTAS PROPIAS	AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA COTELCO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE BOYACÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2025	60,000,000.00	COTELCO BOYACA	-
13	185	RENTAS PROPIAS	SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA BOYACA NOS ALIMENTA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	220,621,050.00	CORPORACION DE PROFESIONALES AMBIENTALES Y CIVILES	-
14	253	RENTAS PROPIAS	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 N° 20 -35 DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 865M2 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 070-85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2025.	277,728,000.00	LEONARDO QUIROGA REYES	-
15	369	RENTAS PROPIAS	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 17 N° 14 A-72 BARRIO EL TOPO DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1.100M2 APROXIMADAMENTE IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 070-142505 DESTINADO A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2025	120,406,902.00	JUAN MANUEL ALVAREZ CARDENAS	-
16	514	RENTAS PROPIAS	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 NO 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 070- 32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025.	210,981,282.00	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA	-
17	537	RENTAS PROPIAS	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nos. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016 FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL EDUARDO TORRES QUINTERO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA EL AÑO 2025.	216,390,000.00	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA	-
18	1019	RENTAS PROPIAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE GASOLINA EXTRA DIESEL DIESEL PREMIUM) PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	120,997,500.00	VARESCO FUEL OIL SAS	-
19	1161	RENTAS PROPIAS	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 3	1,013,919,737.00	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	-
20	1163	RENTAS PROPIAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS INDICADORES Y PROYECTOS DEL PLAN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	28,623,700.00	DIEGO EDUARDO HIGUERA GUTIERREZ	13,085,118.00
21	1179	RENTAS PROPIAS	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 1	2,699,000,000.00	HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS FABIÁN A GONZÁLEZ RAMÍREZ	-
22	1299	RENTAS PROPIAS	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS N° 101 ASAMBLEA PISO CUARTO PISO QUINTO PISO SEXTO OFICINAS 603 604 607 608 Y PISO ONCE CON UN ÁREA APROXIMADA DE 2.37533 MTS2 UBICADAS EN LA CALLE 19 N°9-35 EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ DE PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2025.	238,948,599.00	LOTERIA DE BOYACA	-
23	46	RENTAS PROPIAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	1,300,000,000.00	UNION TEMPORAL GB 24	-

24	4631	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOGÜI PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	684,088,049.00	MUNICIPIO TOGUI	-
25	4714	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	702,627,104.00	MUNICIPIO CHITARAQUE	40,060,782.00
26	4669	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TIBANÁ PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	711,912,640.00	MUNICIPIO TIBANA	55,290,144.00
27	4655	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TASCO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	724,043,548.00	MUNICIPIO TASCO	-
28	4688	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	724,501,381.00	MUNICIPIO CIENEGA	20,215,071.00
29	4687	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	734,037,094.00	MUNICIPIO MIRAFLORES	-
30	4742	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TURMEQUE PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	777,704,848.00	MUNICIPIO TURMEQUE	-
31	4674	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CUBARA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	786,448,822.00	MUNICIPIO CUBARA	24,438,057.00
32	4637	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MUZO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	804,873,141.00	MUNICIPIO MUZO	-
33	4664	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	823,163,736.00	MUNICIPIO SOTAQUIRA	64,657,440.00

34	4740	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	825,962,648.00	MUNICIPIO RAMIRIQUI	14,969,766.00
35	4665	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE ARCABUCO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	849,208,909.00	MUNICIPIO ARCABUCO	-
36	4673	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TIBASOSA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	898,100,181.00	MUNICIPIO TIBASOSA	-
37	4724	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SANTANA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	913,738,314.00	MUNICIPIO SANTANA	54,489,918.00
38	4641	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOCOTA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	926,556,729.00	MUNICIPIO SOCOTA	25,865,277.00
39	4685	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOCHA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	994,010,589.00	MUNICIPIO SOCHA	28,342,074.00
40	4731	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SABOYA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,052,947,523.00	MUNICIPIO SABOYA	70,159,705.00
41	4683	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,063,888,348.00	MUNICIPIO OTANCHE	116,432,096.00
42	4718	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHITA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,077,062,283.00	MUNICIPIO CHITA	50,938,445.00
43	4699	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUTA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,102,121,090.00	MUNICIPIO DE TUTA	30,978,021.00

44	4710	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,108,906,472.00	MUNICIPIO SIACHOQUE	40,713,344.00
45	4621	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,159,590,292.00	MUNICIPIO BELEN	-
46	4643	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SORACA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,185,470,027.00	MUNICIPIO SORACA	91,191,176.00
47	4677	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GUATEQUE PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,218,810,834.00	MUNICIPIO GUATEQUE	35,261,709.00
48	4657	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,286,070,774.00	MUNICIPIO GARAGOA	-
49	4658	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOCA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,313,134,532.00	MUNICIPIO TOCA	100,230,064.00
50	4708	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NOBSA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,490,327,821.00	MUNICIPIO NOBSA	41,958,225.00
51	4728	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	1,720,070,400.00	MUNICIPIO VENTAQUEMADA	80,642,845.00
52	4629	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE AQUITANIA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	1,912,381,874.00	MUNICIPIO AQUITANIA	-
53	4614	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	2,529,583,885.00	MUNICIPIO MONIQUIRA	168,205,436.00

54	4705	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2,724,777,596.00	MUNICIPIO PAIPA	-
55	4692	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAMACA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	3,040,225,644.00	MUNICIPIO SAMACA	267,162,318.00
56	4609	OTRO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	5,550,524,892.00	MUNICIPIO CHIQUINQUIRA	-
TOTAL				74,178,596,301.00		7,298,629,050.40
GRAN TOTAL				81,477,225,351.40		

Fuente: SIA CONTRALORIAS FORMATO F13A_AGR.

Muestra de contratación para la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, las siguientes:

Tabla 6 MUESTRA CONTRATACIÓN DOOCVCA -CGB -GOBERNACIÓN DE BOYACÁ VIGENCIA 2025

No.	(C) Número Del Contrato	(C) Objeto	(D) Valor Del Contrato	(C) Nombre Del Contratista	(F) Fecha Firma	(F) Fecha Iniciación	(D) Valor Adición	(D) Valor Pagos Efectuados
1	4270/2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIVATA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACION Y EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE CHIVATA.	1,591,424,184.00	MUNICIPIO CHIVATA	11/1/2024	11/1/2024	0	1,589,997,454.18
2	4586/2024	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SOATA VEREDAS HATILLO Y MOLINOS MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXION Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	569,998,800.00	EMPRESA GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. GAS	12/10/2024	12/16/2024	0	569,998,800.00
3	4722/2024	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERI\IACION IRE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RAQLJIRA PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA DEPARTAMENTO RE BOYACÁ	35,657,190.83	JAC VEREDA RESGUARDO MUNICIPIO DE RRAQUIRA	12/19/2024	12/27/2024	0	35,657,190.83
4	2094/2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MARIPI PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA.	846,108,981.00	MUNICIPIO MARIPI	5/4/2023	5/10/2023	124,755,267.00	-
5	845	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	2,385,617,800.00	YESID AVILA TORRES	2/13/2025	3/17/2025	0	2,385,617,800.00

6	1519	EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ	2,830,792,682.00	IGS INGENIERIA EU JORGE EDUARDO ARRIETA ROA	3/7/2025	5/16/2025	0	2,830,596,032.00
7	1529	EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA BOYACÁ	2,317,593,267.00	IGS INGENIERIA EU JORGE EDUARDO ARRIETA ROA	3/7/2025	5/16/2025	0	2,303,203,293.00
TOTAL			**10,577,192,904.83**				**124,755,267.00**	**9,715,070,570.01**
TOTAL GENERAL							**10,701,948,171.83**	**9,715,070,570.01**

Fuente: SIA CONTRALORIAS FORMATO F13A_AGR.

Contratos que se desarrollaron en la presente auditoria que corresponden a dos (2) denuncias, así:

Tabla 7 CONTRATOS TIERRASUA - GOGERNACION DE BOYACÁ VIGENCIA 2025

No.	Contrato No.	Contratista	Objeto	Cuantía
1	CO1. PCCNTR.8374 718/3261	TIERRASUA S.A.S.	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	$ 11.541.976.480.00
2	CONVENIO INTERADMINI STRATIVO No. 0657 de 2025	TIERRASUA S.A.S.	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	$5.049.996.400.00
TOTAL				$16.591.972.880.00

Fuente: SIA CONTRALORIAS FORMATO F13A_AGR FICHA TÉCNICA AMBIENTAL.

En la vigencia fiscal 2025, se efectuó el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó el valor total de presupuesto ambiental por valor de **$23.769.991.554,** Valor ejecutado de **$14.128.335.539,** valor por ejecutar de **$9.641.656.015,** así:

Tabla 8 EJECUCIÓN RECURSOS COMPONENTE AMBIENTAL

VALORES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS FICHA TECNICA	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	23.769.991.554
COMPROMETIDOS	14.128.335.539
POR EJECUTAR	9.641.656.015

Fuente: FICHA TÉCNICA AMBIENTAL.

10.2.2. Planeación Y Resultados

Fueron evaluados las siguientes metas que se desprenden de las Líneas Estratégicas, de programas y clasifican de acuerdo al sector que pertenecen:

Tabla 9 MUESTRA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

Estrategia De Desarrollo	Dimensión De Desarrollo	Apuesta De Desarrollo
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 “Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande”
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 “Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande”
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 “Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande”
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motora de la competitividad
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motora de la competitividad
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motora de la competitividad
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.3 Derecho humano a la alimentación, engrandece a Boyacá
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.3 Derecho humano a la alimentación, engrandece a Boyacá
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.1 Agua para todos, agua para la vida por una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.1 Agua para todos, agua para la vida por una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.4 Por el manejo sostenible de los residuos sólidos para una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.4 Por el manejo sostenible de los residuos sólidos para una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande

Fuente: Documentación de Secretarias de Planeación y Hacienda Gobernación de Boyacá.

11. ATENCIÓN A DENUNCIAS FISCALES

Fueron incorporadas dos (4) denuncias fiscales a la auditoría financiera, de gestión y resultados a la vigencia 2025, relacionadas con: la contratación vigencia fiscal 2025; a las cuales se les dio respuesta de fondo, en los términos que se describen a continuación:

DENUNCIA No. 1

Antecedentes

Mediante oficio SG-2026-059, firmado por el doctor CESAR DAVID BUITRAGO VELANDIA, en su condición de la Secretario General de la Contraloría General de Boyacá, en el que pone en conocimiento la denuncia allegada por la Personería de Cuítiva, la cual gira en torno al Convenio Interadministrativo No. 0657 de 2025, celebrado por la Gobernación de Boyacá.

Ilustración 1



SG-2026-059

Tunja, 03 de febrero de 2026

Señores
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
controlfiscal@cgb.gov.co
Ciudad

Asunto: **PONE EN CONOCIMIENTO PARA FINES PERTINENTES**

Respetuoso saludo,

La presente tiene la intención de poner en conocimiento denuncia allegada por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE CUITIVA la cual gira entorno al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0657 de 2025, celebrado por la Gobernación de Boyacá.


Sobre la base de lo anterior, se solicita se incluya el citado negocio jurídico dentro de la muestra contractual a desarrollarse en el marco del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT – 2026. En ese sentido, se hace remisión del escrito de la denuncia junto con sus anexos, para que de manera particular se incluya el citado convenio dentro del proceso auditor.

Atentamente,

CESAR DAVID BUITRAGO VELANDIA
Secretario General
Contraloría General de Boyacá

Mediante oficio de la Contraloría General de la República SGD 18-12-2025, cuyo origen es: 80154 GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE BOYACA/HUGO ARMANDO ALARCON ALDANA, con destino: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ, con ASUNTO: TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICIÓN 2025-362007-80154-NC, tal como se observa:

Ilustración 2

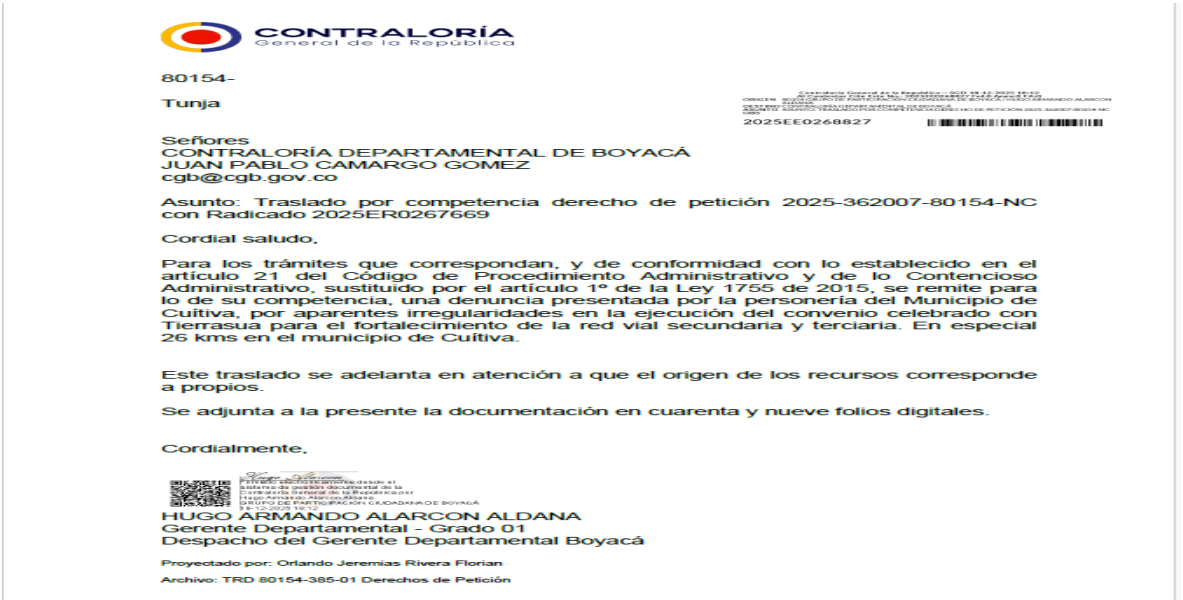

CONTRALORÍA
General de la República

80154-

Tunja

2025EE0268827

Señores
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ
cgb@cgb.gov.co

Asunto: Traslado por competencia derecho de petición 2025-362007-80154-NC con Radicado 2025ER0267669

Cordial saludo,

Para los trámites que correspondan, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, se remite para lo de su competencia, una denuncia presentada por la personería del Municipio de Cuitiva, por aparentes irregularidades en la ejecución del convenio celebrado con Tierrasua para el fortalecimiento de la red vial secundaria y terciaria. En especial 26 kms en el municipio de Cuitiva.

Este traslado se adelanta en atención a que el origen de los recursos corresponde a propios.

Se adjunta a la presente la documentación en cuarenta y nueve folios digitales.

Cordialmente,

HUGO ARMANDO ALARCON ALDANA
Gerente Departamental - Grado 01
Despacho del Gerente Departamental Boyacá

Proyectado por: Orlando Jeremias Rivera Florian
Archivo: TRD 80154-385-01 Derechos de Petición

Para lo cual adjuntan con oficio dirigido al Señor Personero Fabio Guillermo Araque Álvarez, en respuesta al derecho de petición 2025-362007-80154-NC, así:

Ilustración 3

CONTRALORÍA General de la República

80154-

Tunja

Contraloría General de la República - SIGD 18:32 2025 18:32
ORIGEN
DESTINO
ASUNTO
OBS
2025EE0268826

Señor/Señora
FABIO GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ
personeria@cuitiva-boyaca.gov.co

Asunto: Respuesta derecho de petición 2025-362007-80154-NC con Radicado 2025ER0267669

Cordial saludo,

Este Despacho se permite informar que, se recibió en la Contraloría General de la República, a través de la página web, una comunicación registrada en el Sistema de Información para la Participación Ciudadana SIPAR, con el número de la referencia, relacionada con aparentes irregularidades en la ejecución del convenio celebrado con Tierrasua para el fortalecimiento de la red vial secundaria y terciaria. En especial 26 kms en el municipio de Cuítiva.

En atención a la misma y una vez analizado el asunto, este Despacho se abstiene de adelantar cualquier trámite de tipo fiscal, debido a que la Contraloría General de la República no tiene competencia para asumir el conocimiento del mismo, en concordancia con el artículo 267 de la Constitución Política, en donde dispone que este ente ejerce el control fiscal de manera posterior y selectiva a la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos de la Nación, lo que implica que cualquier otro tipo de intervención escapa de la órbita de su competencia como ocurre en el presente caso, en el que la fuente de recursos corresponde a propios del Departamento.

Se establece que el ente competente para dar respuesta a su solicitud es la Contraloría General de Boyacá, entidad a la cual fue trasladada en atención a que, los recursos son propios.

Resultados del proceso de auditoría

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0657 DE 2025

Ilustración 4

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-0657-2025	2025	(901285377) TIERRA SUA S.A.S.	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	$ 4.999.999.900	2025/07/12	14	10	71,4 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-0657-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CV-GB-0657-2025	Contractual	9	5	55,6 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✔	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✔	4	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	✔	1	Requerido
Contractual	INFORME DE LAS ENTIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✔	14	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✔	14	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

Tabla 10

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-0675-2025
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0657 DE 2025
CONTRATISTA	TIERRASUA S.A.S.
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA SAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR	**$ 5.049.996.400,00**
ADICIONAL	**$ 2.497.513.000,00**
VALOR TOTAL	**$ 7.547.509.400,00**
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA OBSERVA - SECOP II - Información complementaria.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0657 DE 2025.

CONDICION: No se encuentra publicada la propuesta presentada por TIERRASUA, por tanto, no se puede corroborar que los informes expedidos estén acordes. En el pago parcial # 1 no se encuentra publicada la orden de pago y comprobante de egreso respectivo.

La publicación de orden de pago y egreso se encuentran extemporáneos superan los 3 días mínimos permitidos.

El trámite de acta parcial # 7 en plataforma fue rechazado, el mismo autoriza un pago por valor de $ 686.905.200,00 del cual se amortiza $ 343.452.600,00.

En los soportes de ejecución se reporta Acta Parcial # 8 con fecha 10 de noviembre de 2025. por valor de $693.736.431,67 – Acta Parcial # 9 con fecha 20 de noviembre de 2025,
por valor de $ 792.105.300,00.

Con fecha 26 de diciembre de 2025, se establece por parte del supervisor y contratista del recibido a satisfacción del convenio en observación confirmando el siguiente balance:

Tabla 11 COMPARATIVO

CONCEPTO	RECURSOS TIERRASUA S.A.S		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 74.509.500,00		$ 7.472.999.900,00	
Amortización Anticipo				$ 490.709.187,50
Valor a pagar de la presente acta				$ 489.634.562,50
Valor Total actas pagadas		$ 74.509.500,00		$ 6.491.581.525,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)				$ 1.074.625,00
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)				
Sumas Iguales	$ 74.509.500,00	$ 74.509.500,00	$ 7.472.999.900,00	$ 7.472.999.900,00

Fuente: SIA OBSERVA - SECOP II - Información complementaria.

Cotejado el F13 rendido se establece como valor pagado la suma de $5.544.180.662.00 lo cual es equivalente hasta el acta parcial # 6.

Se encuentra diferencia en la información cargada por el supervisor, a partir del Acta # 7 frente a el plan de pagos aprobado por Central de Cuentas y Tesorería y con la información reportada en la Rendición de Cuenta F13. El cumplimiento del control de legalidad está en el 71.4%

CRITERIO: Se incumplen por parte de la supervisión y los funcionarios responsables de pago con la Constitución Política, Articulo 209. Ley 1474 de 2011, Artículos 83 y 84. Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Ley 80 de 1993, Articulo 24. Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente (Decreto Ley 4170 de 2011). Manuales de contratación e interventoría de la Gobernación de Boyacá. Vulneración de principio de transparencia conforme lo establece la Ley 2195 de 2022. No se realiza el correcto diligenciamiento del formato f13a_agr. Contratación; en virtud de las Resoluciones Nos.: 494 de 2017 y 004 del 07 de enero de 2025 por el cual se establece la rendición de cuentas

CAUSA: Inefectividad de controles o no aplicación de los mismos, falta de interoperabilidad y verificación de lleno de requisitos para pagos; diferencias conceptuales entre funcionarios responsables de trámite; falta de controles y ética incumplimiento total. Extemporaneidad en la publicación de informes y avance de ejecución por parte del supervisor.

EFECTO: Vulnero el principio de transparencia y el libre acceso a la información pública e inefectividad de la información para los posibles usuarios.

Por otra parte, con oficio DOOCVCA -030 con fecha 25 de mayo de 2026, la Dirección de Obras Civiles y Costos Ambientales de la Contraloría General de

Boyacá, cuya referencia es: Denuncia presuntas irregularidades en el convenio cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".* El presente Informe técnico, hace parte integral de la presente auditoría, el cual se anexa.

Informa también, que atendiendo el traslado de la CGR: "Traslado por competencia derecho de petición 2025-362007-80154-NC con Radicado 2025ER0267669" en el cual menciona que *se remite para lo de su competencia,* (CGB) *una denuncia presentada por la personería del Municipio de Cuítiva, por aparentes irregularidades en la ejecución del convenio celebrado con TIERRASUA para el fortalecimiento de la red vial secundaria y terciaria. En especial 26 kms en el municipio de Cuítiva.*

En uno de los apartes del informe técnico se menciona: "… Es importante mencionar que el municipio celebró contratos durante la vigencia 2025 para la conformación de vías terciarias, los cuales incluían el suministro y transporte de material para las vías intervenidas. Asimismo, se evidenció que la maquinaria amarilla utilizada para la instalación y compactación de dicho material correspondía a la maquinaria vinculada al convenio objeto de estudio de la presente denuncia. De acuerdo con los registros de los contratos suscritos por el municipio, se reportó la ejecución de intervenciones sobre 21,92 km de vías terciarias y 5,6 km de vía departamental.

CONCLUSIONES

- El convenio estudio de la denuncia y que se analiza en este informe es el 0657 *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA*
- Las actividades del convenio 0657 *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"*, están dadas en horas/máquina y no en longitud.

- Las horas maquina ejecutadas se encuentran soportadas en los informes 4 y 5 del convenio de TIERRASUA, actividades ejecutadas durante los meses de mayo y junio de 2025
- Para el municipio de Cuítiva se ejecutaron 140 horas de vibro compactador, 161 horas de motoniveladora y 56 horas de retroexcavadora. Para un total de 73.430.000 COP.
- De acuerdo a la longitud reportada por TIERRASUA, soportada mediante georreferenciación de los GPS de la maquinaria se intervinieron 25.98 Km
- De acuerdo con lo reportado por el municipio de Cuítiva, bajo los contratos realizados por el mismo, se intervinieron 21.92 km de mantenimiento de vías del municipio y 5.6 Km sobre vía departamental.
- Existe la evidencia suficiente y pertinente para soportar que las intervenciones que ejecuto TIERRASUA mediante el convenio 0657 *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA* se realizaron sobre 25.98 Km sobre las vías del municipio de Cuítiva.

Al verificase según la respuesta que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad.

Por otra parte. Revisada la plataforma SECOP II con fecha de corte 28/08/2026, se constató de forma objetiva que los documentos del Acta Parcial No. 1 continúan sin publicarse, habiéndose cargado un documento erróneo que no corresponde al trámite legal. Por lo tanto, al haber quedada plenamente demostrada la ruptura temporal del principio de publicidad durante la vigencia auditada.

Respecto a las Actas Parciales No. 7 (por valor de $686.905.200,00), No. 8 y No. 9, la Gobernación reconoció y aceptó expresamente la extemporaneidad en el cargue de la información contractual y financiera en sus descargos.

Persiste la asimetría de información entre el plan de pagos de la Central de Cuentas y Tesorería frente a lo reportado en los formularios de rendición de la cuenta (F13). El desfase cronológico entre la ejecución material del gasto (vigencia 2025) y su reporte extemporáneo en la rendición de la cuenta (vigencia 2026) constituye una

falla de oportunidad. Las explicaciones narrativas de la entidad carecen de fuerza vinculante o soporte contable-presupuestal para desvirtuar la inconsistencia.

Respecto a las Actas Parciales No. 7 (por valor de $686.905.200,00), No. 8 y No. 9, la Gobernación **reconoció y aceptó expresamente la extemporaneidad** en el cargue de la información contractual y financiera en sus descargos. Por lo tanto, al haber quedado plenamente demostrada la ruptura temporal del principio de publicidad durante la vigencia auditada.

Por lo expuesto, la observación se consolida como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 1**, por presunta vulneración al principio de publicidad y los deberes del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario). Presunta vulneración al principio de publicidad y los deberes del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario). Vulneración de principio de transparencia conforme lo establece la Ley 2195 de 2022. No se realiza el correcto diligenciamiento del formato f13a_agr. Contratación; en virtud de las Resoluciones Nos.: 494 de 2017 y 004 del 07 de enero de 2025. Deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

Al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad. Esta condición particular se considera SUBSANADA y se configura como **BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA**: Está condición particular se considera SUBSANADA Y UN BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA:

- **Descripción del Beneficio:** Restablecimiento del Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica del proponente **TIERRASUA** dentro del Convenio Interadministrativo 657 de 2025.
- **Impacto en la Gestión:** A partir de la observación de auditoría notificada por este despacho, el sujeto de control (**Gobernación de Boyacá**) realizó las gestiones correctivas inmediatas para el cargue de la propuesta que se encontraba oculta o ausente en el sistema.
- **Valor Agregado:** Si bien la omisión inicial existió, la intervención oportuna de la Contraloría garantizó que el proceso recuperara la transparencia requerida, permitiendo a los ciudadanos y entes de control ejercer la veeduría correspondiente sobre los requisitos que dieron origen a la contratación. Esto fortalece el control interno institucional y eleva el índice de legalidad contractual de la entidad.

Se realizo actualización por parte de la Entidad y se confirma en plataforma SIA el control de legalidad del Convenio. **Esta condición particular se considera SUBSANADA Y UN BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA**



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-0657-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CV-GB-0657-2025	Contractual	9	9	100,0 %

- **Descripción del Beneficio:** Optimización del aseguramiento preventivo mediante la actualización e indexación al **100% del Control de Legalidad** del Convenio Interadministrativo 657 de 2025 en la plataforma del Sistema Integral de Auditoría (SIA).
- **Impacto en la Gestión:** Al inicio del proceso auditor, la Gobernación de Boyacá registraba un nivel de cumplimiento deficiente del **71.4%** en sus trámites obligatorios de control de legalidad. Como resultado directo del traslado de la observación y la intervención fiscal de este despacho, la entidad ejecutó las acciones de fondo necesarias para subsanar el rezago y completar el 100% de la cobertura regulatoria exigida.
- **Valor Agregado:** Este ajuste garantiza el pleno alineamiento de la gestión contractual territorial con los parámetros normativos y las directrices internas de control. Al blindar legalmente las etapas del convenio, se reduce sustancialmente el riesgo latente de demandas, nulidades o parálisis operativas, asegurando que las actuaciones de la administración departamental gocen de la debida validez jurídica y transparencia institucional.

DENUNCIA No. 2

Antecedentes

1. Mediante correo electrónico con fecha 25 de febrero de 2026, la Dirección de Control Fiscal envía denuncia relacionada con un traslado de la oficina de Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá, con fecha 25 de febrero de 2026, cuyo asunto es: Traslado radicado CGB No. 20261100843 que dice:

Ilustración 5

Asunto: **TRASLADO RADICADO CGB N° 20261100843**

Respetuoso Saludo,

En atención al radicado de la referencia, por medio del cual el señor Andrés Felipe Cifuentes Perdomo, en calidad de Director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, allegó copia de oficio, refiriendo lo siguiente:

"… Con mérito en lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política modificado por el Acto legislativo 04 de 2019, y en el marco de las atribuciones que le otorga a este órgano de control el Decreto Ley 403 de 2020, la Dirección de Análisis de Información y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, se encuentra verificando en tiempo real los procesos de contratación en los entes territoriales.

En ejercicio de lo anterior, la DIARI evidenció una alerta con ocasión del criterio Discrepancia en la valoración de aportes, el siguiente contrato.

Contratista	Número Contrato	Objeto del contrato	Cuantía
TIERRASUA S.A.S	CO1.PCCNTR.8374718/3261	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"	**$11.541.976.480**

…"

Al respecto y una vez analizado el asunto, se observa que el requerimiento hace mención a trámites propios de su dependencia. En consecuencia, se remite para que sea incluido en la auditoría de la Gobernación y de TIERRASUA S.A.S., y se adelanten las actuaciones a que haya lugar.

Se remite adjunto el radicado **CGB N° 20261100843** con su anexo.

Atentamente,

Cesar David Buitrago Velandia
Secretario General
Contraloría General de Boyacá (CGB)
Cr 9 # 17-50 Piso 4
Horario de Atención: Jornada continua de 8:00 am a 5:00 pm

Ilustración 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Doctor
Juan Pablo Camargo Gómez
Contralor Departamental de Boyacá
cgb@cgb.gov.co

2026EE0037966

Asunto. Comunicación de Alerta

Respetado señor Contralor

Con mérito en lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política modificado por el Acto legislativo 04 de 2019, y en el marco de las atribuciones que le otorga a este órgano de control el Decreto Ley 403 de 2020, la Dirección de Análisis de Información y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, se encuentra verificando en tiempo real los procesos de contratación en los entes territoriales.

En ejercicio de lo anterior, la DIARI evidenció una alerta con ocasión del criterio Discrepancia en la valoración de aportes, el siguiente contrato.

Contratista	Número Contrato	Objeto del contrato	Cuantía
TIERRASUA S.A.S	CO1.PCCNTR.8374718/3261	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"	**$11.541.976.480**

Por lo anterior, remitimos la información correspondiente, con la finalidad que se efectúe su revisión dentro del marco de su autonomía y competencia, esperando que este insumo sea de utilidad. Cualquier información adicional que usted requiera por favor no dude en solicitarla a este despacho.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE CIFUENTES PERDOMO
Director
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI

Elaboró: Adriana Ballena Santos -PUG01

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

Ilustración 7



Resultados del proceso de auditoría

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3261 DE 2025

Ilustración 8

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-3261-2025	2025	(901285377) TIERRA SUA S.A.S.	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	$ 11.541.976.480	2025/12/31	14	10	71,4 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-3261-2025	Precontractual	4	4	100,0 %
CV-GB-3261-2025	Contractual	8	6	75,0 %
CV-GB-3261-2025	Poscontractual	2	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	3	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	GARANTÍAS (AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	1	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 12

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-3216-2025
# CONTRATO	CO1.PCCNTR.8374718/3261

CONTRATISTA	TIERRASUA S.A.S.
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR	**$** 11.262.359.538,83
PLAZO	3 Meses
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA OBSERVA - SECOP II - Información complementaria.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3261 DE 2025.

CONDICION: No se encuentra publicada la propuesta presentada por TIERRASUA S.A. No se encuentran publicados los informes de avance de ejecución de acuerdo a las obligaciones contraídas en el convenio "***14.*** *Entregar informe mensual a los asignados como encargados de la supervisión por parte del Departamento, que incluya informes semanales de la maquinaria, previamente entregados al supervisor del CONVENIO…*".

Los convenios de Asociación y Contratos analizados año 2024 con ejecución 2025, equivalente a 13, se reflejan incumplimiento en el reporte de ejecución con variaciones significativas, del 22.2%; 44.4%; 55.6%; 64.3%; 71.4% y máximo el 85.7%. Lo cual obedece a la falta de cargue documental primordial como es el RPC, facturas, informes de supervisión**.**

De la muestra tomada (33) Convenios Interadministrativos (4637 …4742) que representan el 26.8% de los celebrados para cubrir el I Semestre PAE Vigencia 2025. Todos se encuentran incumpliendo la matriz de legalidad, su cumplimiento alcanzo al 71.4% Desarrollado de la siguiente forma:

Ilustración 9



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4692-2024	Precontractual	5	5	100,0 %
CV-GB-4692-2024	Contractual	9	5	55,6 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORME DE LAS ENTIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	3	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	3	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

MATRIZ DE LEGALIDAD AÑO 2025

Ninguno de los contratos auditados, cumple con la matriz de legalidad al 100%, la mayoría de documentos faltantes si se encuentran en la plataforma SECOP II, advirtiendo también que reiteradamente se evidencian los mismos errores u omisiones en el cargue de documentos definidos en la matriz.

PRECONTRACTUAL. - Los procesos auditados cumplen con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. Excepto en los procesos de Contratación Directa con Ofertas, que se omite en su totalidad la publicación de la oferta presentada por el Contratista.

PRECONTRACTUAL. Demora en la publicación de documentos esenciales para dar inicio al contrato especialmente. Registro Presupuestal de Compromisos, Designación de Supervisor y aprobación de pólizas. Se confirman algunos casos de cargue posterior a la suscripción del acta de inicio. No se están acatando responsabilidades en trámite de acuerdo al manual de contratación de la Gobernación y al de Supervisión e Interventoría.

CONTRACTUAL**.** La muestra auditada no cumplió con el 100% de publicidad en términos establecidos en la ley; ni en la parte de ejecución ni en el reporte de pagos los soportes se publican con extemporaneidad al pago.

Los contratos que recibieron anticipo, no presentan plan de inversión del anticipo; seguimiento al mismo y respaldo de los rendimientos generados por el anticipo y que le pertenecen a la entidad estatal. Responsabilidad a cargo de supervisor conforme al manual de supervisión … FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN.

Los informes de seguimiento deben tener trámite y publicación mensual, dentro de los términos de ley; circunstancia que no se cumple y que se encuentra en responsabilidad del supervisor.

El trámite de pagos, debe llevar soportados los documentos básicos del contratista, aprobados por el supervisor para poder expedir de orden de pago y comprobante de egreso y cargarlo en línea en la plataforma; de la muestra auditada ninguno cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos y/o en los términos establecidos para tal fin.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos lo que ocasiona en los usuarios una información errónea.

Por otra parte, con oficio DOOCVCA-I 026 con fecha 22 de mayo de 2026, la Dirección de Obras Civiles y Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, cuya referencia es: Auditoria Financiera, de gestión y resultados vigencia 2025, Departamento de Boyacá.

También informa, que el oficio esta soportado soporta en documentación obtenida en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP y carpetas digitalizadas allegadas por el grupo auditor.
En otro de sus apartes, concluyen que los valores unitarios pactados en el convenio, se ajustan a los precios de mercado para la fecha y sitio de ejecución de las obras.

ANÁLISIS DE CALIDAD.

Teniendo en cuenta la documentación objeto de análisis y estudio, se observa que el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de Duitama, departamento de Boyacá, suscrito a través del Convenio Interadministrativo CO1. PCCNTR.8374718/3261, se encuentra en ejecución, se observa que no se ha autorizado el pago de actas parciales, razón por la cual, aunque en informes se observa control de calidad de materiales, a la fecha no es posible emitir concepto de la calidad de obra, lo anterior en espera del resultado final de los trabajos planeados, ejecutados y recibidos.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo observado en el presente informe, el proceso contractual, presenta en sus estudios previos, descripción de la necesidad a satisfacer, que soporta técnicamente, la contratación realizada por el Departamento de Boyacá.

Del estudio realizado se concluye, que la Gobernación de Boyacá, soporta los precios del proceso contractual en las Resoluciones números 044 del 07 de junio de 2024 y 050 de 05 de mayo de 2025, mediante las cuales el Departamento de Boyacá, fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en su

jurisdicción, además de cotizaciones de mercado, documentos utilizados por esta Contraloría como parámetro de comparación de precios de mercado.

El Convenio Interadministrativo CO1. PCCNTR.8374718/3261, a la fecha se encuentra en ejecución, no presentan actas de recibo parcial, ni recibo final de obra y liquidación, por lo tanto, considerando las funciones constitucionales y legales atribuidas a esta Contraloría, el presente concepto técnico, se debe complementar una vez se obtengan las cantidades finalmente ejecutadas, costos de la ejecución de posibles ítems no previstos y concepto de calidad que se presenta con el resultado final de las obras ejecutadas, sustentadas en informes finales de cooperante y supervisión, que permitan soportar la totalidad de la malla vial intervenida en desarrollo del objeto contractual, por lo que se recomienda la realización de acciones fiscales a través de la realización de Control Físico, una vez liquidado el convenio. Este informe técnico DOOCVCA-I 026 hace parte integral de la presente auditoria el cual se anexa.

Analizado el actuar de la Entidad y del supervisor respecto al Convenio Interadministrativo No, 3261 de 2025; se confirma que las publicaciones se están realizando de forma extemporánea y solo como una reacción a la intervención de este equipo auditor. Se mantiene la debilidad en el control interno durante la etapa precontractual y de ejecución inicial. La extemporalidad en el SECOP vulnera el principio de publicidad en tiempo real (Decreto 1082 de 2015).

Por lo expuesto en la respuesta, la observación se consolida como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 2** y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento, la Entidad debe implementar control de alertas previas o listas de chequeo obligatorias de los contratos celebrados a través de mecanismos implementados por fin.

Por otra parte, al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad. **Esta condición particular se considera SUBSANADA y se configura como BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA:**

- **Descripción del Beneficio:** Restablecimiento del Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica del proponente **TIERRASUA** dentro del Convenio Interadministrativo 657 de 2025.

- **Impacto en la Gestión:** A partir de la observación de auditoría notificada por este despacho, el sujeto de control (**Gobernación de Boyacá**) realizó las

gestiones correctivas inmediatas para el cargue de la propuesta que se encontraba oculta o ausente en el sistema.

- **Valor Agregado:** Si bien la omisión inicial existió, la intervención oportuna de la Contraloría garantizó que el proceso recuperara la transparencia requerida, permitiendo a los ciudadanos y entes de control ejercer la veeduría correspondiente sobre los requisitos que dieron origen a la contratación. Esto fortalece el control interno institucional y eleva el índice de legalidad contractual de la entidad.

DENUNCIA No. 3

Antecedentes

Mediante correo electrónico con fecha 27 de febrero de 2026, dan traslado por competencia a la denuncia con radicado CGB No. 20261100774 la cual fue allegada a la Secretaria General de la Contraloría General de Boyacá el pasado 19 de febrero de 2026, por un ciudadano anónimo, quien remite la denuncia por presunto detrimento patrimonial, fraude a subvenciones y malversación de recursos del fondo de Víctimas.

Secretaria General de la CGB informa al respecto que, una vez efectuado el análisis correspondiente, identificó que la instancia competente para atender y dar trámite a la solicitud es la Oficina Operativa de Control Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, en consideración a que la Gobernación de Boyacá ostenta la calidad de sujeto de control fiscal de esta entidad.

En consecuencia, y en virtud del principio de competencia, se procede a trasladar el presente asunto a la citada dependencia, para lo de su competencia y fines pertinentes; en los siguientes términos:

Denuncia presentada por Colectivo de Víctimas por la Transparencia – Boyacá, solicitan que la respuesta y avance de la investigación sea notificada al correo palacioshilde4@gmail.com

Ilustración 10

DENUNCIA PÚBLICA POR PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL, FRAUDE A SUBVENCIONES Y MALVERSACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE VÍCTIMAS

DIRIGIDO A:

- Contraloría General de la República / Gerencia Departamental Boyacá
- Procuraduría Regional de Boyacá
- Fiscalía General de la Nación (Unidad de Delitos contra la Administración Pública)
- Defensoría del Pueblo (Delegada para la Orientación y Asistencia a las Víctimas)
- Gobernación de Boyacá

REFERENCIA: Irregularidades sistemáticas en el cobro de incentivos de participación y falta de gestión efectiva (Resolución 01668 de 2020) durante las vigencias 2024, 2025 y 2026.

I. OBJETO DE LA DENUNCIA: Ciudadanos y representantes de la comunidad de víctimas del departamento de Boyacá ponemos en conocimiento de las autoridades competentes una serie de irregularidades sistemáticas ocurridas durante los últimos tres (3) años en la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Departamento de Boyacá. Se denuncia el presunto cobro irregular de viáticos y transportes mediante el suministro de información falsa, sumado a una evidente inoperancia y falta de gestión de la mayoría de sus integrantes, lo que constituye un detrimento patrimonial frente a un presupuesto anual.

II. HECHOS SUSTENTADOS

1. Simulación de Participación y Falta de Gestión Real: Se solicita a los entes de control revisar exhaustivamente las actas de incidencia, gestión y trabajo de la Mesa. De los 24 integrantes que cobran incentivos, se puede verificar que:

- Únicamente un promedio de 10 integrantes participa de manera activa, presenta propuestas y realiza gestión real.
- Los integrantes restantes asisten exclusivamente con el fin de registrar su firma para asegurar el cobro del incentivo económico, sin expresar sugerencias, aportes o trabajo en favor de la población víctima.
- El derecho a la participación no debe ser utilizado como un mecanismo de enriquecimiento personal sin contraprestación de servicio a la comunidad, especialmente cuando en el departamento existen cerca de 50.000 víctimas con necesidades urgentes.

2. Falsedad en lugar de residencia y cobros improcedentes:

- Representante de Cubará: La integrante cobra gastos de desplazamiento y días adicionales como si viajara desde Cubará, cuando es de conocimiento público que por temas del salud del padre, reside en Duitama, eliminando la necesidad de dichos pagos extras.
- Representante de San Luis de Gaceno: Cobra pernotada adicional completa argumentando residencia en dicho municipio, a pesar de que reside y labora en la ciudad de Bogotá. Además, el trayecto no supera las 5 horas requeridas para el beneficio adicional según la autonomía de la Mesa.
- Representante de Socotá: su tiempo de desplazamiento a Tunja es inferior al rango establecido para beneficios extra. Cobra ruta de vereda y adicionales de alimentación residiendo en el casco urbano, y su tiempo de desplazamiento a Tunja es inferior al rango establecido para beneficios extra.
- Representante de Chiscas: el integrante cobra gastos de desplazamiento como si viajara desde Chiscas, cuando es de conocimiento que por temas de relación sentimental se desplaza desde Paipa.
- Representante de Moniquirá: Cobra incentivos de zona rural viviendo actualmente en el casco urbano.
- Representante de Sutatenza (Enfoque Discapacidad): Reside en el centro urbano y cobra como residente de vereda. Adicionalmente, se han aprobado 12 comités presenciales con el único fin de generar cobro de viáticos, cuando la necesidad técnica es mayoritariamente virtual.

3. Incumplimiento de Reglamentos y Beneficios de Acompañante:

- Representante de Caldas: Siendo Concejal activa y coordinadora de la Mesa Departamental, delega las sesiones de la Mesa para cumplir sus otras funciones, pero cobra el incentivo de la Mesa por día completo, adicional a ello en la vigencia 2025 le estaban garantizando la participación al CJT, cuando a este espacio según la resolución 01668 de 2020 dice que solo se le garantiza a seis, se puede comprobar con la resolución de pagos de los CJT de la vigencia 2025.
- Representante de Chiquinquirá: Cobra apoyos de acompañante sin llevarlo a las sesiones, y reside habitualmente en Sogamoso con su pareja, falseando la información de transporte.

4. Omisión de Vigilancia y Control por la Entidad Nominadora:

La Gobernación de Boyacá, a través de la dependencia encargada de la revisión y trámite de las cuentas de cobro, ha fallado sistemáticamente en su deber de control. Durante las vigencias 2024, 2025 y lo corrido de 2026, la entidad ha autorizado pagos de "adicionales" y viáticos sin verificar que los beneficiarios cumplan con el requisito reglamentario de un tiempo de desplazamiento superior a las cinco (5) horas. Resulta inexcusable que, existiendo pruebas de que ciertos integrantes residen en municipios cercanos o incluso en la capital, se les sigan garantizando estos recursos adicionales, permitiendo así una administración ineficiente y presuntamente irregular del erario.

5. Votación Irregular sobre Requisitos Legales: Se denuncia que la Coordinadora de la Mesa puso a consideración una encuesta en un grupo de WhatsApp, interna para validar pagos adicionales a los representantes de Socotá y San Luis de Gaceno. Es imperativo aclarar que la Mesa no tiene facultades legislativas ni presupuestales para decidir quién cumple o no los requisitos de lo estipulado en acta de sesión y resolución de la gobernación, para recibir dineros públicos. Someter a votación el cumplimiento de lo



establecido y más en austeridad es un acto que vicia de nulidad cualquier pago derivado de dicha encuesta y compromete la responsabilidad disciplinaria de quien promueve tal consulta.

6. Creación de Espacios no Contemplados para Generar Cobros: Se evidencia que, bajo la excusa del Plan de Trabajo, la Mesa está creando y aprobando espacios que no están contemplados en la Resolución 011668 de 20020 ni en la Ley 1448. Esta práctica tiene como único fin justificar el cobro de apoyos de participación, convirtiendo el Plan de Trabajo en una herramienta para el beneficio personal y no en una hoja de ruta para la reparación de las 50.000 víctimas del departamento.

III. GRAVEDAD DE LA CONDUCTA. Estas prácticas se han vuelto una costumbre administrativa durante las vigencias 2024, 2025 y 2026. Es inaceptable que el recurso público destinado a la reparación y participación de las víctimas se convierta en una nómina paralela, para personas que no cumplen con su deber legal y ético de representación.

IV. PETICIONES

1. Investigación Contable: Realizar auditoría a los pagos de viáticos y transportes de las vigencias 2024 a 2026.
2. Auditoría de Actas: Cotejar las actas de sesión con los pagos realizados para verificar quiénes realmente trabajan y quiénes solo asisten a cobrar.
3. Cruce de Datos de Residencia: Solicitar pruebas de residencia real (certificados de vecindad verificados, contratos laborales o de arrendamiento) NO familiares, de los implicados. Vigencias 2024 a 2026.
4. Recuperación de Recursos: Iniciar los procesos de responsabilidad fiscal para que se devuelvan los dineros obtenidos mediante engaño al erario.
5. Extralimitación de funciones y violación al principio de legalidad: Se denuncia que la Mesa de Participación, bajo un concepto erróneo de "autonomía", pretendió legislar sobre el manejo de recursos públicos mediante votaciones internas en las vigencias 2024 y 2025, estableciendo un criterio de "cinco horas" para acceder a pagos adicionales. Es imperativo aclarar que la autonomía de la Mesa no le confiere facultades para modificar los requisitos de ley ni para flexibilizar los criterios de permanencia establecidos en la normativa superior. Permitir que los propios beneficiarios voten las reglas de su remuneración constituye un claro conflicto de intereses y una burla a los principios de austeridad y transparencia del gasto público.

V. DEBER DE RESPUESTA Y TRÁMITE:

Aunque la presente denuncia se realiza bajo reserva de identidad (Denuncia Anónima), los hechos aquí narrados configuran presuntos delitos contra la administración pública y detrimento patrimonial. Por tanto, según lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y la Circular 002 de 2017 de la Procuraduría, la entidad tiene la obligación de iniciar la indagación preliminar de oficio. El incumplimiento en los términos de respuesta o la omisión en el trámite de esta denuncia darán lugar a quejas disciplinarias contra el funcionario encargado del área de correspondencia o control interno.

Se solicita a las autoridades destinatarias que, en cumplimiento del Principio de Eficacia y el Deber de Denunciar, se informe sobre el estado de la indagación preliminar en los términos de ley. La gravedad de los hechos aquí expuestos, que afectan el presupuesto de la población más vulnerable del departamento, exige una actuación de oficio inmediata para evitar que el presunto detrimento patrimonial siga creciendo durante la vigencia actual.

ACTUAMOS BAJO RESERVA DE IDENTIDAD POR SEGURIDAD, PERO SOLICITO QUE TODA RESPUESTA Y AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN SEA NOTIFICADA AL CORREO: galaciosbilde46@gmail.com

Atentamente,

COLECTIVO DE VÍCTIMAS POR LA TRANSPARENCIA - BOYACÁ

Denunciantes bajo reserva legal de identidad

Resultados del proceso de auditoría

Analizada la información allegada por la Gobernación de Boyacá, se pudo establecer respeto a las Actas y Resoluciones, cumplieron con los parámetros establecidos para tal fin.

- Acta de elección e instalación de la mesa de participación efectiva de víctimas del Departamento de Boyacá, con fecha 9 de octubre de 2023, la cual en su lectura y aprobación fue aprobada por unanimidad.

- **Resolución No. 001 con fecha 6 de febrero de 2024**, por la cual se conceden garantías de participación a los delegados e integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas – Boyacá para la vigencia 2024, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y el decreto de participación N. 1668 de 2020.

  En el artículo primero – CONCEDER GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN, parágrafo único establece: "Para hacer efectivo el pago por concepto de apoyos

compensatorio, estadía “alojamiento y alimentación” y transporte, los delegados de la Mesa Departamental de participación de Víctimas – Boyacá deberán presentar previamente a la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal: 1) Cédula de ciudadanía y fotocopia de la misma. 2) Constancia de asistencia. 3) Certificación y/o número de cuenta bancaria y demás a lugar. 4) Cuenta de Cobro.

- **Resolución No. 001 con fecha 29 de enero de 2025**, por la cual se conceden garantías de participación a los delegados e integrantes de la mesa Departamental de Victimas, firmada por la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá.

  En el artículo primero – CONCEDER GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN, parágrafo único establece: “Para hacer efectivo el pago por concepto de apoyos compensatorio, estadía “alojamiento y alimentación” y transporte, los delegados de la Mesa Departamental de participación de Victimas – Boyacá deberán presentar previamente a la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal: 1) Cédula de ciudadanía y fotocopia de la misma. 2) Constancia de asistencia. 3) Certificación y/o número de cuenta bancaria y demás a lugar. 4) Cuenta de Cobro.

- Resolución No. 001 con fecha 12 de febrero de 2026, por la cual se conceden garantías de participación a los delegados e integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas – Boyacá.

  En el artículo primero – CONCEDER GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN, parágrafo único en el cual establece: Para hacer efectivo el pago por concepto de apoyos compensatorios, estadía “alojamiento y alimentación” y transporte, los delegados de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas – Boyacá deberán presentar previamente a la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal: 1) Cédula de ciudadanía y fotocopia de la misma. 2) Constancia de asistencia. 3) Certificación y/o número de cuenta bancaria y demás a lugar. 4) Cuenta de Cobro.

PAGO MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS DE BOYACA POR GARANTIAS DE PARTICIPACION AÑOS 2024 - 2025 – 2026

En los años 2024 a lo corrido del año 2026, los pagos realizados por la Mesa Departamental de Víctimas de Boyacá por garantías de participación, asciende a la suma de $1.457.871.600, en cuanto a presupuesto aprobado de los cuales ejecutaron un valor de $946.732.633, quedando por ejecutar la suma de

$511.048.967 que corresponde a un 35.06% del total del valor aprobado, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 13 PAGO MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS DE BOYACÁ POR GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN AÑOS 2024 - 2025 - 2026

Año	2024	2025	2026
Presupuesto aprobado	$ 400,000,000.00	$507,781,600	$ 550,000,000.00
Presupuesto ejecutado	$ 399,305,962.00	$507,737,079	$ 39,689,592.00
Saldo por Ejecutar	**$ 694,038.00**	**$44,521**	**$ 510,310,408.00**

Fuente: Dirección de Diálogo Social y Convivencia- Secretarias de: Gobierno y Acción Comunal y Hacienda del Departamento de Boyacá.

Durante el año 2024 los pagos de la Mesa Departamental de Víctimas de Boyacá por garantías de participación, ascienden a la suma de $399.305.962, los cuales están discriminados a continuación, se encuentran soportados con los requisitos establecidos en la Resolución No. 001 de 2024, así:

Tabla 14 PAGO MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS POR GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN AÑO 2024

No. Resolución	Fecha Res.	Concepto	Fecha Sesión	Valor
Res. 002	02/09/2024	Res 002_1er Ejecutivo	01/12/2024	$ 4,187,400
Res. 003	02/09/2024	Res 003_Plan de Desarrollo	1/25/2024	$ 13,673,100
Res. 004	02/09/2024	Res 004_1er Plenario (Tunja)	29, 30 y 31/01/24	$ 24,599,640
Res. 005	02/09/2024	Res 005_2do Ejecutivo	02/05/2024	$ 4,166,140
Res. 006	2/15/2024	Res 006_3er Ejecutivo	2/13/2024	$ 4,166,140
Res. 007	2/23/2024	Res 007_2do Plenario (Tunja-Extraordinario)	19 y 20/02/24	$ 19,485,140
Res. 008	03/04/2024	Res 008_3er Plenario (Pto. Boyacá-Descentralizado)	26, 27, 28 y 29 /02/24	$ 35,798,960
Res. 009	03/05/2024	Res 009_4to Ejecutivo	03/04/2024	$ 4,166,140
Res. 011	3/14/2024	Res 011_1er Enfoque Desplazamiento	03/08/2024	$ 4,257,400
Res. 012	3/22/2024	Res 012_4to Plenario (Santa María - Descentralizado)	18, 19, 20 y 21 /03/2024	$ 33,348,450
Res. 014	04/02/2024	Res 014_5to Ejecutivo	3/26/2024	$ 4,167,900
Res.015	04/08/2024	CONSEJO DE PLANEACION, SUBCOMITÉS DE REPARACIÓN INTEGRAL, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, Y ASISTENCIA Y ATENCIÓN, SUBCOMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL	20,21 y 22/03/2024 02/04/2024 05/04/2024	$ 6,427,600
Res.016	4/19/2024	5to Plenario (Sesión Descentralizada) Mesa Departamental De Victimas	15/16/17 Y 18/04/2024	$ 33,768,300
Res.017	4/25/2024	Primer Comité De Justicia Transicional Departamental	4/25/2024	$ 14,201,784
Res.018	4/30/2024	6to Comité Ejecutivo	4/29/2024	$ 4,174,284

Res.019	05/07/2024	2do Eje Temático De Desplazamiento Forzado	05/03/2024	$	4,261,400
Res.020	5/20/2024	1er Eje Temático De Desaparición Forzada	05/06/2024	$	1,011,600
Res.021	5/24/2024	6to Plenario (Sesión Descentralizada) Mesa Departamental De Victimas	20,21,22 Y 23/05/2024	$	34,212,280
Res.022	5/28/2024	Subcomités De Discapacidad	03/06 Y 10/05/2024	$	1,703,400
Res.023	5/29/2024	Comité De Ética	07/03/2024 Y 02/04/2024	$	4,094,800
Res.024	6/18/2024	1er Eje Temático Minas Antipersonas e Integridad Física	6/17/2024	$	2,652,000
Res.025	6/25/2024	Comité Ejecutivo	6/21/2024	$	4,346,778
Res.026	6/26/2024	Subcomité De Sistemas De Información Y El Subcomité Técnico De Asistencia Y Atención	6/21/2024	$	2,226,200
Res.027	07/02/2024	Subcomité De Reparación Integral Y Subcomité De Prevención, Protección y Garantías De No Repetición	6/26/2024	$	2,740,000
Res.028	07/04/2024	Tercer Eje temático De Desplazamiento Forzado	6/28/2024	$	4,457,400
Res.029	07/08/2024	Sesión Comité De Ética Y Comité De Paz	19/06 Y 28/06/2024	$	2,799,378
Res.030	23/07/2024	Séptimo Plenario (Sesión Descentralizada) Mesa Departamental De Victimas Nobsa	15,16,17 y 18/07/2024	$	29,239,012
Res.031	31/07/2024	1era y 2da Sesión Del Consejo De Paz Virtual	29/05 y 19/06/2024	$	569,600
Res.032	01/08/2024	2do Eje temático Minas Antipersonas E Integridad Física	31/07/2024	$	2,654,000
Res.033	08/08/2024	1er COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD y SUBCOMITÉS DE DISCAPACIDAD	30/07,04/06 y 20/06/2024	$	981,400
Res.034	20/08/2024	2do Consejo De Política Social	05/08/2024	$	589,800
Res.035	02/09/2024	2do Eje temático de Desaparición Forzada	15/08/2024	$	1,011,600
Res.036	10/09/2024	2do Comité de Justicia transicional	10/09/2024	$	997,600
Res.037	11/09/2024	8 o Comité Ejecutivo	11/09/2024	$	4,348,104
Res.038	16/09/2024	3er Eje temático Minas e Integridad Física	16/09/2024	$	2,654,000
Res.039	19/09/2024	4to Eje temático de Desplazamiento Forzado	19/09/2024	$	4,285,400
Res.040	19/09/2024	3er Eje temático de Desaparición Forzada	19/09/2024	$	1,011,600
Res.041	23/09/2024	Pago Transporte Señora Flor Natalia Guzman	12/01/2024 al 10/07/2024	$	1,276,000
Res.042	30/09/2024	3er Consejo de Paz	27/09/2024	$	753,304

Res.043	07/10/2024	3er Consejo Departamental de Política Social	27/09/2024	$	577,800
Res.044	11/10/2024	8o Plenario (Sesión descentralizada) Tunja	7,8 y 9/10/2024	$	24,519,220
Res.045	11/10/2024	2do Comité de Discapacidad	27/09/2024	$	567,800
Res.048	05/11/2024	5to Eje temático de Desplazamiento Forzado	22,23 y24/10/2024	$	8,124,800
Res.049	06/11/2024	4to Eje temático de Desaparición Forzada	30/10/2024	$	1,011,600
Res.050	07/11/2024	Subcomité de Asistencia y Atención	06/11/2024	$	1,001,600
Res.051	07/11/2024	Subcomité de Reparación Integral	07/11/2024	$	804,600
Res.052	07/11/2024	Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición	07/11/2024	$	1,648,400
Res.053	13/11/2024	Subcomités de Discapacidad	30/10 y 05/11/2024	$	1,135,600
Res.054	13/11/2024	4to Eje temático Minas e Integridad Física	12/11/2024	$	2,654,000
Res.055	19/11/2024	4to y 5to Comité de Ética	28/10/2024 y 05/11/2024	$	4,094,800
Res.057	21/10/2024	Subcomités de Sistemas de Información	14/11/2024	$	485,800
Res.058	27/11/2024	Plan de Desarrollo	20,21 y 22/11/2024	$	905,600
Res.059	03/12/2024	Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición	03/12/2024	$	1,648,400
Res.060	03/12/2024	Subcomité de Reparación Integral	03/12/2024	$	804,600
Res.061	03/12/2024	Subcomité Técnico de Asistencia y Atención	03/12/2024	$	1,001,600
Res.062	04/12/2024	Subcomité de Sistemas de Información	04/12/2024	$	1,224,600
Res.063	06/12/2024	3er CJT	06/12/2024	$	997,600
Res.064	11/12/2024	Subcomités de Discapacidad	12/25 y 26/11/2024 y 02/03/06 y 09/12/2024	$	3,974,600
Res.066	16/12/2024	3er Comité de Discapacidad	13/12/2024	$	567,800
Res.067	16/12/2024	4to Eje temático de Desaparición Forzada	16/12/2024	$	1,011,600
Res.068	18/12/2024	9o Plenario Tunja	18/12/2024	$	12,977,308
Res.069	18/12/2024	4to Consejo de Política Social	12/12/2024	$	567,800
Res.070	23/12/2024	4to CJT	23/12/2024	$	1,533,400
TOTAL				**$**	**399,305,962**

Fuente: Dirección de Diálogo Social y Convivencia- Secretarias de: Gobierno y Acción Comunal y Hacienda del Departamento de Boyacá.

Durante el año 2025 los pagos de la Mesa Departamental de Víctimas de Boyacá por garantías de participación, ascienden a la suma de $507.737.079, los cuales están discriminados a continuación, se encuentran soportados con los requisitos establecidos en la Resolución No. 001 de 2025, así:

Tabla 15 PAGO MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS POR GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN AÑO 2025

No. Resolución	Fecha Resolución	Concepto	Fecha Sesión	Valor
Res_002	30/01/2025	1er PLENARIO MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS -TUNJA	27,28 y 29/01/2025	$25.494.268
Res_003	30/01/2025	1er COMITÉ EJECUTIVO	23/01/2025	$4.601.163
Res_004	04/02/2025	2do COMITÉ EJECUTIVO,	04/02/2025	$4.601.163
Res_005	05/02/2025	1er EJE TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	01/02/2025	$4.706.740
Res_006	07/02/2025	SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN	06/02/2025	$1.828.490
Res_007	07/02/2025	SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN INTEGRAL	06/02/2025	$1.185.210
Res_008	10/02/2025	2do EJE TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	07/02/2025	$4.706.740
Res_009	12/02/2025	1er SUBCOMITE DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN	11/02/2025	$1.096.210
Res_010	11/02/2025	1er SUBCOMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11/02/2025	$1.330.310
Res_011	17/02/2025	1er COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL	14/02/2025	$4.536.500
Res_012	19/02/2025	1er EJE TEMÁTICO MINAS ANTIPERSONAS E INTEGRIDAD	14/02/2025	$2.930.700
Res_014	24/02/2025	1er COMITÉ DE ÉTICA,	17/02/2025	$2.234.015
Res_015	03/03/2025	PRIMER PLENARIO DESCENTRALIZADO MUZO MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS	25,26 Y 27/02/2025	$29.953.227
Res_016	04/03/2025	3er COMITE EJECUTIVO	04/03/2025	$4.601.527
Res_017	04/03/2025	1er EJE TEMATICO VIDA Y LIBERTAD	20/02/2025	$1.177.210
RES_018	07/03/2025	1er EJE TEMATICO VIOLENCIA SEXUAL	21/02/2025	$1.117.031
RES_019	25/03/2025	3er EJE TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	19/03/2025	$4.710.740
RES_020	26/03/2025	1er EJE TEMATICO DE DESAPARICION FORZADA	19/03/2025	$1.107.210
RES_021	26/04/2025	2do EJE TEMÁTICO MINAS ANTIPERSONAS E INTEGRIDAD	21/03/2025	$2.930.700
RES_022	28/03/2025	SEGUNDO PLENARIO (SESIÓN DESCENTRALIZADA) DE MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS-PAJARITO	25,26 Y 27/03/2025	$30.608.066
RES_023	31/032025	4to COMITÉ EJECUTIVO,	31/01/2025	$4.601.527
RES_024	03/04/2025	2do EJE TEMÁTICO VIOLENCIA SEXUAL,	21/03/2025	$1.117.250
RES_025	04/04/2025	1er COMITÉ DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	04/04/2025	$2.143.363
RES_026	10/04/2025	3er EJE TEMÁTICO VIOLENCIA SEXUAL	07/04/2025	$1.337.658
RES_028	10/04/2025	2do COMITÉ DE ÉTICA,	07/04/2025	$2.234.015
RES_029	11/04/2025	2do SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN INTEGRAL	11/04/2025	$1.185.210
RES_030	11/04/2025	2do SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN	11/04/2025	$1.828.490
RES 031	21/04/2025	SUBCOMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10/04/2025	$1.330.310
RES 032	23/04/2025	2do CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL CODPOSDEBOY	09/04/2025	$632.605
RES_033	28/04/2025	1er COMITÉ DE DISCAPACIDAD, COMITÉ DE DISCAPACIDAD, SUBCOMITÉ DE DISCAPACIDAD SUBCOMITÉ DE DISCAPACIDAD, COMITÉ DE DISCAPACIDAD y 2do COMITÉ DE DISCAPACIDAD	27/01/2025-31/01/2025-28/03/2025-31/03/2025-04/04/2025-09/04/2025	$3.723.630

RES_034	29/04/2025	TERCER PLENARIO (SESIÓN DESCENTRALIZADA) DE MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS-UMBITA	22/23 y 24/04/2025	$28.565.930
RES_035	29/04/2025	5to COMITE EJECUTIVO	29/04/2025	$4.601.839
RES_036	29/04/2025	2do SUBCOMITE DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN	28/04/2025	$1.096.210
RES_037	05/05/2029	1er CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ	14/04/2025	$227.480
RES_038	13/05/2025	4to EJE TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	08/05/2025	$4.334.135
RES_039	13/05/2025	2do EJE TEMÁTICO DE DESAPARICIÓN FORZADA	12/05/2025	$1.107.210
RES_040	14/05/2025	4to EJE TEMÁTICO VIOLENCIA SEXUAL	14/05/2025	$1.337.918
RES_041	22/05/2025	3er EJE TEMÁTICO MINAS ANTIPERSONAS E INTEGRIDAD E INTEGRIDAD FISICA	22/05/2025	$2.410.520
RES_042	22/05/2025	2do EJE TEMÁTICO VIDA Y LIBERTAD,	22/05/2025	$1.177.210
RES_044	04/06/2025	2do COMITÉ DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	04/04/2025	$2.143.467
RES_045	05/06/2025	2do PLENARIO DE MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS-TUNJA	27,28 Y 29/05/2025	$26.040.250
RES_047	09/06/2025	REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE DISCAPACIDAD	15/05/2025	$620.605
RES_048	09/06/2025	3er COMITÉ DE ÉTICA	09/06/2025	$2.234.015
RES_049	01/07/2025	6to COMITÉ EJECUTIVO,	25/06/2025	$4.601.839
RES_050	09/07/2025	1er ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL ENFOQUE DIFERENCIAL LGTBIQ + 2025	19/06/2025	$2.137.395
RES_051	11/07/2025	2da SESIÓN COMITÉ LGTBI-OSIGD,	24/06/2025	$805.705
RES_052	15/07/2025	7to COMITÉ EJECUTIVO,	15/07/2025	$4.601.839
RES_054	22/07/2025	1er PLENARIO EXTRAORDINARIO SABOYA	18/07/2025	$13.390.555
RES_055	24/07/2025	REPRESENTACION DEL COMITE LGTBI-OSIGD	03/07/2025	$805.705
RES_056	31/07/2025	*1era SESIÓN MESA DEPARTAMENTAL DE COMPRAS PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS*	25/04 Y 03/07/2025	$1.165.210
RES_057	05/08/2025	1er CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL	08/05/2025	$642.605
RES_058	06/08/2025	CUARTO PLENARIO (SESIÓN DESCENTRALIZADA) BELÉN	29,30 y 31/07/2025	$25.371.598
RES_059	08/08/2025	8o COMITE EJECUTIVO	08/08/2025	$4.601.839
RES_060	11/08/2025	1er ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE JOVENES - 2025,	19/06/2025	$6.335.755
RES_061	11/08/2025	5to EJE TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	04/08/2025	$4.734.740
RES_062	12/08/2025	*MESA DE TRABAJO CONSEJO DE PAZ*	12/08/2025	$227.480
RES_064	20/08/2025	3er COMITÉ DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	14/08/2025	$2.143.467
RES_065	20/08/2025	6to EJE TEMATICO DESPLAZAMIENTO FORZADO	11/08/2025	$4.685.740
RES_066	28/08/2025	3er SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN INTEGRAL,	13/08/2025	$1.185.210
RES_067	29/08/2025	4to COMITÉ DE ÉTICA,	04/08/2025	$2.234.015
RES_069	04/09/2025	9o COMITÉ EJECUTIVO,	03/09/2025	$4.601.839
RES_070	04/09/2025	QUINTO PLENARIO (SESIÓN DESCENTRALIZADA) COMBITA,	26,27 Y 28/08/2025	$26.173.318
RES_071	11/09/2025	7to EJE TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO,	11/09/2025	$4.710.740
RES_072	11/09/2025	4to EJE TEMÁTICO MINAS ANTIPERSONAS E INTEGRIDAD FISICA	11/09/2025	$2.410.520
RES_073	11/09/2025	3er EJE TEMÁTICO DESAPARICIÓN FORZADA,	11/09/2025	$1.107.210

RES_074	18/09/2025	3er CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL y el 2do COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL	16/09/2025	$4.750.025
RES_075	18/09/2025	3er EJE TEMÁTICO VIDA Y LIBERTAD	08/09/2025	$1.177.210
RES_076	18/09/2025	3er SUBCOMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10/09/2025	$1.330.310
RES_078	03/10/2025	SEXTO PLENARIO (SESIÓN DESCENTRALIZADA) SOCHA	22,23,24 Y 25/09/2025	$33.405.997
RES_079	03/10/2025	10 o COMITE EJECUTIVO	03/10/2025	$4.602.307
RES_081	03/10/2025	COMITE Y SUBCOMITES DE DISCAPACIDAD	19/06,08/09,12/09,15/09 Y 17/09/2025	$3.103.025
RES_082	06/10/2025	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION (seguimiento)	22,23 Y 24/09/2025	$957.335
RES_083	14/10/2025	3er SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN	14/10/2025	$552.605
RES_084	15/10/2025	4to SUBCOMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	07/10/2025	$1.330.310
RES_085	15/10/2025	1er ENCUENTRO DEPARTAMENTAL HECHO VICTIMIZANTE DE INTEGRIDAD FISICA - 2025	30/09/2025	$7.355.640
RES_088	21/10/2025	1er ENCUENTRO DEPARTAMENTAL HECHO VICTIMIZANTE DE VIDA Y LIBERTAD - 2025	30/09/2025	$16.648.725
RES_089	21/10/2025	3er SUBCOMITÉ DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN	20/10/2025	$1.096.210
RES_090	22/10/2025	2do CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ	17/09/2025	$534.605
RES_092	04/11/2025	5to EJE TEMATICO MINAS ANTIPERSONAS E INTEGRIDAD FISICA	04/11/2025	$2.410.520
RES_093	04/11/2025	1er y 2do CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA	11/04/2025 Y 26/06/2025	$1.099.810
RES_094	04/11/2025	2da SESION MESA DEPARTAMENTAL DE COMPRAS PUBLICAS	09/10/2025	$582.605
RES_097	05/11/2025	REPRESENTACION DEL COMITE LGTBI-OSIGD	09/10/2025	$805.705
RES_098	05/11/2025	3er PLENARIO TUNJA	27,28,29 Y 30/10/2025	$31.718.372
RES_099	10/11/2025	8o EJE TEMATICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	05/11/2025	$4.710.740
RES_0100	12/11/2025	5to COMITE DE ETICA	03/11/2025	$2.234.015
RES_0101	12/11/2025	4to COMITE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	20/11/2025	$2.143.467
RES_0102	12/11/2025	REPRESENTACION DEL COMITE LGTBI-OSIGD VIRTUAL	20/10/2025	$227.480
RES_0103	12/11/2025	3era SESIÓN COMITÉ LGTBI-OSIGD,	28/10/2025	$805.705
RES_0104	24/11/2025	Subcomité de Discapacidad realizado el día 11/11/2025, en el Subcomité de Discapacidad realizado el día 14/11/2025, y al Subcomité de Discapacidad realizado el día 19/11/2025	11/11/2025,14/11/2025 Y 19/11/2025	$1.861.815
RES_0105	24/11/2025	4to EJE TEMATICO DE DESAPARICION FORZADA	12/11/2025	$1.107.210
RES_0106	01/12/2025	4to EJE TEMATICO VIDA Y LIBERTAD	28/11/2025	$1.177.210
RES_0108	02/12/2025	4to SUBCOMITE DE ASISTENCIA Y ATENCION	01/12/2025	$1.096.210
RES_0109	02/12/2025	5to SUBCOMITE SISTEMAS DE INFORMACION	01/12/2025	$1.330.310
RES_0110	02/12/2025	2do CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL	18/11/2025	$642.605
RES_0111	03/12/2025	4to CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL	01/12/2025	$632.605
RES_0112	03/12/2025	4to SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN	03/12/2025	$1.308.310
RES_0113	03/12/2025	4to SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN INTEGRAL,	03/12/2025	$1.185.210
RES_0114	04/12/2025	3er COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL	04/12/2025	$4.572.500
RES_0115	09/12/2025	3er CONSEJO DE PAZ	03/12/2025	$534.605

RES_0116	09/12/2025	5to EJE TEMATICO DE DESAPARICION FORZADA	26/11/2025	$1.107.210
RES_0117	09/12/2025	1er ENCUENTRO DEPARTAMENTAL HECHO VICTIMIZANTE DE VIDA Y LIBERTAD - 2025(ADICION)	30/09/2025	$672.605
RES_0118	11/12/2025	2do CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL	11/12/2025	$642.605
RES_0119	16/12/2025	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO DE JUVENTUD	19/11/2025,24/11/2025,02/12/2025 Y 10/12/2025	$3.182.820
RES_0120	16/12/2025	4ta SESIÓN COMITÉ LGTBI-OSIGD	15/12/2025	$805.705
RES_0122	17/12/2025	3er COMITE DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD Y REPRESENTACION DISCAPACIDAD	28/11/2025 Y 11/12/2025	$1.241.210
RES_0123	19/12/2025	REPRESENTACION DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE PLANEACION	11/12/2025	$516.605
RES_0124	19/12/2025	COMITE DEPARTAMENTAL DE PLANEACION (SEGUIMIENTO)	17,18 Y 19/12/2025	$994.135
RES_0125	23/12/2025	4to CONSEJO DE PAZ	23/12/2025	$227.480
RES_0126	29/12/2025	4to COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL	29/12/2025	$4.576.500
RES_0127	31/12/2025	MESA DE TRABAJO DIRECCION DE DIALOGO SOCIAL Y CONVIVENCIA	26/12/2025	$4.576.500
TOTAL				$507.737.079

Fuente: Dirección de Diálogo Social y Convivencia- Secretarias de: Gobierno y Acción Comunal y Hacienda del Departamento de Boyacá.

Durante el año 2026 los pagos de la Mesa Departamental de Víctimas de Boyacá por garantías de participación, ascienden a la suma de $39.689.592, los cuales están discriminados a continuación, se encuentran soportados con los requisitos establecidos en la Resolución No. 001 de 2026, así:

Tabla 16 PAGO MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS POR GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN AÑO 2026

No. Resolución	Fecha Resolución	Concepto	Fecha Sesión	Valor
Res_002	12/02/2026	*1er CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA*	06/01/2026	$603,338
Res_003	12/02/2026	*1er COMITÉ DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES*	16/01/2026	$2,388,607
Res_004	12/02/2026	*1er COMITÉ DE ÉTICA*	13/01/2026	$1,574,566
Res_005	12/02/2026	*1er COMITÉ EJECUTIVO*	19/01/2026	$3,445,393
Res_006	12/02/2026	*2do COMITÉ EJECUTIVO*	10/02/2026	$2,854,055
Res_007	12/02/2026	1er PLENARIO EXTRAORDINARIO TUNJA	04/02/2026	$15,332,390
Res_008	20/02/2026	*1er SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN INTEGRAL*	16/02/2026	$1,322,676
Res_009	20/02/2026	*1er SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN*	16/02/2026	$1,454,566
Res_010	20/02/2026	*1er COMITÉ TEMÁTICO DE VIDA Y LIBERTAD*	06/02/2026	$1,310,676
Res_011	20/02/2026	*1er COMITÉ TEMÁTICO DE VIOLENCIA SEXUAL*	16/02/2026	$1,537,379
Res_012	27/02/2026	1er SUBCOMITE DE ASISTENCIA Y ATENCION	19/02/2026	$1,232,676
Res_013	27/02/2026	1er COMITÉ DE DESAPARICIÓN FORZADA	23/02/2026	$1,246,676
Res_014	27/02/2026	1er SUBCOMITE DE SISTEMAS DE INFORMACION	19/02/2026	$1,500,566

Res_015	03/03/2026	1er COMITÉ TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	30/01/2026	$3,886,028
TOTAL				$39,689,592

Fuente: Dirección de Diálogo Social y Convivencia- Secretarias de: Gobierno y Acción Comunal y Hacienda del Departamento de Boyacá.

En cuanto a la ejecución de los recursos de atención humanitaria inmediata, se establece que en la vigencia 2024, se atendieron 8 familias que correspondió a 27 personas de los municipios de Boyacá, Duitama y Cubará con un valor ejecutado de $9.379.500.

En la vigencia 2025 el número de familias ascendió a 8 conforma en total por 22 personas y con una ejecución de recursos por valor de $7.647.546.50, de los municipios de: Pauna, Santana, Santa Sofía y Paipa, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 17 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2024 - 2025

ATENCION HUMANITARIA INMEDIATA					
Vigencia 2024					
VALOR APROPIACION			**$ 14,996,360.00**	**No. RESOLUCION**	**FECHA**
MUNICIPIO	**FAMILIAS**	**PERSONAS**	**EJECUCIÓN**		
BOYACA	1	4	$ 1,430,000	10	8 DE MARZO
DUITAMA	6	18	$ 7,137,000	13	22 DE MARZO
CUBARA	1	5	$ 812,500	65	12 DE DICIEMBRE
EJECUTADO	**8**	**27**	**$ 9,379,500.00**		
SALDO POR EJECUTAR			**$ 5,616,860.00**		
Vigencia 2025					
VALOR APROPIACIÓN			**$ 16,191,069.00**		
MUNICIPIO	**FAMILIAS**	**PERSONAS**	**EJECUCIÓN**	**No. RESOLUCION**	**FECHA**
PAUNA	1	3	1,174,387.00	13	21 DE FEBRERO
SACHICA	1	4	711,750.00	27	10 DE ABRIL
SANTANA	4	9	3,412,850.50	43	23 DE MAYO
SANTA SOFIA	1	3	1,174,171.50	53	18 DE JULIO
PAIPA	1	3	1,174,387.50	86	21 DE OCTUBRE
EJECUTADO	8	22	7,647,546.50		
SALDO POR EJECUTAR			$ 8,543,522.50		

Fuente: Dirección de Diálogo Social y Convivencia- Secretarias de: Gobierno y Acción Comunal y Hacienda del Departamento de Boyacá.

Conclusión del Equipo de Auditoría

Por lo anterior y teniendo en cuenta el actuar del grupo auditor de la CGB y de acuerdo al traslado de la denuncia por parte de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento y análisis a la información solicitada y allegada por parte de la Dirección de Diálogo Social y Convivencia y las Secretarias de Gobierno y Acción Comunal y Hacienda del departamento de Boyacá, se estableció plenamente que cumplen con la normatividad vigente y con los requisitos exigidos para hacer efectivo el pago por concepto de apoyo compensatorio, estadía "alojamiento y alimentación" y transporte de los delegados de la Mesa Departamental de participación de Víctimas, presentando previamente los requisitos exigidos para los mismos.

Por todo lo expuesto se llega a la decisión por parte del grupo auditor, que se da lugar al archivo, puesto que tienen derecho los representantes a recibir el pago correspondiente, por tanto, la Contraloría General decide archivar la denuncia anónima con referencia CGB No. 20261100774.

DENUNCIA No. 4
Antecedentes

Denuncia Fiscal D-25-19, anónima, denuncia por daño fiscal a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, en la cual establece las siguientes precisiones:

Ilustración 11

PRECISIONES

1. El ente territorial compro mediante contrato de venta de 3 de agosto de 2023 a LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO (HOY BANCOLOMBIA S.A) 8 inmuebles en **Green Hills** de Tunja por un valor de $6.585.855.000 por medio de la **Escritura Pública No. 2142 del 22 de septiembre de 2023**, en la notaría cuarta del circuito de Tunja

2. De los 8 inmuebles, no todos están en funcionamiento, porque no se hizo un adecuado estudio de títulos por parte del comité de compra, y se adquirieron inmuebles que 2 años después es imposible su uso.

3. El valor por inmueble esta relacionado en la tabla que sigue, donde se puede evidenciar, que el valor esta triplicado con el valor del mercado para esa zona de tunja, siendo el total $6.585.855.000,00)M/CTE

FOLIO	INMUEBLE	VALOR
070-213729	BLOQUE C 1° PISO LOCAL 2C	$ 801.111.645
070-213730	BLOQUE C 1 PISO LOCAL 3C	$ 995.675.223
070-213731	BLOQUE C 2 PISO LOCAL 4C	$ 2.016.643.396
070-213740	BLOQUE C 3 PISO LOCAL 12C	$ 974.604.960
070-213732	BLOQUE C 2 PISO LOCAL 13C	$ 19.381.076
070-199815	BLOQUE G LOCAL 3	$ 749.632.412
070-213741	BLOQUE 1 LOCAL 1I	$ 1.017.144.218
070-213680	BLOQUE A 1 PISO CAJERO 1A	$ 11.662.070
	TOTAL	$ 6.585.855.000,00

4. Como se puede observar en el registro BP y P No. **2023 00415 0144,** la modalidad de contratación fue **directa**, no se entiende porque no hubo licitación, como es la regla general para la compra.

5. La dependencia que adelantó el proceso de compra fue la Secretaría general de la Gobernación de Boyacá y no el departamento de contratación

6. Revisados los archivos del secop, se puede evidenciar que los estudios previos de agosto de 2023, señalaron que el objeto resolvia la necesidad de la *"adquisición de inmuebles para el correcto funcionamiento del **archivo** departamental y **demás oficinas** de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"*

Sin embargo al revisar folio por folio, y estudio por estudio, salta a la vista de cualquier funcionario, que hay inmuebles de muy poco metraje que cuesta igual o mas que un apartamento, y que lo único que pude caber ahí es un baño y que los estudios previos NO hicieron visita de campo, es decir, que además que son un Copy page, los unos de los otros, quien adelanto esta tarea, no evidencio la realidad de los inmuebles.

7. Dentro de los 8 locales adquiridos se encuentra el Local 3, Segundo Piso del Bloque G, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070 – 199815, y sin numero de registro catastral el cual es un predio enclavado según escritura pública 0850 del 10 de mayo de 2012, ya que no cuenta con zonas comunes de uso exclusivo ni un ingreso común.

8. Es interesante ver, como el archivo histórico del departamento estaría ubicado cerca de las cuerdas de alta tensión que atraviesan el centro empresarial, que al comparar con la página oficial del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado- Colombia, ninguna oficina que manipule archivo podrá estar cerca a factores de riesgo:

a. Estación de gasolina
b. Ventanas
c. Cables de alta tensión

d. Hurto

9. Se evidencia que dentro del centro empresarial, hay empresas que manipulan alimentos, hay uso de gas, altos voltajes, y se encuentra fuera del casco histórico de tunja, lo que permite ver que el riesgo es alto.

10. Desde 2023, se ha observado que por cada local hay por lo menos 2 guardas de seguridad al tiempo, cuando en todo el centro empresarial, responden por la seguridad máximo 2, es decir, que los locales VACIOS de la gobernación, tiene un fortin laboral que cumple con las cuotas que prometieron en campaña, y que serian un daño fiscal. Y mas si se ve que la copropiedad ya tiene su sistema de seguridad dentro del presupuesto anual.

11. Hay locales de la gobernación que sin licencia están generando cambios con obras civiles, y se detecta que trabajan en las noches como las "ratas" políticas que no quieren mostrar.

12. De las acciones y demanda que presenta el cuerpo de abogados de la gobernación, no han ganado una, porque están convencidos que el régimen aplicable a una propiedad horizontal se rige por el CPACA y no por las normas civiles, pretenden con amenazas modificar los estatutos y los órganos de gobierno interno, es decir, le están pagando a un grupo de abogados de perfil publico y administrativo meses de trabajo, cuando no tienen idea de que el fuero privado es diferente al derecho publico. Se solicita se verifique en la rama judicial, las acciones que ha presentado en contra del centro empresarial y las respuestas dada por los jueces frente a sus "falsas" denuncias.

13. El centro empresarial Green Hills se rige por las escrituras 850 del 10 de mayo de 2013 y 0850 del 10 de mayo de 2012, presenta un riesgo inminente para cualquier entidad, pretender dejar su archivo histórico ahí o las oficinas de la gobernación, donde reposara, no solo el archivo sino documentos públicos

14. Los estudios previos **NO ANALIZAN** la **norma técnica colombiana NTC 5921** que fue consagrada **desde el año 2018** y donde se indican cuales **PROHIBICIONES** o **REQUISITOS** se deben cumplir para el **ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DOCUMENTAL EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS,** ya que si realmente se analizan los 8 locales comprados en Green Hills **NINGUNO** cumple con la **NTC 5921.**

15. Lo otro que es un claro daño fiscal es que cuanto tiempo lleva realizada la compra, **2 AÑOS** y no se han utilizado varios de esos inmuebles, ni puestos en arriendo siquiera, para pagar la vigilancia (aparte de la que hay en green hills) y los costos por administración que si están pagando muy puntualmente, es mas irrisorio y denota el grado de corrupción, que compraron un local -boque A 1 piso local 1 A- donde solo cabe un cajero automático, por $11.662.000, que es mas pequeño que un parqueadero que cuesta en valor real y NO INFLADO un aproximado de $18.000.000.oo

16. Las oficinas de la gobernación al igual que el mismo archivo, conlleva a pensar que se van a almacenar documentos privilegiados, como expedientes, una amplia

variedad de materiales, como acetatos, películas, papel, vitelas, pergaminos, papiros, video, DVD´s, documentos fotográficos, documentos audiovisuales y formatos digitales, todos ellos en diversos tipos de soportes (mecánicos, fotográficos, magnéticos y ópticos), los cuales requieren de unas condiciones muy especiales por su alto grado inflamable, es por ahí que uno ve en la norma técnica colombiana NTC 5921, que esos lugares NO DEBEN tener ventanas, ni exposición, al sol, ni factores de riesgo cercanos *-estación de gasolina, equipos médicos porque hay varias IPS en Green Hills-*, ademas la cercania con la carrilera del tren y la doble calzada, genera el riesgo de ser una instalacion estratégica que serían objetivo en un conflicto armado, ataque terrorista o disturbios civiles, cerca al rio chulo, el cual esta plagado de rodedores, entre otros riesgos que no se vieron en los estudios previos que se encuentran en el SECOP

17. Del archivo de esta compra que se encuentra en el SECOP publicado, por demás, como una compra directa, se puede sorprender cualquier ingeniero, que faltaron los siguientes estudios, sobre que reformas requería la construcción para adecuarla para oficinas del orden institucional y el costo aproximado -principio de planeación-, estudio de seguridad, estudios técnicos, que analizaran el grado de protección, restricciones del uso y modificación, el estado de la estructura, su capacidad portante, la cimentación, las condiciones ambientales y sus variantes, el estado de las redes de servicios públicos domiciliarios.

18. No hay un estudio financiero, ni de la anterior administración ni de la actual, sobre que estos 8 locales están dentro de una Propiedad Horizontal, donde la gobernación entra a un régimen de propiedad horizontal, a generar unos gastos mensuales sobre la administración, no tiene prebendas por ser un ente territorial, dineros que son de orden publico.

19. No se ve dentro de los estudios previos el levantamiento topográfico de los 8 locales, estudio de condiciones climáticas para reducir los riesgos por los factores que la ubicación de green hills genera (transito, volumen, cercania doble calzada, seguridad, sol, lluvia, vientos) y así, disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía, agua, entre otros, y poder saber porque si la copropiedad tiene vigilancia privada y presupuestada en la cuota de administración que la gobernación paga mes a mes. **¿Porque la gobernación dispone de 2 puntos de seguridad por local?**


20. El contrato CD-3564-2023 firmado por el gobernador de Boyacá y el grupo empresarial Bancolombia S.A, padece nulidad por carecer de estudio de títulos claro, legal, pues la etapa precontractual, como se aprecia del SECOP fue en cada estudio un

Copy and Page, en lo que difieren fue en las matriculas y las ubicaciones por bloque, pero raya porque no hubo análisis del sector en el mercado, para tener esa cuantía el contrato se optó por contratación directa y no por contratos tipo y menos una subasta, o pliego de condiciones,

21. También salta a la vista si el objeto de contratación perseguido era la necesidad de garantizar que el archivo central de la entidad …." *el interior del Edificio Palacio De La Torre es insuficiente para garantizar el repose y la transferencia de los archivos documentales, por lo cual es necesario contar con que tenga la capacidad estructural para recibir las dependencias de la Gobernación de Boyacá y garantizar acceso a la información"* los inmuebles adquiridos en green hills, **ninguno tiene vocación para lograr satisfacer tal necesidad**, y asi se señala en un estudio que se registró en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental No 2023 00415 0144 y que fuera parte del **Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023**, el cual al final señala

7. PRUEBAS

1. Secop, contrato CD-3564-2023, en el cual versa: promesa de venta de 03 de agosto de 2023
2. Norma Técnica Colombiana NTC 5921 de 2018, el cual permite demostrar que las instalaciones adquiridas por la Entidad no cumplen con los lineamientos para su fin (12 folios)



RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORÍA

DENUNCIA FISCAL D25-019

Tabla 18

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-3564-2023
CONTRATO	COMPRAVENTA
COMPRADOR	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VENDEDOR	BANCOLOMBIA S.A. NIT 890.903.938-8
IDENTIFICACION	ESCRITURA PUBLICA # 2142 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	BANCOLOMBIA S. A
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL Y DEMÁS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VALOR	SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS $ **6.585.855.000**
ADICIONAL	N.A
VALOR TOTAL	$ **6.585.855.000**
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación Directa
ESCRITURA PÚBLICA No.	2142 NOTARIA CUARTA DEL CIRCULA DE TUNJA CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023
ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367926&isFromPublicArea=True&isModal=False	

HALLAZGO DE AUDITORIA No - 3 CONTRATO No. 3564 DE 2023.

CONDICIÓN: Una vez revisado el contenido de la Denuncia se procede a verificar y analizar la información a través de las plataformas autorizadas para tal fin.

Consultado la plataforma SECOP II; se advierte que con fecha la publicación del proceso CD-3564-2023; que corresponde a una contratación Directa por medio de Escritura Pública No. 3564 de 2023.

Esta compra se realiza dando alcance al proyecto denominado: "ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL Y DEMÁS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, formulado por un valor total de NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($9.117.209.942.00) M/CTE, con plazo de ejecución de CUATRO (4) meses" CERTIFICACIÓN No. 2023 00415 0144 Proyectos Generales con recursos del Departamento de Boyacá SUIFP – TERRITORIO.

Señala la plataforma SECOP II el siguiente cronograma de legalización y perfeccionamiento del mismo:

Ilustración 12

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Firma del Contrato	29/12/2023 5:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de inicio de ejecución del contrato	29/12/2023 5:45:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo de ejecución del contrato	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del proceso	29/12/2023 5:24:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Igualmente; en el contenido del SECOP II; se encuentran los documentos soporte de la Escritura Pública:

Ilustración 13

Nombre del documento
1. DOCS PROYECTO.pdf
2. ESTUDIO PREVIO.pdf
3. CERT PAA-rPREDIOS GREEN HILLS.pdf
4. C4423.pdf
6. OFERTA GREEN HILLS DEPARTAMENTO.pdf
7. ANEXO PROPUESTA BANCOLOMBIA.xlsx
8. CERTIFICADO RL SUPERFINANCIERA.pdf
9. ESCRITURAS - TRADICIÓN.pdf
10. CERTIF TRADICIÓN Y LIBERTAD.pdf
11. AVALUO GREEN HILLIS DEFINITIVOS (1).pdf
12. Cuadro Resumen Avalúo (1).pdf
13. ESCRITURAS PROPIEDAD HORIZONTAL.pdf
14. PLANOS.pdf
15. ESTUDIO TÍTULOS.zip
16. PROMESA DE VENTA FT GREEN HILL AGOSTO 2023.pdf
17. Escritura publica N° 2142 -GREEN HILLS.pdf
18. RESOLUCION 3366-2023 -PAGO.pdf
19. Certificado EXISTENCIA BANCOLOMBIA S.A..pdf
20. Certificado facultades Bancolombia.pdf
21. Procuraduria 890903938.pdf
22. Procuraduria 71788617.pdf
23. Policia 71788617.pdf
24. DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (002).pdf
25. SS BANCOLOMBIA.pdf
26. RUT 4 Octubre 2023 (3).pdf
27. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf

Este trámite se encuentra respaldado en el literal i, Numeral 4, Art. 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Art. 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de 2015.

Revisado SIA OBSERVA; se evidencia que el trámite no fue reportado. Verificada la rendición del Formato F13. Correspondiente al año 2023. No se reportó el pago realizado.

Analizado el contenido del trámite; se encuentra que cumple con los requisitos mínimos exigibles para una compra de predio a saber:

Avaluó Comercial de fecha marzo de 2023. Confirmado por Esp. **ALIRIO ALVARADO AVILA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.752.669 de Tunja, con registro mercantil No 038-006752669-01 y Registro Único de Proponente RUP, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Tunja, que acredita AVALÚOS A3, desde 1987, con RAA Registro Abierto de Avaluador AVAL- No. 6752669, Emitido por la Corporación Autorregulador de Avaluadores ANAV, y la Súper Intendencia de Industria y Comercio SIC, Matricula profesional de Avaluador No. RNA. / 01- 7034 por LONJANAP y CORPOLONJAS. Con la asesoría técnica de **NUBIA ALCIRA JIMENEZ NAUSSAN**, Identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.032.702 de Tunja con RAA Registro Abierto de Avaluador AVAL- No. 40032702, Emitido por la Corporación Autorregulador de Avaluadores ANAV, y la Súper Intendencia de Industria y Comercio SIC, Matricula profesional de Avaluador No. RNA. / 01- 7035 por LONJANAP y CORPOLONJAS y **ARQUITECTA: CLAUDIA PATRICIA ALVARADO CARVAJAL** identificada con cedula de ciudadanía No 40.046.476 de Tunja, de profesión Arquitecta con matrícula profesional No A15192006-40046475, AVALUADOR CON REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES, RAA certificado por ANAV; según la ley 1673 y decreto 556 en 8 Categorías, Avaluador profesional por CORPO LONJAS y LONJANAP.

Publicado soporte en 128 folios denominado “AVALUO GREEN HILLS”. Evidenciado que el *valor de la construcción LOCALES COMERCIALES, objeto del avalúo, se calculó aplicando el Método de Reposición, el cual consiste en determinar el valor actual a nuevo de la edificación y/o de cada unidad de acuerdo a las características estructurales, arquitectónicas y estado de conservación, al reglamento de propiedad horizontal, a su área, porcentaje de copropiedad, restándole la depreciación acumulada.*

Otro aspecto importante en la compra de predios es el **Análisis del mercado,** que corresponde a análisis de la oferta de inmuebles en la zona y justificar por qué el predio seleccionado es el que satisface la necesidad pública.

El mismo se desarrolla en el documento publicado “1. DOCS PROYECTO; ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO TITULOS”.

Documentos de legalidad. Se confirma que se encuentran los documentos legales inherentes a la propiedad y al vendedor que para el caso corresponde a BACOLOMBIA S.A.

Consideraciones Especiales. Respecto a este trámite y la promesa de Compraventa firmada el 3 de agosto de 2023. Se confirma que el pago se realizaba el día de protocolización de la Escritura Pública; tramite que se cumplió a satisfacción conforme reza en la Resolución No. 33676 del 10 de octubre de 2023. Suscrita por la Secretaria de Hacienda y La Secretaria General del Departamento.

Según el Cotejo de información el reconocimiento del pago de cada predio se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 19 LOCALES CENTRO COMERCIAL GREEN HILLS - TUNJA

Tipo de Activo	Placa o Matricula	DESCIPCION	AREA	Precio pactado en negociación
Local Comercial	070-213729	local 2C bloque C piso 1 - GREEN HILLS	326.9	$ 801,111,645.00
Local Comercial	070-213730	local 3C bloque C piso 1 - GREEN HILLS	434.42	$ 995,675,223.43
Local Comercial	070-213731	local 4C bloque C piso 1 - GREEN HILLS	1350.67	$ 2,016,643,395.63
Local Comercial	070-213740	local 12C bloque C piso 3 - GREEN HILLS	617.76	$ 974,604,960.12
Local Comercial	070-213732	local 13C bloque C piso 2 - GREEN HILLS	9.14	$ 19,381,075.75
Local Comercial	070-199815	local 3 bloque G piso 2 - GREEN HILLS	522.39	$ 749,632,412.01
Local Comercial	070-213741	edificio I pisos 1,2 y 3 - GREEN HILLS	766.22	$ 1,017,144,218.06
Local Comercial	070-213680	local 1A bloque A piso 1 - GREEN HILLS	5.5	$ 11,662,070.00
		TOTAL AREAS		$ 6,585,855,000.00

Este pago concuerda con la promesa de compraventa y los estudios de sector realizados. El seguimiento a este trámite concluye que falto publicación de documentos en la fase poscontractual entre ellos. Ingreso al Almacén y/o Inventarios de la Entidad. Órdenes de Pago y Egreso.

Se omitió el reporte en los formatos F13 SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA, de la Contraloría General de Boyacá.

Respecto a los avalúos realizados Esp. **ALIRIO ALVARADO AVILA**, en marzo de 2023, se pudo establecer que aparecen 8 bienes representados en locales adquiridos por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, con el BANCOLOMBIA S.A., situados en el Centro Comercial Green Hills y que corresponden a los siguientes bienes:

Tabla 20 RESUMEN DE VALORES - LOCALES CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS TUNJA SEGÚN AVALÚO REALIZADO POR ESP. ALIRIO ALVARADO AVILA (MARZO DE 2023)

No.	INMUEBLE	AREA M2	VALOR M2	VALOR TOTAL	DEPRECIACION
1	AV. UNIVERSITARIA No. 75A -00 LOCAL 4C BLOQUE C 2 TELEPERFORMACE	1357.67 M2 - 1374.42M2	$ 2,969,231	$ 3,489,092,574	13%
2	AV. UNIVERSITARIA No. 75A -00 PRIMER PISO TELEPERFORMACE ESQUINA	434.42 M2 - 583.58 M2	$ 2,969,231	$ 1,083,510,398	16%
3	GREEN HILLS - TUNJA P.H. BLOQUE C1 PISO 1 LOCAL 2C EFICIO C ESTETICA 1ER PISO	326.90 M2 - 355.30M2	$ 2,969,231	$ 902,696,700	7%
4	GREEN HILLS - TUNJA P.H. BLOQUE C3 PISO LOCAL 12C 3ER PISO ESQ. INTERNA FACHADA CURVA	617.76 M2 - 610.70M2	$ 2,969,231	$ 917,136,071	50%
5	AV. UNIVERSITARIA No. 75A -00 LOCAL 3 BLOQUE G 2DO PISO AMINTA	552.39 M2 - 755.91M2	$ 2,678,462	$ 887,733,374	40%
6	EFICIO 1 CC GREEN HILLS TUNJA P.H. EDIFICO OPTI SALUD TRES PISOS	766.22M2 FALTO	$ 2,119,769	$ 1,575,483,121	3%
7	GREEN HILLS - TUNJA P.H. BLOQUE B 2 PISO LOCAL 6B ZONA DE COMIDAS	39.68M2	$ 5,042,857	$ 200,100,565	0%
8	LOCAL CAJERO 1 CC GREEN HILLS TUNJA P.H. ESPACIO CAJERO EDIFICIO EL CORRAL	9.00M2	$ 6,828,571	$ 61,457,139	0%
	TOTAL	40.067.03 M2		$ 9,117,209,942	

FUENTE.DOCUMENTOS CARPETA BIENES -SECRETARIA GENERAL GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Al ser comparados con los valores y área que aparecen en el precio pactado en negociación, escritura de compraventa No. 2142 con fecha 03/08/2023 y avalúo de marzo de 2023, no coinciden en área y en descripción del bien, tampoco se anexa certificado de tradición y los que presentan están a nombre de CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS, tal como se establece en la siguiente tabla.

Tabla 21 COMPARATIVO DE PRECIOS PACTADOS EN NEGOCIACION- PRECIOS ESCRITURA Y PRECIO SEGÚN AVALÚO DE LOCALES DEL CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLIS

Tipo de Activo	Placa o Matricula	DESCIPCION	AREA	PRECIO PACTADO EN NEGOCIACIÓN	PRECIO SEGÚN ESCRITURA NO. 2142 CON FECHA 03/08/2023	PRECIO SEGÚN AVALÚO MARZO DE 2023- CARPETA	CERITIFCADO DE TRADICIÓN	ULTIMA ANOTACIÓN	DIFERENCIA AVALÚO AÑO 2023 VS. PRECIO ESCRITURA
Local Comercial	070-213729	local 2C bloque C piso 1 - GREEN HILLS	326.9	$801,111,645.00	$801,111,645.00	$ 902,696,700	17/01/2023	No. 11 DE: CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS 20/09/2019	$ 101,585,055
Local Comercial	070-213730	local 3C bloque C piso 1 - GREEN HILLS	434.42	$995,675,223.43	$ 995,675,223	$ 1,083,510,398	NO HAY	NO HAY	$ 87,835,175

Local Comercial	070-213731	local 4C bloque C piso 1 - GREEN HILLS	1350.67	$2,016,643,395.63	$ 2,016,643,396	$ 3,489,092,574	NO HAY	NO HAY	$ 1,472,449,178
Local Comercial	070-213740	local 12C bloque C piso 3 - GREEN HILLS	617.76	$974,604,960.12	$ 974,604,960	$ 917,136,071	17/01/2023	No. 11 DE: CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS 20/09/2019 (20/09/2019)	$ (57,468,889)
Local Comercial	070-213732	local 13C bloque C piso 2 - GREEN HILLS	9.14	$19,381,075.75	$ 19,381,076	$ 61,457,139	NO HAY	(Aparece en avalúo AREA 9) NO HAY TITULO	$ 42,076,063
Local Comercial	070-199815	local 3 bloque G piso 2 - GREEN HILLS	522.39	$749,632,412.01	$ 749,632,412	$ 887,733,374	17/01/2023	No. 9 DE: CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS 20/09/2019 (20/09/2019)	$ 138,100,962
Local Comercial	070-213741	edificio I pisos 1,2 y 3 - GREEN HILLS	766.22	$1,017,144,218.06	$ 1,017,144,218	$ 1,575,483,121	16/01/2023	ANOTACION 11 DE: CENTRO COMERCIAL GREEN HILLS (20/09/2019)	$ 558,338,903
Local Comercial	070-213680	local 1A bloque A piso 1 - GREEN HILLS	5.5	$11,662,070.00	$ 11,662,070				$ (11,662,070)
		TOTAL	4.0033	$6,585,855,000.00	$ 6,585,855,000	$ 8,917,109,377			$ 2,331,254,377

FUENTE.DOCUMENTOS CARPETA BIENES -SECRETARIA GENERAL GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Con certificado de tradición de fecha 19/10/2023, aparece: ANOTACIÓN 14. DE: BANCOLOMBIA S.A. A: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DE No. DE MATRICULA 070-199815. ANOTACIÓN 13 DE: BANCOLOMBIA S.A. A: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. DE MATRICULA No. 070-213730. ANOTACIÓN 13. DE: BANCOLOMBIA S.A. A: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DE MATRICULA No. 070-213731. ANOTACIÓN 13 DE: BANCOLOMBIA S.A. A: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ No. DE MATRICULA 070-213732. ANOTACIÓN 13. DE: BANCOLOMBIA S.A. A: DEPARTAMENTO DE BOYACA. MATRICULA No. 070-213740. ANOTACIÓN 13 DE: BANCOLOMBIA S.A. A: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MATRICULA No. 070-213741.

Comprobante de egreso con fecha 2023-11-09 CUENTA BANCO DAVIVIENDA No. 17706999939-7 FONDOS COMUNES POR VALOR DE $6.058.986.600, CON RESOLUCIÓN No. 00003366 con fecha 10/10/2023 por medio de la cual se autoriza el pago de un bien inmueble adquirido por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BLOQUE C1 PISO LOCAL C2, BLOQUE C1 LOCAL 3C, BLOQUE C2 PISO LOCAL 4C, BLOQUE C3 PISO LOCAL 12C, BLOQUE C2 PISO LOCAL 13C, BLOQUE G LOCAL 3, BLOQUE A LOCAL 1L, BLOQUE 2 PISO CAJERO 1A PERTENECIENTEA GREEN HILLS TUNJA.

Tabla 22

CUADRO RESUMEN DE VALORES - LOCALES CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS TUNJA- BOYACÁ AVALÚOS A3

MARZO 2023

N	INMUEBLE	ÁREA M2	VALOR M2	VALOR TOTAL	DEPRECIACIÓN
1	AV. UNIVERSITARIA N° 75ª – 00 LOCAL 4C BLOQUE C 2°.TELEPERFORMANCE	1350.67M2	$2.969.231	$3.489.092.574	13%
2	AV. UNIVERSITARIA N° 75ª – 00 1ER PISO TELEPERFORMANCE ESQUINA.	434.42 M2	$2.969.231	$1.083.510.398	16%
3	GREEN HILLS – TUNJA P.H. BLOQUE C 1 PISO 1 LOCAL 2 C. EDIFICIO C ESTÉTICA 1ER PISO	326.90 M2	$2.969.231	$ 902.696.700	7%
4	GREEN HILLS – TUNJA P.H. BLOQUE C 3° PISO LOCAL 12 C 3ER PISO ESQ. INTERIOR FACHADA CURVA	617.76 M2	$2.969.231	$ 977.136.071	50%
5	AV. UNIVERSITARIA N° 75ª – 00 LOCAL 3 BLOQUE G 2DO PISO AMINTA	522.39 M2	$2.678.462	$ 839.521.058	40%
6	EDIFICIO 1 CC GREEN HILLS – TUNJA P.H. EDIFICIO OPTISALUD – TRES PISOS	766.22 M2	$2.119.769	$ 1.575.483.121	3%
7	LOCAL 13C BLOQUE C PISO 2 – GREEN HILLS	9.14 M2	$6.828.571	$ 62.413.139	0
8	LOCAL CAJERO 1ª CC GREEN HILLS – TUNJA P.H. ESPACIO CAJERO EDIFICIO EL CORRAL	5.50 M2	$6.828.571	$ 37.557.141	0
	TOTAL			$8.967.410.202	

FUENTE: AVALÚO QUE APARECE EN SECOP II

CRITERIO: Se incumplen por parte del Área Administrativa designada para publicación de documentos en la plataforma SECOP II y reporte de Cuenta a la Contraloría; los funcionarios responsables de pago con la Constitución Política, Articulo 209. Ley 1474 de 2011, Artículos 83 y 84. Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Ley 80 de 1993, Articulo 24. Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente (Decreto Ley 4170 de 2011). Manuales de contratación e interventoría de la Gobernación de Boyacá. Inconformidad al no realizar el correcto diligenciamiento del formato F13A_AGR. Contratación; en virtud de la Resolución 004 del 07 de enero de 2025 por el cual se establece la rendición de cuentas**.**

CAUSA: Falta de interoperabilidad y verificación de lleno de requisitos para pagos; diferencias conceptuales entre funcionarios responsables de trámite; falta de controles y ética incumplimiento total.

Extemporaneidad en la publicación de soporte de trámite por parte de los funcionarios que actuaron en la compraventa de los predios.

EFECTO: Se vulnero el deber de transparencia y el libre acceso a la información pública, conforme a la Ley 2195 de 2022.

Por otra parte, con oficio DOOCVCA-I 078 con fecha 6 de octubre de 2025, la Dirección de Obras Civiles y Costos Ambientales de la Contraloría General de Boyacá, cuya referencia es: Denuncia D-25-019 de la Gobernación de Boyacá. En la inspección y verificación a los predios objeto del contrato de compraventa, llevado a cabo el 24 de septiembre.

En NECESIDAD aparece …

"El estudio de necesidad realizado por el Departamento de Boyacá, entre otros establece lo siguiente:

"PROBLEMA CENTRAL: *Necesidad de adquirir un bien inmueble con destinación al archivo Departamental y demás oficinas de la Gobernación de Boyacá.*

SITUACIÓN EXISTENTE CON RELACIÓN AL PROBLEMA: *En atención al crecimiento del Archivo Central e Histórico, el interior del Edificio Palacio De La Torre es insuficiente para garantizar el repose y la transferencia de los archivos documentales, por lo cual es necesario contar con que tenga la capacidad estructural para recibir las dependencias de la Gobernación de Boyacá y garantizar acceso a la información.*

El problema central que se ha encontrado es una deficiente gestión de los documentos contenidos en el Archivo General del Departamento de Boyacá debido a que el archivo lleva más de 25 años sin un lugar fijo y unificado, pues siempre se ha pagado arriendo en las instalaciones para realizar la custodia de la documentación. Según el diagnóstico realizado por la Subdirección de gestión documental, los espacios con los que se cuenta actualmente son insuficientes para el almacenamiento correcto de dichos documentos, además de que el continuo traslado de los archivos facilita su deterioro y su poca conservación."

En otro aparte del informe señala: …" Según el Plan Departamental de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ***ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL Y DEMÁS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ*** *ha sido evaluado de forma integral, en su normatividad vigente, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socio económica vigentes."*

En otro de los apartes del informe técnico se menciona:

… "Durante la visita de inspección, se verificó que el Departamento de Boyacá, mediante Contrato de Comodato No. 2343 del 16 de junio de 2024, cuyo objeto es: "Entregar a la Empresa Departamental de Servicios


Públicos de Boyacá S.A E.S.P., identificada con Nit 900.297.725-0, a título de comodato, un inmueble propiedad del departamento de Boyacá, ubicado en la avenida universitaria 75-00, Centro Empresarial "Green Hills " de la ciudad de Tunja, local 1 bloque I identificado con la Cedula Catastral No. 00-01-00-00-0002-0901-9-00-00-1505, folio de matrícula inmobiliaria No. 070-213741, y con los linderos enunciados en la escritura pública No. 2142 del 22 de septiembre de 2023 de la Notaría Cuarta de Tunja, para la ubicación de la sede administrativa de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, con el propósito de garantizar espacios propicios para el desarrollo de las labores misionales", lo anterior en un área de setecientos sesenta y seis punto veintidós (766,22 M²) metros cuadrados.

El área restante, en el momento de la inspección, es decir, Tres mil doscientos sesenta y seis puntos setenta y ocho (3.266,78 M²) metros cuadrados, están inmersos dentro del Contrato de Obra Pública No. 2366 de 2024, suscrito por el Departamento de Boyacá y Consorcio Anaray, con representante Legal Oscar Yovany Galán Molano, para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA GOBERNACION DE BOYACA", mantenimientos a realizarse, en los bienes inmuebles de La Gobernación de Boyacá como son: - Casa Privada (Matilde Anaray). - Casa fiscal Muiscas - Casa Maldonado - Casa del Menor - Sede Secretaría de Salud - Casa de Sogamoso - Bodega talleres de obras públicas - Casa Gestión del Riesgo - Casa rural granja de villa de Leyva - Green Hills.

De acuerdo con el Informe de Interventoría N° 11 de fecha 31 de julio de 2025, el Contrato de Obra Pública No. 2366 de 2024, tienen un avance en su ejecución del 89.64%, en las actividades en intervención se encuentran los inmuebles propiedad e la Gobernación ubicados en Green Hills.

Con lo descrito anteriormente, se observa que el diecinueve (19%) de los inmuebles objeto de la compra por parte del Departamento se encuentran en uso por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., y el restante se encuentra para obras de remodelación, a través de mantenimiento preventivo y correctivo.

Ilustración 14

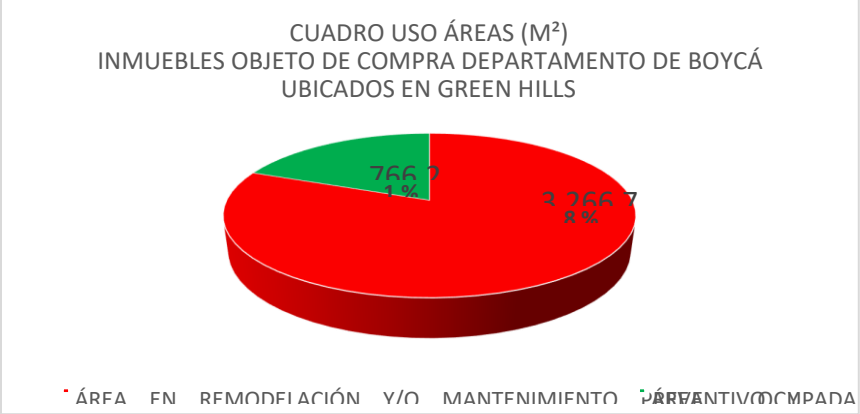

Por lo expuesto se establece que este informe forma parte integral del presente informe el cual se anexa.

Conclusión del Equipo de Auditoría


De acuerdo a los resultados en atención a la denuncia se establecieron la observación administrativa con incidencia disciplinaria, es necesario que se continue con la gestión a fin de adelantar por parte de los Comités correspondientes la celeridad en cuanto el uso de esos bienes por parte de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ a fin de no generar un posible detrimento patrimonial.

Frente a la respuesta otorgada por la Entidad, no se encuentra argumento alguno para inherente a la omisión del **reporte obligatorio** de la gestión contractual en el aplicativo SIA OBSERVA y la ejecución de su pago en el Formato F13 de la Contraloría General de Boyacá para la vigencia 2023. Por tal razón, se configura **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 3** para ser incluido en el plan de mejoramiento.

12. DESARROLLO PROCESO AUDITOR

12.1. MACROPROCESO FINANCIERO


La Gobernación de Boyacá, mediante Resolución No. 036 con fecha 28 de marzo de 2025, por medio de la cual se modifica el manual de políticas contables bajo la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación; a través de la plataforma CHIP CONTADURIA chip.gov.co la Entidad rindió la información contable pública – convergencia reporte de estados financieros dentro de los términos establecidos, denominado "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 31 de diciembre de 2024 – 2025, así:

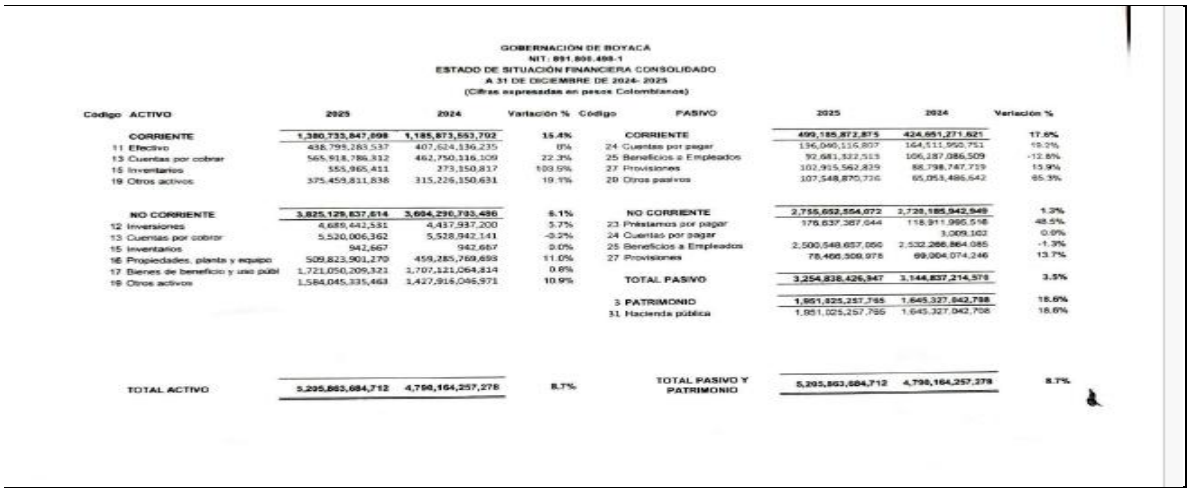

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
NIT. 891.800.498-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024- 2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	2025	2024	Variación %
	CORRIENTE	1,380,735,847,898	1,185,873,553,702	15.4%
11	Efectivo	438,795,283,537	407,624,136,235	0%
13	Cuentas por cobrar	565,918,786,312	462,750,316,109	22.3%
15	Inventarios	555,965,411	273,150,817	103.5%
19	Otros activos	375,459,811,838	315,226,150,631	19.1%
	NO CORRIENTE	3,825,129,837,814	3,694,290,703,486	6.1%
12	Inversiones	4,689,442,531	4,437,937,200	5.7%
13	Cuentas por cobrar	5,520,006,362	5,528,942,141	-0.2%
15	Inventarios	942,667	942,667	0.0%
16	Propiedades, planta y equipo	509,823,901,270	459,285,769,698	11.0%
17	Bienes de beneficio y uso públ	1,721,050,209,321	1,707,121,064,814	0.8%
19	Otros activos	1,584,045,335,463	1,427,916,046,971	10.9%
	TOTAL ACTIVO	5,205,865,684,712	4,798,164,257,278	8.7%

Código	PASIVO	2025	2024	Variación %
	CORRIENTE	499,185,872,875	424,651,271,821	17.6%
24	Cuentas por pagar	196,040,116,807	164,111,950,751	19.2%
25	Beneficios a Empleados	92,681,322,513	106,187,086,509	-12.8%
27	Provisiones	102,915,562,829	88,798,747,719	15.9%
29	Otros pasivos	107,548,870,726	65,053,486,842	65.3%
	NO CORRIENTE	2,755,652,554,072	2,720,185,942,949	1.3%
23	Préstamos por pagar	176,837,387,644	118,911,965,518	48.5%
24	Cuentas por pagar		3,009,162	0.9%
25	Beneficios a Empleados	2,500,548,657,050	2,532,266,864,085	-1.3%
27	Provisiones	78,466,509,978	69,004,074,246	13.7%
	TOTAL PASIVO	3,254,838,426,947	3,144,837,214,570	3.5%
3	PATRIMONIO	1,951,025,257,765	1,645,327,042,708	18.6%
31	Hacienda pública	1,951,025,257,765	1,645,327,042,708	18.6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,205,863,684,712	4,798,164,257,278	8.7%

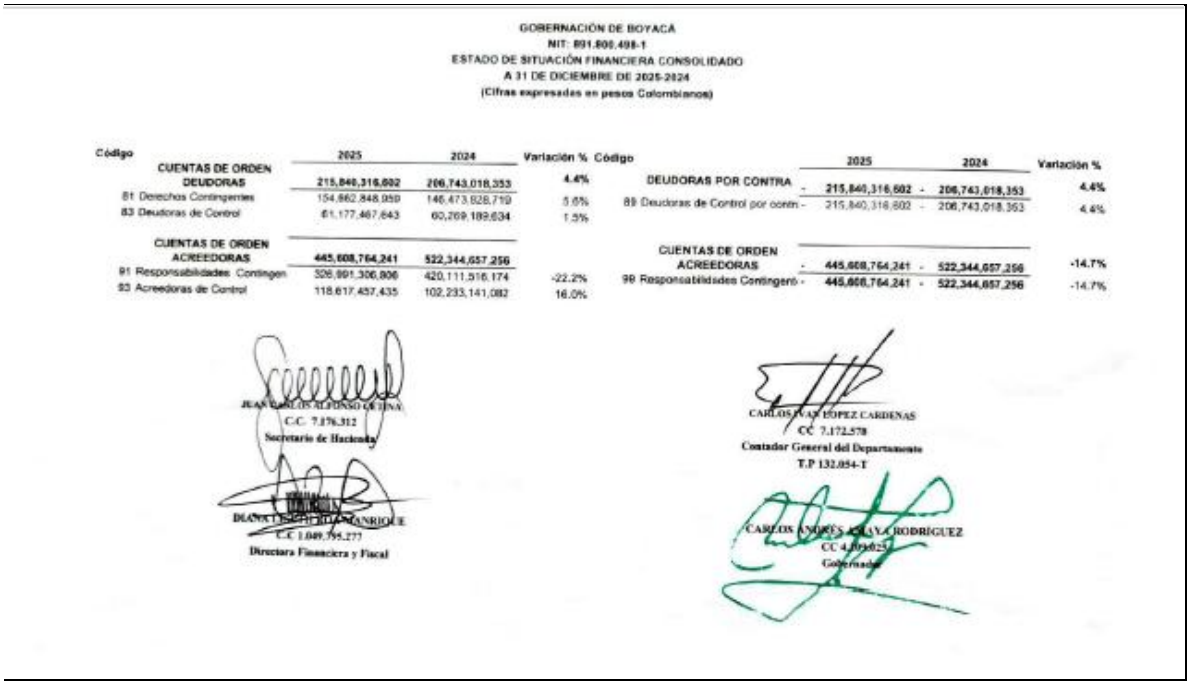

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código		2025	2024	Variación %
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	215,840,316,602	206,743,018,353	4.4%
81	Derechos Contingentes	154,662,848,059	146,473,828,719	5.6%
83	Deudoras de Control	61,177,467,643	60,269,189,634	1.5%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	445,608,764,241	522,344,657,256	
91	Responsabilidades Contingen	326,991,306,806	420,111,516,174	-22.2%
93	Acreedoras de Control	118,617,457,435	102,233,141,082	16.0%

Código		2025	2024	Variación %
	DEUDORAS POR CONTRA	- 215,840,316,602	- 206,743,018,353	4.4%
89	Deudoras de Control por contr	- 215,840,316,602	- 206,743,018,353	4.4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 445,608,764,241	- 522,344,657,256	-14.7%
99	Responsabilidades Contingent	- 445,608,764,241	- 522,344,657,256	-14.7%

JUAN CARLOS ALFONSO QUIJANO
C.C. 7.176.312
Secretario de Hacienda

DIANA CRISTINA [illegible] ENRIQUEZ
C.C. 1.049.795.277
Directora Financiera y Fiscal

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
CC 7.172.578
Contador General del Departamento
T.P 132.054-T


CARLOS ANDRES [illegible] RODRIGUEZ
CC 4.[illegible]
Gobernador

.

Manual de políticas contables

Este análisis consiste en evaluar el contenido, estructura y cumplimiento normativo del Manual de Políticas Contables de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, verificando su adecuación a las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la CGN (especialmente Resolución 533 de 2015) y su utilidad como herramienta para la gestión contable, financiera y fiscal.
En la vigencia fiscal 2025 la Gobernación de Boyacá allegó dos (2) Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contabilidad Nos. 001 con fecha 19 marzo de 2025 y 002 con fecha 5 de noviembre de 2025.

Ilustración 15

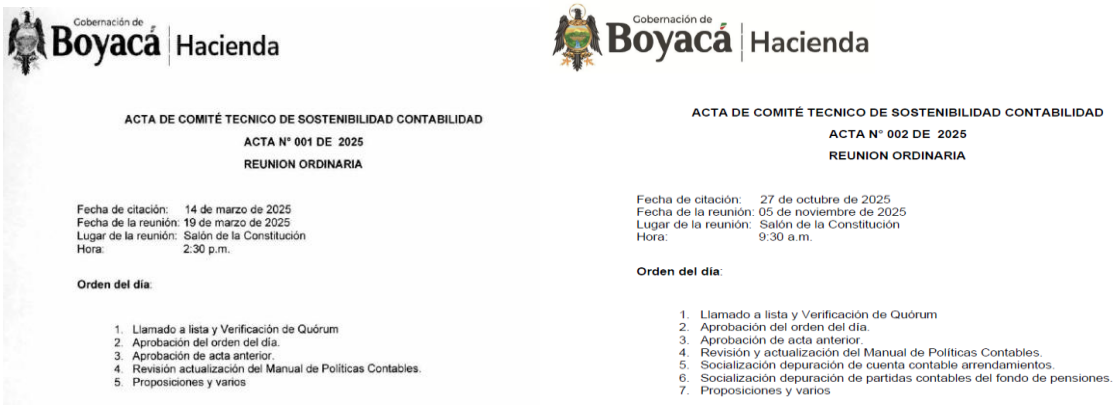

Gobernación de Boyacá | Hacienda

ACTA DE COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABILIDAD
ACTA N° 001 DE 2025
REUNION ORDINARIA

Fecha de citación: 14 de marzo de 2025
Fecha de la reunión: 19 de marzo de 2025
Lugar de la reunión: Salón de la Constitución
Hora: 2:30 p.m.

Orden del día:

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de acta anterior.
4. Revisión actualización del Manual de Políticas Contables.
5. Proposiciones y varios

Gobernación de Boyacá | Hacienda

ACTA DE COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABILIDAD
ACTA N° 002 DE 2025
REUNION ORDINARIA


Fecha de citación: 27 de octubre de 2025
Fecha de la reunión: 05 de noviembre de 2025
Lugar de la reunión: Salón de la Constitución
Hora: 9:30 a.m.

Orden del día:

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de acta anterior.
4. Revisión y actualización del Manual de Políticas Contables.
5. Socialización depuración de cuenta contable arrendamientos.
6. Socialización depuración de partidas contables del fondo de pensiones.
7. Proposiciones y varios

Resoluciones Nos. 001 con fecha 10 de febrero de 2025, por medio de la cual se reglamenta internamente el comité técnico de sostenibilidad del sistema contable y 036 con fecha 28 de marzo de 2025, por medio de la cual se modifica el Manual de Políticas Contables bajo la nueva normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.

Ilustración 16

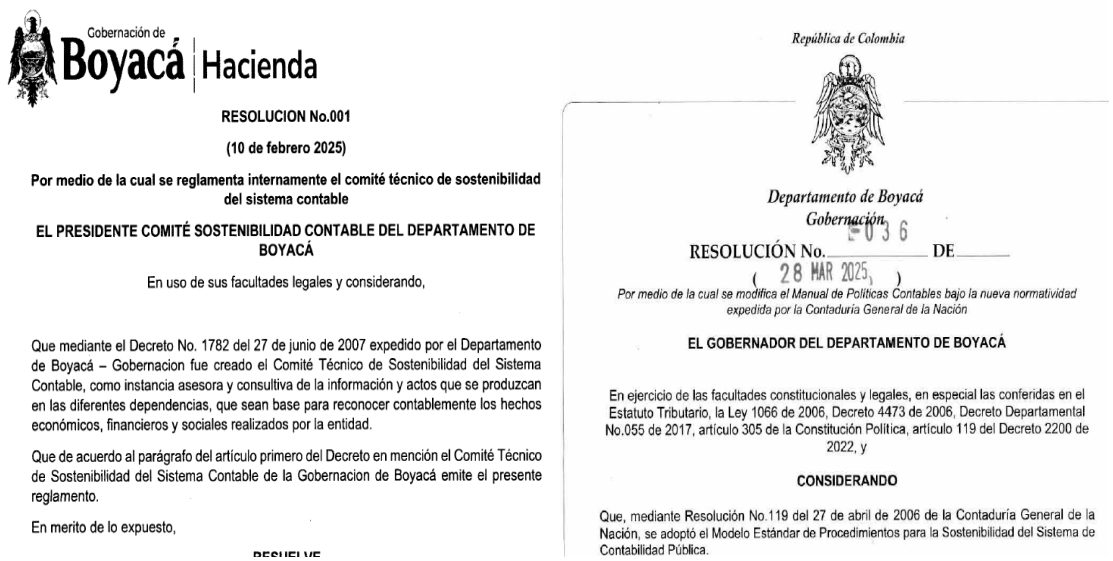

Gobernación de Boyacá | Hacienda

RESOLUCION No.001

(10 de febrero 2025)

Por medio de la cual se reglamenta internamente el comité técnico de sostenibilidad del sistema contable

EL PRESIDENTE COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus facultades legales y considerando,

Que mediante el Decreto No. 1782 del 27 de junio de 2007 expedido por el Departamento de Boyacá – Gobernacion fue creado el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, como instancia asesora y consultiva de la información y actos que se produzcan en las diferentes dependencias, que sean base para reconocer contablemente los hechos económicos, financieros y sociales realizados por la entidad.

Que de acuerdo al parágrafo del artículo primero del Decreto en mención el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Gobernacion de Boyacá emite el presente reglamento.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

RESOLUCIÓN No. 036 DE
(28 MAR 2025)

Por medio de la cual se modifica el Manual de Políticas Contables bajo la nueva normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Estatuto Tributario, la Ley 1066 de 2006, Decreto 4473 de 2006, Decreto Departamental No.055 de 2017, artículo 305 de la Constitución Política, artículo 119 del Decreto 2200 de 2022, y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución No.119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, se adoptó el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.

Los estados financieros de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se enmarcan en lo establecido en la Resolución No 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, para lo cual se realizó la revisión y verificación en forma selectiva de


las transacciones financieras, documentos, comprobantes, registros y libros de Contabilidad.


Incluir y clasificar teniendo en cuenta la importancia con relación a la opinión. Numerar consecutivamente, incluir incidencia si la tiene y el tema al cual se refiere el hallazgo.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 4 POR LA NO PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO.

CONDICIÓN: Revisada la página web de la Gobernación de Boyacá, de la vigencia 2025, se pudo establecer la publicación de los Estado de Situación Financiera Sector Central, tal como se evidencia.


Ilustración 17

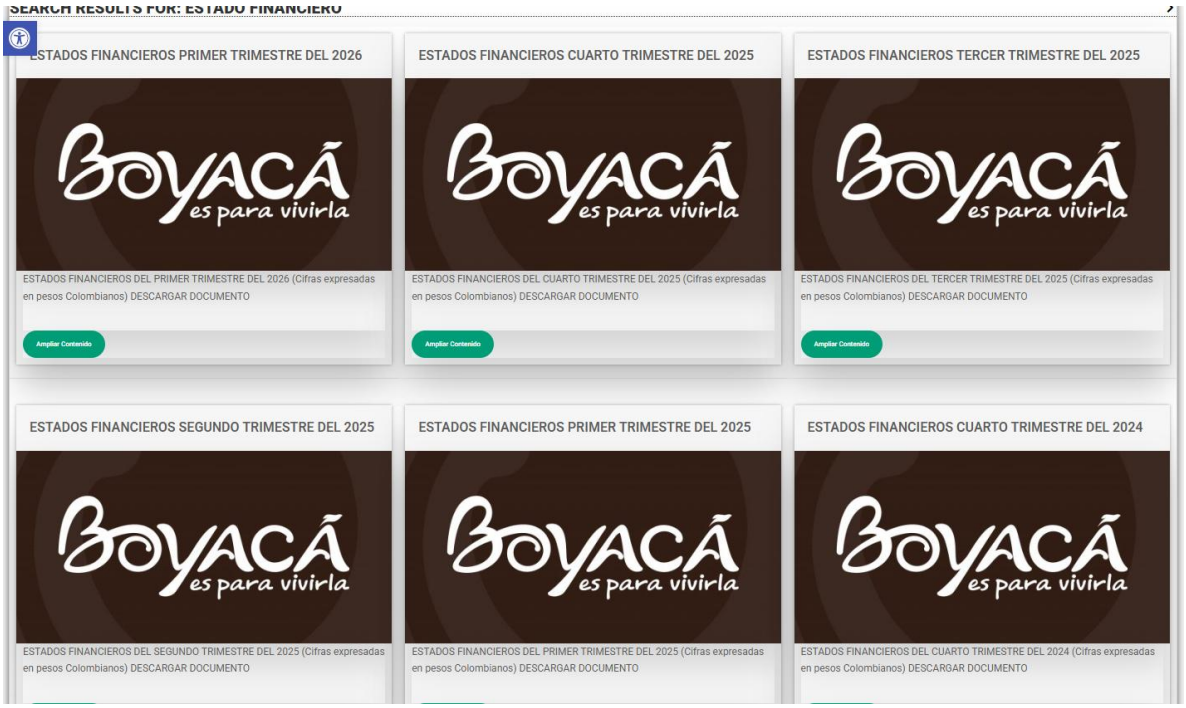

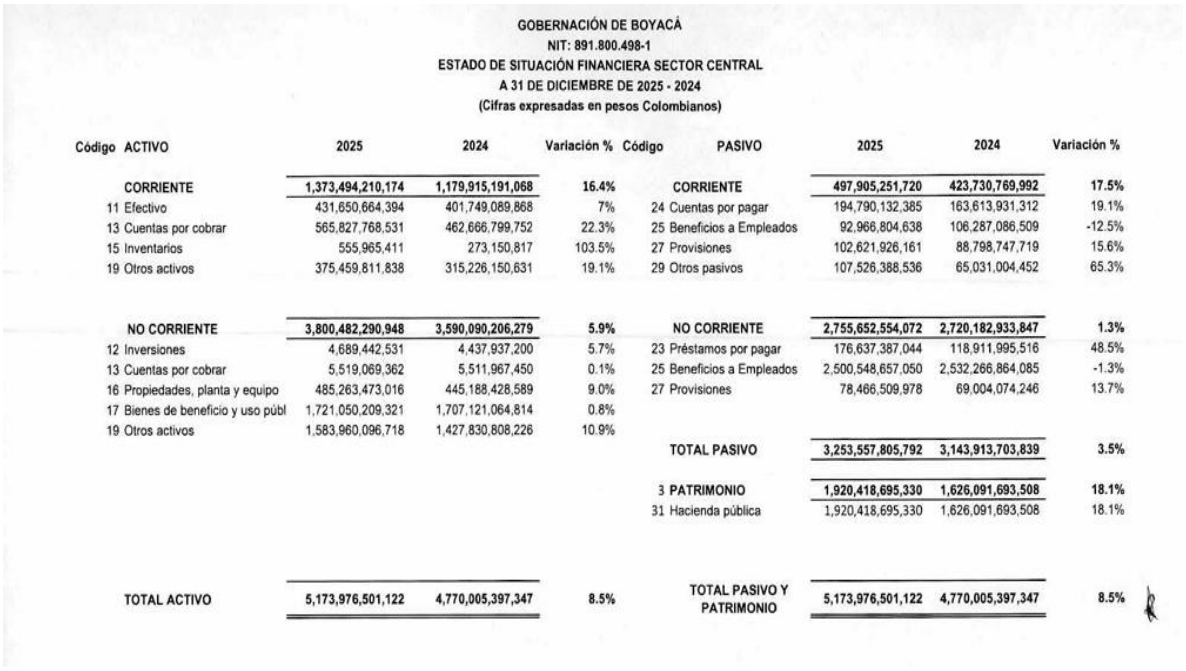

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	2025	2024	Variación %	Código	PASIVO	2025	2024	Variación %
	CORRIENTE	1,373,494,210,174	1,179,915,191,068	16.4%		CORRIENTE	497,905,251,720	423,730,769,992	17.5%
11	Efectivo	431,650,664,394	401,749,089,868	7%	24	Cuentas por pagar	194,790,132,385	163,613,931,312	19.1%
13	Cuentas por cobrar	565,827,768,531	462,666,799,752	22.3%	25	Beneficios a Empleados	92,966,804,638	106,287,086,509	-12.5%
15	Inventarios	555,965,411	273,150,817	103.5%	27	Provisiones	102,621,926,161	88,798,747,719	15.6%
19	Otros activos	375,459,811,838	315,226,150,631	19.1%	29	Otros pasivos	107,526,388,536	65,031,004,452	65.3%
	NO CORRIENTE	3,800,482,290,948	3,590,090,206,279	5.9%		NO CORRIENTE	2,755,652,554,072	2,720,182,933,847	1.3%
12	Inversiones	4,689,442,531	4,437,937,200	5.7%	23	Préstamos por pagar	176,637,387,044	118,911,995,516	48.5%
13	Cuentas por cobrar	5,519,069,362	5,511,967,450	0.1%	25	Beneficios a Empleados	2,500,548,657,050	2,532,266,864,085	-1.3%
16	Propiedades, planta y equipo	485,263,473,016	445,188,428,589	9.0%	27	Provisiones	78,466,509,978	69,004,074,246	13.7%
17	Bienes de beneficio y uso públ	1,721,050,209,321	1,707,121,064,814	0.8%					
19	Otros activos	1,583,960,096,718	1,427,830,808,226	10.9%					
						TOTAL PASIVO	3,253,557,805,792	3,143,913,703,839	3.5%
					3	PATRIMONIO	1,920,418,695,330	1,626,091,693,508	18.1%
					31	Hacienda pública	1,920,418,695,330	1,626,091,693,508	18.1%
	TOTAL ACTIVO	5,173,976,501,122	4,770,005,397,347	8.5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,173,976,501,122	4,770,005,397,347	8.5%

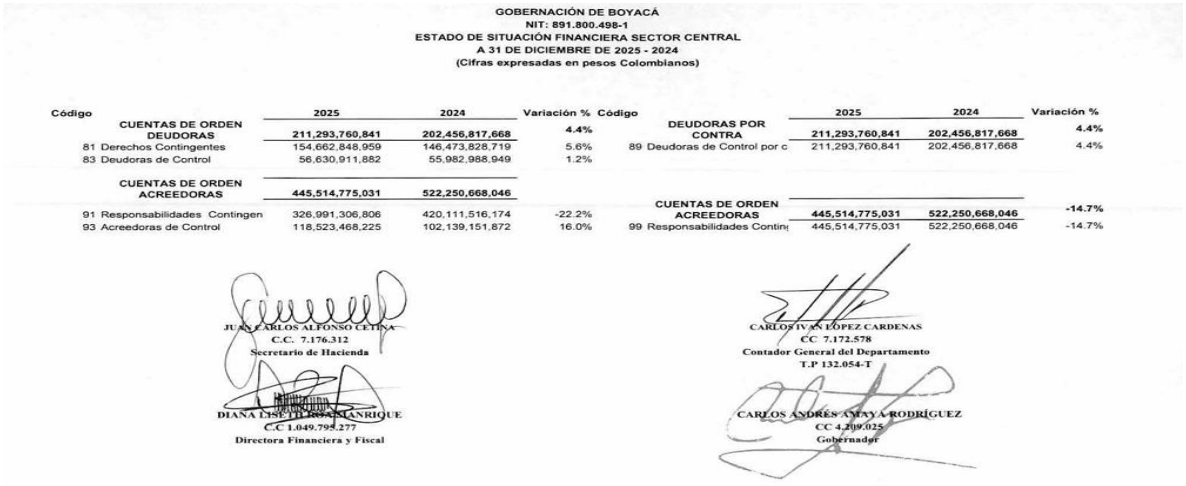

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código		2025	2024	Variación %	Código		2025	2024	Variación %
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	211,293,760,841	202,456,817,668	4.4%		DEUDORAS POR CONTRA	211,293,760,841	202,456,817,668	4.4%
81	Derechos Contingentes	154,662,848,959	146,473,828,719	5.6%	89	Deudoras de Control por c	211,293,760,841	202,456,817,668	4.4%
83	Deudoras de Control	56,630,911,882	55,982,988,949	1.2%					
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	445,514,775,031	522,250,668,046						
91	Responsabilidades Contingen	326,991,306,806	420,111,516,174	-22.2%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	445,514,775,031	522,250,668,046	-14.7%
93	Acreedoras de Control	118,523,468,225	102,139,151,872	16.0%	99	Responsabilidades Contin	445,514,775,031	522,250,668,046	-14.7%

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
C.C. 7.176.312
Secretario de Hacienda

DIANA LISETH [illegible]
C.C 1.049.795.277
Directora Financiera y Fiscal

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
CC 7.172.578
Contador General del Departamento
T.P 132.054-T

CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
CC 4.209.025
Gobernador

Pero se puedo evidencia también, que no fueron publicados los informes de los Estados de Situación Financiera Consolidado de la vigencia 2025, tal como se establece:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024- 2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	2025	2024	Variación %	Código	PASIVO	2025	2024	Variación %
	CORRIENTE	**1,380,733,847,098**	**1,185,873,553,792**	**16.4%**		**CORRIENTE**	**499,185,872,875**	**424,651,271,621**	**17.6%**
11	Efectivo	438,799,283,537	407,624,136,235	8%	24	Cuentas por pagar	196,040,116,807	164,511,950,751	19.2%
13	Cuentas por cobrar	565,918,786,312	462,750,116,109	22.3%	25	Beneficios a Empleados	92,681,322,513	106,287,086,509	-12.8%
15	Inventarios	555,965,411	273,150,817	103.5%	27	Provisiones	102,915,562,829	88,798,747,719	15.9%
19	Otros activos	375,459,811,838	315,226,150,631	19.1%	29	Otros pasivos	107,548,870,726	65,053,486,642	65.3%
	NO CORRIENTE	**3,825,129,837,614**	**3,604,290,703,486**	**6.1%**		**NO CORRIENTE**	**2,755,652,554,072**	**2,720,185,942,949**	**1.3%**
12	Inversiones	4,689,442,531	4,437,937,200	5.7%	23	Préstamos por pagar	176,837,387,044	118,911,995,516	48.5%
13	Cuentas por cobrar	5,520,006,362	5,528,942,141	-0.2%	24	Cuentas por pagar		3,009,102	0.0%
15	Inventarios	942,667	942,667	0.0%	25	Beneficios a Empleados	2,500,548,657,050	2,532,266,864,085	-1.3%
16	Propiedades, planta y equipo	509,823,901,270	459,285,769,693	11.0%	27	Provisiones	78,466,509,978	69,004,074,246	13.7%
17	Bienes de beneficio y uso públ	1,721,050,209,321	1,707,121,064,814	0.8%					
19	Otros activos	1,584,045,335,463	1,427,916,046,971	10.9%		**TOTAL PASIVO**	**3,254,838,426,947**	**3,144,837,214,570**	**3.5%**
						3 PATRIMONIO	**1,951,025,257,765**	**1,645,327,042,708**	**18.6%**
						31 Hacienda pública	1,951,025,257,765	1,645,327,042,708	18.6%
	TOTAL ACTIVO	**5,205,863,684,712**	**4,790,164,257,278**	**8.7%**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**5,205,863,684,712**	**4,790,164,257,278**	**8.7%**

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código		2025	2024	Variación %	Código		2025	2024	Variación %
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**215,840,316,602**	**206,743,018,353**	**4.4%**		**DEUDORAS POR CONTRA**	**- 215,840,316,602**	**- 206,743,018,353**	**4.4%**
81	Derechos Contingentes	154,662,848,959	146,473,828,719	5.6%	89	Deudoras de Control por contra	- 215,840,316,602	- 206,743,018,353	4.4%
83	Deudoras de Control	61,177,467,643	60,269,189,634	1.5%					
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**445,608,764,241**	**522,344,657,256**			**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**- 445,608,764,241**	**- 522,344,657,256**	**-14.7%**
91	Responsabilidades Contingen	326,991,306,806	420,111,516,174	-22.2%	99	Responsabilidades Contingent	- 445,608,764,241	- 522,344,657,256	-14.7%
93	Acreedoras de Control	118,617,457,435	102,233,141,082	16.0%					

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
C.C. 7.176.312
Secretario de Hacienda

DIANA LUCIA ROJAS ENRIQUE
C.C 1.049.795.277
Directora Financiera y Fiscal

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
CC 7.172.578
Contador General del Departamento
T.P 132.054-T

CARLOS ANDRÉS ALAYA RODRÍGUEZ
CC 4.209.025
Gobernador

Por lo expuesto anteriormente, los Estados Financieros consolidados de la Gobernación de Boyacá, deben ser publicado, en el cual la matriz de la Entidad debe preparar y difundir Estados Financieros de propósito general consolidados que presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de efectivo de la matriz y sus dependientes, como si fuesen los de un solo Ente. La publicación de estos informes es un requisito establecido por la Contaduría General de Nación y debe realizarse en la página web de la Gobernación de Boyacá. (Ley 222 de 1995).

CRITERIO: Incumplimiento al capítulo VI artículo 34 OBLIGACIÓN DE PREPARAR Y DIFUNDIR ESTADOS FINANCIEROS, artículo 35 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS de la Ley 222 de 1995 y a la Resolución 356 de 2022, por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables que deban publicarse conforme lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, artículos primero, segundo y tercero, Resolución No. 036 con fecha 28 de marzo de 2025, Por medio de la cual se modifica el Manual de Políticas Contables bajo la nueva normatividad expedida por la CGN. También se presenta la Inobservancia de la Resolución 494 de 2017, en el artículo 14 de la Resolución 494 de 2017 expedida por la Contraloría General de Boyacá establece, que la información debe ser confiable teniendo en cuenta las variables de calidad, oportunidad y suficiencia para emitir elresultado en cuanto al fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal.

Adicionalmente las entidades territoriales deberán aplicar procedimientos transversales para evaluar el Control Interno Contable como lo indica la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) “Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, **con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información finan**ciera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel…”.

CAUSA: Inefectividad de controles o no aplicación de los mismos para ejecutar el proceso financiero de una forma efectiva, ausencia de medidas tendientes a la verificación periódica del cumplimiento de las políticas contables adoptadas por la entidad, así como ineficacia del comité de sostenibilidad contable.

EFECTO: Información financiera con inobservancia de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, como autoridad reguladora de la contabilidad pública

Analizada la respuesta a la presente observación y de acuerdo a lo establecido en su manual de política contable, numeral 1.10 PERIODICIDAD DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES, establece:

1.10. PERIODICIDAD DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

El Departamento de Boyacá y sus entidades agregadas deberán preparar, presentar y publicar los informes financieros y contables conforme a las disposiciones establecidas en los procedimientos contables del régimen público. De conformidad con la resolución 356 de 2022, los informes deberán ser preparados de forma **trimestral**, con corte a las siguientes fechas:

1.10.1. Reportes trimestrales

Hacen parte de los reportes trimestrales el reporte financiero y contable del Departamento de Boyacá y sus entidades agregadas que deben ser cargados trimestralmente en la plataforma del CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Contable Pública) entre los cuales se encuentran:

1.10..1. Cgn2015_001_saldos_y_movimientos_convergencia
1.10..2. Cgn2015_002_operaciones_reciprocas_convergencia
1.10..3. Cgn2016c01_variaciones_trimestrales_significativas
1.10. .4. Cgn2025_005_cambios_relevantes_estadisticas_gfp

Para la consolidación de la información contable, es necesario que las entidades agregadas, remitan la información a la Subdirección de Contabilidad dentro de los plazos y parámetros establecidos, debidamente validados y suscritos por los responsables de la información con la finalidad de realizar la consolidación en los siguientes plazos:

FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE PRESENTACION
31 de marzo	16 de abril
30 de junio	16 de julio
30 de septiembre	16 de octubre
31 de diciembre	30 de enero

Una vez realizada la consolidación de la información contable, esta se presentará a la Contaduría General de la Nación a través de la plataforma CHIP cumpliendo los siguientes plazos:

FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE PRESENTACION
31 de marzo	30 de abril
30 de junio	31 de julio
30 de septiembre	31 de octubre
31 de diciembre	15 de febrero del año siguiente al periodo contable

Las fechas de presentación de la información contable trimestral puede modificarse ocasionalmente de acuerdo a las directrices que a través de publicaciones emita la Contaduría General de la Nación, para lo cual es necesario revisar periódicamente la normatividad.

1.10.2. Publicación de los informes financieros y contables.

El departamento de Boyacá y sus entidades agregadas publicarán sus informes financieros y contables, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al trimestre informado. En la siguiente tabla se detalla la fecha de corte y la fecha límite de publicación para cada trimestre.

FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE PUBLICACION
31 de marzo	30 de abril
30 de junio	31 de julio
30 de septiembre	31 de octubre

De acuerdo con la resolución 356 de 2022, para el último trimestre existe una excepción (ver numeral 1.10.4 de este manual). En consecuencia, la publicación de los informes anuales se realizará el 15 de febrero del año siguiente.

La publicación de los informes financieros y contables se realizará en la página web de la respectiva entidad de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.

1.10.3. Generalidades de la información financieros a presentar de conformidad con la resolución 356 de 2022.

Estado de situación financiera:

El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera del departamento de Boyacá y sus entidades agregadas a un trimestre determinado y presenta la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y la situación del patrimonio. Para el trimestre con corte al 31 de marzo, el estado de situación financiera se presentará comparado con el estado de situación financiera contenido en el conjunto completo de estados financieros presentados a 31 de diciembre del año anterior.

Estado de resultados:

El estado de resultados, el estado de resultado integral o el estado de resultado de la gestión de liquidación, según corresponda, constituye una representación de los ingresos, costos y gastos del departamento de Boyacá y sus entidades agregadas acumulados a un trimestre determinado.

Notas a los informes financieros y contables:

Las notas a los informes financieros y contables revelan hechos económicos que no son recurrentes, que surgen durante el trimestre y que tienen un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento del departamento de Boyacá y sus entidades agregadas, presentando así información adicional relevante.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la documentación suministrada por la Entidad, no se desvirtúa la observación, por lo que se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 4**, para ser incluido en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 5 CUENTA 11 EFECTIVO CON INCONSISTENCIAS EN SOBRESTIMACIONES Y SUBESTIMACIONES.

En la cuenta 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, aparecen 88 cuentas bancarias en el estado de tesorería, que presentan **SOBRESTIMACION** por valor de **$14.338.544.061** y **SUBESTIMACION** por **$60.962.208.809** en inconsistencias, estas están representadas en: Consignaciones no acreditadas. notas débito y notas crédito no contabilizadas, Intereses y gastos financieros no registrados, cheques no cobrados de más de 6 meses, entre otras, por lo que se debe tener en cuenta la columna Observaciones, tal como se evidencia en la siguiente tabla**.**

Tabla 23 SUBCUENTA 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

No	(C) Banco	(C) No. De Cuenta	(D) Saldo A 31 De diciembre de 2025 Según Libros	(D) Saldo A 31 De diciembre de 2025 Según Extractos Bancarios	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACIÓN	OBSERVACIÓN
1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1503003580-0	866,615,644.25	871,976,835.25	5,361,191	-	Cheque no cobrado con fecha 08/02/2024 por $5.361.191
2	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	150300457-4	39,697,900.00	41,121,400.00	1,423,500,000	-	Consignación no acreditada por $1.423.500 con fecha 28/07/2025
3	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1503706805-2	514,987,404.47	553,780,438.47	38,793,034	-	Consignaciones no acreditadas (5) entre 12/01/2023 al 27/10/2023 por $12.187.337; (19) entre 01/10/2025 hasta 30/12/2025 por valor de $26.605.697
4	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1503000212-3	2,053,285,558.54	2,056,581,496.82	3,295,938	-	Consignaciones no acreditadas (4) entre 05/10/2023 al 01/12/2023 por $372.120 y (4) entre 25/01/2024 al 18/09/2024 por valor de $
5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	150302380-6	413,465,222.94	523,019,909.59	109,554,687	-	Consignaciones no acreditadas: (1) por $697.981 con fecha 24/01/2024; (5) entre 21/10/2025 al 12/12/2025 por valor de $
6	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1503300689-1	2,386,447,219.03	2,390,195,939.03	3,901,120	152,400	Consignaciones no acreditadas (1) -$152.400 con fecha 29/01/2021 y (1) con fecha 20/02/2025 por valor de $3.901.120.

7	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1503300765-0	255,722,863.26	256,257,363.26	534,500	-	Consignaciones no acreditadas (2) con fecha 17/10/2023 por valor de $478.100 y 23/10/2023 por valor de $56.400.
8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	31503000672-2	33,149,469.85	50,116,659.96	16,967,190	-	Consignaciones no acreditadas: (2) de 2023 con fecha 16/08/2023 por valor de $57.575, (11) de 2024 con fechas entre 05/03/2024 a 09/12/2024 por valor de $8.443.407, (33) de 2025 entre 19/06/2025 al 23/12/2025 por valor de $15.765.551
9	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	415030443034	-	100,000,000.00	100,000,000	-	Consignación no acreditada con fecha 15/12/2025 por $100.000.000.
10	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	415033005844	28,356,804.11	30,002,110.11	1,645,306	-	Consignaciones no acreditadas (1) año 2022 con fecha 01/06/2022 por valor de $393.785, (1) año 2023 con fecha 31/07/2023 por valor de $1.043.000. (1) año 2024 con fecha 28/02/2024 por valor de $188.260. (1) año 2025 con fecha 14/02/2025 por valor de $20.261.
11	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	41503301536-1	93,699,965.00	96,892,266.00	3,716,102	523,810	Consignaciones no acreditadas: (1) por $62.453 con fecha 27/04/2023; (2) año 2024 entre 21/02/2024 al 29/07/2024 por valor de $811.812, y (2) con fecha 19/03/2025 y 24/04/2025 por valor de $2.841.837 Notas debito no contabilizadas (3) con fechas 11/12/2025 -523.810.
12	BANCO AV. VILLAS	701-29880-4	3,383,566,561.70	3,386,795,361.70	3,228,800	-	Notas crédito no contabilizadas (2) con fechas 28/02/2025 y 31/07/2025 por valor de $
13	BANCO AV. VILLAS	70127229-6	396,208,778.89	399,528,778.89	3,690,000	370,000	Consignaciones no acreditadas: (2) año 2024 con fechas 23/05/2024 y 03/12/2024 por $740.000 y -$370.000; (9) año 2025 entre 18/03/2025 al 12/12/2025 por valor de $2.950.000.
14	BANCO DE BOGOTA	61611658-8	460,027,695.17	632,804,484.17	172,776,789	-	Consignaciones no acreditadas (6) año 2025 entre 06/05/2025 al 29/12/2025 por valor de $172.776.789
15	BANCO DE BOGOTA	61611659-6	807,549,777.69	809,026,557.69	1,476,780	-	Consignaciones no acreditadas (1) con fecha 05/12/2025 por valor de $1.476.780.
16	BANCO DE BOGOTA	61611622-4	103,593.82	137,693.82	34,100	-	Consignaciones no acreditadas (1) año 2022 con fecha 23/02/2022 por valor de $27.600 y (1) año 2025 con fecha 29/10/2025 por valor de $6.500.
17	BANCO DE BOGOTA	61611623-2	1,147,227,974.13	1,160,337,008.13	13,109,034	-	Consignaciones no acreditadas (4) año 2025 entre 17/10/2025 al 18/12/2025 por valor de $13.109.034
18	BANCO DE BOGOTA	61609481-9	389,703,487.93	551,529,369.03	161,825,881.10	70,500	Consignaciones no acreditadas (2) año 2022 entre 16/05/2022 al 03/11/2022, por valor de $544.000, (9) año 2023 entre el 09/02/2023 al 29/12/2023, por valor de $3.503.612 y -$70.500, (3) año 2024 entre el 04/04/2024 y el 29/10/2024 por valor de $106.030.719, (8) año 2025 entre 22/01/2025 al 22/12/2025 por valor de $51.817.350.
19	BANCO DE BOGOTA	61610827-0	8,606,133,259.23	11,928,462,418.61	3,322,329,159	1,507,659,451	Transferencias (ACH) (65) año 2025 entre el 24/07/2025 al 29/12/2025, por valor de $1.665.195.463.39, Cheques sin cobrar (3) año 2025 entre el 24/11/2025 y el 30/12/2025 por valor de $7.849.408, Consignaciones no acreditadas del año 2018 (1) con fecha 12/06/2018 por valor -$192.117, del año 2020 dos (2) con fechas 30/10/2020 y 13/11/2020 por valores de -$21.600 y -$53.411, del año 2021 (10) entre el 02/12/2021 y el 30/12/2021 por valor de $58.442.000 valor negativo con fecha 24/09/2021 por valor de -$16.800, del año 2022 (35) entre el 12/01/2022 al 22/12/2022 por valor de $167.842.930 y negativos (4) con fechas 14/07/2022, 28/09/2022, 15/12/2022 y 30/12/2022 por valores de -$259.000, -$169.200, -$19.000 y $8.382.854; del año 2023 (75) entre el 02/01/2023 y el 26/12/2023 por valor de $508.254.972, del año 2024 (94) entre 09/01/2024 al 30/12/2024 por valor de $206.139.653 y un valor negativo -$931.900 con fecha 27/08/2024, del año 2025 (226) entre 13/01/2025 y el 30/12/2025 por valor de $2.288.140.523 y un valor negativo por valor de -$442.200 con fecha 23/12/2025. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS: Con fecha 19/10/2025 por valor de -$6.853.066.01 y NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS del año 2025 entre 25/07/2025 y 30/12/2025 por valor -$1.490.318.250.
20	BANCO DE BOGOTA	61611286-8	295,305,213.34	618,739,643.29	829,718,308	506,283,878	TRANSFERENCIAS (ACH) (2) con fecha 29/12/2025 por valor de $829.718.108.34, CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS: con fecha 25/07/2025 por valor de $200 y con fecha 29/12/2025 por valor negativo de -$235.334.264 NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (4) con fechas 17/12/2025 y el 29/12/2025 por valor -$270.949.614.39
21	BANCO DE BOGOTA	61611655-4	89,910,045.59	93,362,445.59	3,452,400	-	CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS: (2) ano 2023 (1) con fecha 09/10/2023 por valor de $2.810.400 y (1) del año 2025 con fecha 20/08/2025 por valor de $642.000
22	BANCO DE BOGOTA	61636690-2	5,839,242,218.60	5,910,905,511.59	74,700,092	3,581,601	TRANFERENCIAS (ACH) del año 2025 con fecha 29/12/2025 por valor de $15.802.518. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS: Año 2021 (1) con fecha 10/2021 por valor de $36.000, del año 2022 (5) entre el 13/01/2022 al 15/12/2022 por valor de $445.000, del año 2023 (8) entre el 08/02/2023 y el 21/12/2023 por valor de $1.196.339 y una (1) negativa por valor de -$802, del año 2024 (6) entre el 03/01/2024 al 12/11/2024 por valor de $20.359.992, del año 2025 (8) entre el 24/02/2025 al 22/12/2025 por valor de $37.088.044.93 y una (1) con valor negativo por -$544.000.NOTA DEBITO NO CONTABILIZA con fecha 30/12/2025 por valor de -$3.036.799.
23	BANCO DE BOGOTA	616864377	344,463,227.60	344,461,227.60	40,000	42,000	Consignaciones no acreditadas (1) por valor de $-$42.000 con fecha 30/05/2025 y Ingreso de renta no registrada en Bancos con fecha 25/05/2024 por valor de $40.000

24	BANCO DE BOGOTA	616879870	713,075,827.86	714,617,373.52	1,555,646	14,100	Consignaciones no acreditadas: del año 2021 (6) entre el 07/12/2021 y el 31/12/2021 por valor de $291.319, del año 2022 (2) entre el 03/01/2022 al 04/10/2022 por valor de $7.420, del año 2023 (1) con fecha 22/11/2023 por valor de $148.000, del año 2024 (9) entre el 09/01/2024 al 30/12/2024 por valor de $355.478 y un valor negativo por -$14.100 con fecha 30/12/2024, del año 2025 (18) entre el 03/03/2025 y el 14/11/2025 por valor de $753.428.66
25	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	720001775	240,258,881.20	240,259,239.00	358	-	Consignaciones no acreditadas: (1) con fecha 06/12/2023 por valor de $0.09, del año 2024 (2) con fechas 29/05/2024 por valor de $358.71, se debe depurar
26	BANCO OCCIDENTE	390860997	366,885,894.67	474,050,932.67		107,165,035	Consignaciones no acreditadas (3) del año 2023 entre el 07/07/2023 al 22/09/2023 por valor de $605.443, del año 2024 (6) entre el 12/02/2024 al 21/11/2024 por valor de $6.137.341, del año 2025 (67) entre el 20/03/2025 al 30/12/2025 por valor de $100.422.254.
27	BANCO OCCIDENTE	390852374	7.59	-	-	7.59	Nota debito no contabilizada por -$7.59 con fecha 11/04/2024 se debe depurar
28	BANCO OCCIDENTE	390860724	962.71	962.71	-	-	Saldos pequeños que se deben depurar. (Intereses en Extracto)
29	BANCO OCCIDENTE	39083324-2	47,292,242,339.56	47,309,119,744.65	647,649.09	173,500	Consignaciones no acreditadas (2) del año 2023 entre 31/03/2023 y el 28/11/2023 por valor de $69.684, del año 2024 (5) entre el 20/08/2024 al 28/10/2024 por valor de $559.345 una negativa por valor de -$173.500 con fecha 02/09/2024, del año 2025 (3) entre el 11/04/2025 al 19/12/2025 por valor de $18.620. Notas debito no contabilizadas (1) con fecha 17/12/2025 por valor de $16.403.256.
30	BANCO OCCIDENTE	39004635-7	5,157,289,216.18	5,170,269,696.27	22,352,486	9,372,006	Transferencias (ACH) del año 2025 con fecha 22/10/2025 al 31/10/2025 por valor de $9.292.645, Consignaciones no acreditadas (4) del año 2024 entre el 31/07/2024 al 10/12/2024 por valor de $9.739.150.47, del año 2025 (4) entre 21/08/2025 al 26/11/2025 por valor de $3.320.691.62. Notas debito no contabilizadas (3) del año 2025 entre el 26/09/2025 al 23/12/2025 por valor de -$9.372.006.
31	BANCO OCCIDENTE	39004726-4	340,659,165.51	355,623,559.51	27,613,463	12,649,069	Transferencias (ACH) (1) con fecha 31/12/2021 por valor de $151.100, Consignaciones no acreditadas del año 2023 (3) entre 28/03/2023 al 15/12/2023 por valor $499.841, del año 2025 (5) entre el 07/03/2025 al 26/12/2025 por valor de $26.962.522, Nota debito no contabilizada (1) con fecha 26/05/2021 por valor de -$12.649.069.
32	BANCO OCCIDENTE	39004855-1	178,823,874.30	178,829,662.30	5,788	-	Consignación no acreditada: (1) con fecha 26/09/2025 por valor de $5.788.
33	BANCO OCCIDENTE	390-85024-6	75,132,886.54	109,694,986.54	34,562,100	-	Consignaciones no acreditadas (4) del año 2024 entre 12/02/2024 y el 30/12/2024 por valor de $33.324.039, del año 2025 (1) con fecha 22/12/2025 por valor de $1.238.061.
34	BANCO OCCIDENTE	390-85073-3	4,471,529,977.42	4,815,912,017.42	344,382,040	-	Consignación no acreditada (1) con fecha 31/12/2025 por valor de $344.382.040.
35	BANCO OCCIDENTE	39085216-8	1,816,372,162.70	1,891,752,049.68	943,150,650	867,770,763	Transferencia (ACH) (1) con fecha 19/12/2023 por valor de $16.076.972.98, Consignaciones no acreditadas (1) del año 2024, por valor de -$254.000, del año 2023 (1) con fecha 28/12/2023 por valor de -$26.281.158, del año 2024 (7) entre 28/06/2024 al 30/09/2024 por valor de -$8.838.088, notas crédito no contabilizadas del año 2023(4) entre el 28/02/2023 al 30/09/2023 por valor $31.577.913 un valor negativo (1) con fecha 31/07/2023 por valor de -$6.551.209, del año 2024 (11) entre el 31/01/2024 y el 31/12/2024 por valor de $249.692.597, un valor negativo (1) con fecha 31/12/2024 por valor de -$6.133.400. del año 2025 entre 31/01/2025 al 31/12/2025 (9) por valor de $645.803.167, cuatro (4) valores negativos con fechas entre 28/02/2025 al 30/11/2025 por valor de -$819.712.908
36	BANCO OCCIDENTE	390865426	1,640,737,933.01	1,637,060,877.59	-	3,677,055	Consignaciones no acreditadas: (1) del año 2025 con fecha 29-08-2025 por valor -$3.677.055.42,
37	BANCO OCCIDENTE	390860666	10,563,845,740.87	10,580,762,788.02	16,917,047	-	Consignaciones no acreditadas: (4) con fechas 24/12/2025 por valor de $16.917.047.15
38	BANCO OCCIDENTE	39005437-7	6,671,245,127.01	6,670,865,574.18	64	379,616	Consignaciones no acreditadas (2) con fechas 23/12/2021 por $63.50 y con fecha 28/02/2022 por $0.02 y una (1) negativa -$379.616.35 con fecha 31/12/2023,
39	BANCO PICHINCHA SA	410509374	243,712,202.76	243,744,235.56	32,033	-	Consignaciones no acreditadas (2) con fechas 18/09/2025 por valor de $32.032.80
40	BANCO POPULAR	110-250-03134-1	144,006,241.22	179,139,624.90	35,133,384	-	Consignaciones no acreditadas: año 2023 (11) entre el 18/05/2023 al 27/11/2023 por valor de $7.261.219, del año 2024 (14) entre el 01/03/2024 al 19/11/2024 por valor de $4.334.586, año 2025 (19) entre 21/01/2025 al 19/12/2025 por valor de $20.534.214.
41	BANCO POPULAR	220-250-18963-6	2,776,074,651.76	3,071,479,213.77	295,404,562	-	Consignaciones no acreditadas: año 2025 (3) entre el 27/06/2025 al 28/08/2025 por valor de $295.404.562.01.
42	BANCO POPULAR	500-80624884-6	137,966,307.06	137,982,778.02	16,471	-	Consignaciones no acreditadas: (4) de 2025 entre 12/02/2025 al 19/03/2025 por valor de $16.470.96

43	BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.	291-01540-2	315,866,696.71	374,950,551.76	59,083,855	-	Consignaciones no acreditadas: año 2023 (1) con fecha 18/05/2023 por valor de $904. del año 2025 (11) entre el 16/12/2025 y el 29/12/2025 por valor de $59.082.951
44	BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.	291-01820-8	2,006,085,852.20	2,016,385,275.97	35,411,505	25,112,081	Transferencia (ACH) del año 2024 (1) con fecha 01/10/2024 por $24.999.577.47, Consignaciones no acreditadas del año 2022 (1) con fecha 19/12/2022 por valor de $6.029.97, del año 2023 (1) con fecha 21/07/2023, por valor de $1.340.007, del año 2024 (1) con fecha 29/02/2024 por valor de $2.120.135.08, del año 2025 (18) entre el 10/07/2025 al 30/12/2025 por valor de $7.844.855 y un (1) negativo con fecha 29/12/2025 por valor de -$112.503. Notas debito no contabilizadas (2) con fechas 30/07/2024 al 01/10/2024, por valor de -$24.999.577.81
45	BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.	291-21229-8	335,813.39	337,556.42	1,743	-	Cheques sin cobrar con fechas 09/01/2020 por $876.13 y con fecha 20/07/2020 por valor de $866.90
46	BANCOLOMBIA	25800013154	3,035,230,780.78	3,059,544,213.77	2,431,343,299	628.043.00	20.516 Consignaciones no acreditadas: año 2020 (2) entre el 12/07/2020 al 12/09/2020 por valor de $20.516, año 2021 (5) entre el 12/04/2021 al 17/12/2021 por valor de $210.864, del año 2022 (1) con fecha 16/02/2022 por valor de $48.714, del año 2023 (18) entre el 23/01/2023 al 27/12/2023 por la suma de $8.912.585, (2) negativas con fechas 21/09/2023 y 27/10/2023 por los valores de -$23.227 y -$2.700, del año 2024 (29) entre el 02/01/2024 al 22/11/2024 por valor de $11.027.976.55, del año 2025 entre fechas del 25/03/2025 al 24/12/2025 por valor de $15.441.465.46
47	BANCOLOMBIA	258000003-88	407,234,517.00	821,448,659.46	41,414,142	-	Consignaciones no acreditadas: año 2023 (4) entre el 2/03/2023 al 20/10/2023 por valor de $66.298.810, del año 2024 (2) del 03/01/2024 por valor de $312.160.780, año 2025 (2) entre 22/01/2025 al 7/11/2025 por valor de $ 35.804.553.
48	BANCOLOMBIA	258000027-07	809,238,600.69	809,697,784.69	459,184	-	Consignaciones no acreditadas: año 2024 (1) con fecha de 21/03/2024 por valor de $459.184.
49	BANCOLOMBIA	258000032-85	9,528,255,735.66	9,529,464,979.48	120,924,382	-	Notas crédito no contabilizadas (1) con fecha 31/12/2025 por valor de $1.209.243.82
50	BANCOLOMBIA	25873128588	46,114,400.00	46,409,400.00	295,000	-	Consignaciones no acreditadas: del año 2023 (2) con fechas entre 27/03/2023 y el 28/08/2023, por valor de $295. 000.
51	BANCOLOMBIA	25836209070	8,769,088,149.95	8,771,382,156.59	2,294,007	-	Consignaciones no acreditadas (2) del año 2019 con fechas entre 18/03/2019 y el 30/07/2019, por valor de $221.863, del año 2021 (1) con fecha 01/11/2021 por valor de $2.00, del año 2023 (2) consignaciones con fechas 24/01/2023 y el 30/085/2023, por valor de $2.072.142
52	BANCOLOMBIA	258-826066-62	264,439,571.26	266,111,063.26	1,671,492	-	Consignación no acreditada (1) con fecha 25/05/2024 por valor de $1.671.492.
53	BANCOLOMBIA	25890676149	1,442,224,325.52	1,443,963,596.90	1,765,493	26,222	Consignaciones no acreditadas: año 2015 (5) entre el 17/03/2015 y e 20/04/2015, por valor de $588.262, del año 2016 (3) con fechas entre el 11/11/2016 y el 16/12/2016, por valor de $24.557, del año 2017 (5) con fechas entre 03/02/2017 al 21/12/2017, por valor de $82.218 y (2) negativos con fechas 14/08/2017 y 15/12/2017 por valor de -$26.222, del año 2018 (6) con fechas entre 31/01/2018 y el 30/11/2028 por valor de $323.385.97, del año 2019 (1) con fecha 15/02/2019 por valor de $28.399.01, del año 2021 (1) con fecha 20/12/2021 por valor de $718.671.
54	BANSUPERIOR	150573441-1	1,106,318,982.77	1,106,318,979.77	3	-	Nota debito no contabilizada por -$3.00 con fecha 10/03/2022 se debe depurar
55	BBVA	914000200348396	1,557,915,980.36	1,556,312,254.36	5,806,773,991	58,080,494,717	Transferencias (ACH) (23) del año 2024 con fecha 21/02/2024 al 20/18/2024 por valor de $5.801.681.391, Notas crédito no contabilizadas: (1) del año 2023 con fecha 13/10/2023 por valor de -$47.521. del año 2024 (4) con fechas 26/03/2024 y el 22/05/2024, por valor de $5.089.600 y una (1) negativa con fecha 26/07/2024 por valor de -$154.149.885, Notas debito no contabilizadas: (1) con fecha 26/12/2022 por valor de -$100.00, del año 2023 (1) con fecha 15/08/2023 por valor de -$11.400, del año 2024 (18) negativas con fechas 21/02/2024 al 01/11/2024 por valor de -$5.654.257.557, del año 2025 (1) con fecha 31/10/2025 por valor de -$25.254
56	BBVA	914510200344791	24,279,419,611.36	24,397,937,288.38	121,589,689	3,072,012	Transferencia (ACH) año 2024 (1) con fecha 09/03/2024 por valor de $234.477. Consignaciones no acreditadas: del año 2020 (2) con fechas entre el 09/03/2020 al 11/11/2020 por valor de $801.798, del año 2022 (5) con fechas entre el 10/03/2022 al 30/10/2020 por valor de $6.055.887, del año 2023 (11) con fechas 10/01/2023 al 30/11/2023 por valor de $11.386.523, una (1) negativa con fecha 22/08/2023 por valor de -$1.329.668, del año 2024 (21) con fechas entre el 22/03/2024 y el 16/12/2024 por valor de $9.285.008, del año 2025 (21) entre el 16/01/2025 al 30/12/2025, por valor de $93.825.996. Nota debito no contabilizada (2) con fechas 08/05/2022 y 08/09/2022 por valor de -$1.742.344.

57	BBVA	914570200344841	18,593,262,844.27	18,590,119,739.27	7,988,691	11,131,796	Transferencias (ACH) dos (2) con fechas 26/02/2024 por valor de $747.610. Consignaciones no acreditadas: del año 2021 (1) con fecha 27/12/2021 por valor de $53.081 y del año 2025 (2) con fechas 07/11/2025 y 11/11/2025 por valor de $7.188.000. Notas debito no contabilizadas del año 2024 (10) por valor de -$3.944.467, del año 2025 (2) con fecas del 06/11/2025 y 21/11/2025 por valor de -$7.187.329
58	BBVA	914590200344833	2,033,007,707.92	2,033,170,028.92	162,321	-	Consignación no acreditada (1) con fecha 04/12/2025 por valor de $162.321
59	BBVA	914140454	26,715,229,446.07	26,716,580,934.35	1,351,488	-	Consignaciones no acreditadas del año 2022 (1) con fecha 23/02/2022 por valor de $2.831.67, del año 2023 (5) entre el 14/04/2023 y el 24/11/2023 por valor de $97.339, del año 2024 (4) con fechas entre el 23/02/2024 y el 12/12/2024 por valor de $136.889, del año 2025 (2) con fecha 30/05/2025 y el 19/12/2025 por valor de $1.114.428.
60	BBVA	914031224	316,629,883.63	316,843,683.63	213,800	-	Consignación no acreditada (1) con fecha 21/03/2020 por $213.800.
61	BBVA	914454426	808,869,177.00	851,062,690.00	52,791,650	10,598,137	Consignación no acreditada del año 2023 (1) con fecha 20/12/2023 por valor de $2.000, del año notas crédito no contabilizadas del año 2024 (10) entre el 30/01/2024 y el 31/12/2024, por valor de $15.595.859, del año 2025 (10) entre 31/01/2025 y el 30/12/2025 por valor de $37.193.787, una negativa (1) con fecha 30/11/2025 por valor de -$9.122.100. Notas debito no contabilizadas del año 2025 (7) con fechas 02/09/2025 al 28/10/2025 por valor de -$1.476.037.
62	COLPATRIA RED MULTIBANCA	7302069802	20,214,269,612.40	22,202,840,609.66	2,013,071,952	24,500,955	Transferencias (ACH) del año 2025 (5) entre el 10/12/2025 y el 30/12/2025, por valor de $6.026.824, Consignaciones no acreditadas año 2005 (1) con fecha 30/12/2005 por valor de $11.869.970, del año 2021 (7) con fechas entre el 02/12/2021 y el 24/12/2021 por valor de $1.316.787, del año 2022 (26) entre el 13/01/2022 y el 22/12/2022 por valor de $103.006.959, del año 2023 (58) entre el 12/01/2023 y el 26/12/2023, por valor de $334.706.776, del año 2024 (67) entre el 04/01/2024 y el 30/12/2024 por valor de $152.433.517.47, negativas (4) entre el 19/09/2024 al 30/12/2024 por valor -$19.577.960, del año 2025 (108) entre el 03/01/2025 al 30/12/2025 por valor de $1.583.319.909.25 uno (1) negativo con fecha 29/12/2025 por valor de -$755.170. Nota debito no contabilizada con fecha 18/12/2025 por valor de -$4.167.825.
63	DAVIVIENDA	176069996195	622,598,859.75	622,618,792.75	19,930	-	Consignaciones no acreditadas (1) con fecha 09/07/2025 por valor de $19.930.
64	DAVIVIENDA	17620001814-9	708,869,226.10	710,992,662.10	2,556,756	433,340	Consignaciones no acreditadas del año 2024 (1) con fecha 19/11/2024 por -$433.340 y del año 2025 (3) entre el 10/04/2025 y el 15/07/2025 por valor de $2.556.756
65	DAVIVIENDA	176069997441	4,034,113,297.04	4,034,586,497.04	473,200	-	Consignaciones no acreditadas del año 2023 (2) con fechas 26/06/2023 al 29/12/2023 por valor de $336.400, del año 2024 (1) con fecha 28/03/2024 por valor de $76.900, del año 2025 (1) con fecha 06/08/2025 por valor de $59.900
66	DAVIVIENDA	176000692523	1,333,436,973.84	1,333,644,948.84	207,975	-	Consignaciones no acreditadas del año 2025 (3) con fechas 31/03/2025 al 30/12/2025 por valor de $207.975
67	DAVIVIENDA	176000692531	1,830,108,863.01	1,977,442,300.01	150,845,437	3,512,000	Consignaciones no acreditadas del año 2024 (1) con fecha 28/06/2024 por -$3.512.000, del año 2025 (12) con fechas entre 04/12/2025 y el 30/12/2025 por valor de $1.230.845.437
68	DAVIVIENDA	176000692549	421,789,092.14	422,656,592.14	867,500	-	Consignaciones no acreditadas (8) del año 2025 con fechas entre el 12/03/2025 y el 20/12/2025, por valor de $867.500.
69	DAVIVIENDA	176000692556	2,663,120,454.64	2,677,975,854.64	14,855,400	-	Consignaciones no acreditadas (5) del año 2025 entre el 13/03/2025 al 30/12/2025 por valor de $14.855.400
70	DAVIVIENDA	176000692564	772,471,428.37	772,471,928.37	500	-	Consignación no acreditada del año 2024 con fecha 24/05/2024 por valor de $500.
71	DAVIVIENDA	176000695195	12,802,441,698.87	12,802,443,198.87	1,500	-	Consignación no acreditada (1) con fecha 24/05/2024 por valor de $1.500.
72	DAVIVIENDA	176000698850	14,374,526,068.56	14,553,338,462.31	209,074,948	30,262,554	Consignaciones no acreditadas del año 2024entre el 28/06/2024 y el 31/10/2024 por valor -$1.088.010, notas crédito no contabilizadas (1) del año 2023 con fecha 31/08/2023 por valor de -$1.768.000, del año 2024 (5) entre el 30/06/2024 y el 30/11/2024 por valor de $12.811.797, del año 2025 (7) negativas entre el 31/01/2025 ye l 30/12/2025 por valor de -$27.004.844, con (5) entre 31/01/2025 y el 31/12/2025 por valor de $196.253.151. Nota debito no contabilizadas del año 2024 (2) negativas entre el 22/02/2024 y el 18/04/2024 por valor de -$401.700.
73	DAVIVIENDA	176069994687	2,741,820,026.90	2,738,453,994.90	1,696,296	5,062,328	Consignaciones no acreditadas (2) del año 2024 con fechas 08/08/2024 y el 11/12/2024 por valor de $1.696.296. Nota debito no contabilizada con fecha 23/12/2025 por valor de -$5.062.328.

74	DAVIVIENDA	17606999743-3	807,359,565.60	830,939,955.60	23,831,590	251,200	Consignaciones no acreditadas del año 2021 (2) entre el 19/04/2021 y el 30/06/2021 por valor de $247.010 del año 2022 (1) con fecha 31/05/2022 por valor de -$113.300, del año 2023 (1) con fecha 30/11/2023 por valor de $13.547.100, del año 2024 (2) con fechas 31/03/2024 y 21/05/2021 por valor de $6.298.600, del año 2025 (2) con fechas 30/06/2025 y 31/12/2025 por valor de $1.331.200, notas crédito no contabilizadas del año 2024 (2) con fechas 28/02/2024 y 19/02024 por valor de $322.800, del año 2025 (10) con fechas entre el 12/03/2025 y el 13/11/2025 por valor de $2.084.880, notas debito no contabilizadas del año 2020 (1) con fecha 05/05/2020 por valor de -$11.000, del año 2025 (1) con fecha 07/04/2025 por valor de -$126.900
75	DAVIVIENDA	17606999939-7	3,633,260,436.37	3,790,228,164.01	173,370,984	16,403,256	Cheque sin cobra con fecha 08/10/2021 por valor de $199.440, consignaciones no acreditadas del año 2024 (3) con fechas entre el 23/07/2024 al 26/09/2024 por valor de $350.236, del año 2025 (2) entre el 25/09/2025 y el 22/12/2025 por valor de $172.821.308, notas crédito no contabilizadas del año 2025 (1) con fecha 07/12/2025 por valor de -$16.403.256.
76	DAVIVIENDA	176000683530	12,517.85	111,193.85	98,676	-	Consignaciones no acreditadas (2) del año 2024 (1) con fecha 23/05/2024, por valor de $20.000, del año 2025 (1) con fecha 14/05/2025, por valor de $78.676.
77	DAVIVIENDA	176069997425	934,540,141.31	1,020,329,514.55	85,789,373	-	Consignaciones no acreditadas del año 2023(2) entre el 28/08/2023 y el 23/11/2023 por valor de $4.773, del año 2024 (9) con fechas entre el 30/04/2024 y el 11/12/2024, por valor de $7.076.815, del año 2025 (14) entre el 31/03/2025 y el 30/12/2025 por valor de $78.698.785.
78	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ	1001025295	727,820,682.67	887,864,852.59	160,044,169.92	-	Transferencia (ACH) (1) con fecha 26/11/2025 por valor de $160.044.169.56, nota debito no contabilizada (1) con fecha 28/08/2025 por valor de $0.36
79	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	52021039	-	-	-	9,563,826,758	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $9.563.826.757.92
80	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	52021040	-	-	-	10,142,468,543	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $10.142.468.542.58
81	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	52021043	-	-	-	529,867,113	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $529.867.113.04
82	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	112022061	-	-	-	1,821,375,725	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $1.821.375.725.35
83	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	42025120	-	-	-	1,025,737,393	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $1.025.737.392.53
84	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	72021048	-	-	-	1,383,781,586	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $1.383.781.585.98
85	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	72021050	-	-	-	102,601,673	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $102.601.673.41
86	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	72021051	-	-	-	1,094,569,849	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $1.094.569.849.48
87	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	72021052	-	-	-	1,524,571,882	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $1.524.571.882.37
88	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY	72021053	-	-	-	18,107,735,964	Según certificación de IDEBOY con fecha 20/01/2026 aparece un saldo de $18.107.735.963.57
	TOTAL		422,896,718,161.59	431,638,842,448.68	19,537,766,074	106,527,281,877	

Fuente: Plataforma SIA MISIONAL y documentos SECRETARIA DE HACIENDA – GOBERNACIÒN DE BOYACÀ

Las siguientes cuentas bancarias tienen saldos pequeños o en cero, por lo tanto, es necesario revisar si estas no se están utilizando y/o se constituyeron para el manejo de los recursos de un convenio o algo similar, en donde los recursos deben ser devueltos, tal como se establece en la siguiente tabla.

Tabla 24 SUBCUENTA 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS POR DEPURAR

ENTIDAD FINANCIERA	(C) No. De Cuenta	(D) Saldo A 31 De diciembre Según Libros	(D) Saldo A 31 De diciembre Según Extractos Bancarios	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1503301188-7	-	-	-	se debe depurar
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	315030006177	-	-	-	se debe depurar
BANCO CAJA SOCIAL	105000582-8	-	-	-	se debe depurar
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	720003078	-	-	-	se debe depurar
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	972-00030230	-	-	-	se debe depurar

BANCO OCCIDENTE	390865665	-	-	-	se debe depurar
BANCO OCCIDENTE	390865699	-	-	-	se debe depurar
BANCO OCCIDENTE	390861136	-	-	-	se debe depurar
BANCO OCCIDENTE	390866903	-	-	-	se debe depurar
BANCO OCCIDENTE	390866796	-	-	-	para depurar
BANCO OCCIDENTE	392809901	-	-	-	para depurar
BANCO OCCIDENTE	392809992	-	-	-	para depurar
BANCO OCCIDENTE	392810008	-	-	-	para depurar
BANCO POPULAR	25006876-4	44,603.91	44,603.91	-	Para depurar
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.	291-17785-9	8,927.00	8,927.00	-	para depurar
BANCOLOMBIA	258-000008-64	-	-	-	solo aparece el extracto, falta conciliación, para depurar.
BANCOLOMBIA	258-000060-40	-	-	-	para depurar
BANCOLOMBIA	258-000060-41	-	-	-	para depurar
BANCOLOMBIA	258-937147-93	18,377.59	18,377.59	-	
BBVA	914031984	700.00	700.00	-	para depurar
BBVA	10436-9	15,932.00	15,932.00	-	
BBVA	9140100004767	-	-	-	para depurar
COLPATRIA RED MULTIBANCA	7301000712	1.00	1.00	-	para depurar
COLPATRIA RED MULTIBANCA	7302079026	-	-	-	para depurar
DAVIVIENDA	176069994695	-	-	-	para depurar
DAVIVIENDA	1762-0001921-2	-	-	-	para depurar
DAVIVIENDA	176070544232	-	-	-	para depurar
BANCAFE	37100128-0	-	-	-	para depurar
BANCAFE	371038613	-	-	-	para depurar

Fuente: Plataforma SIA MISIONAL y documentos SECRETARIA DE HACIENDA – GOBERNACIÓN DE BOYACÀ

CRITERIO: Incumplimiento a la Resolución 533 de 2015, aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso siendo necesario que se encuentren integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad.

También se presenta la Inobservancia de la Resolución 494 de 2017, en el artículo 14 de la Resolución 494 de 2017 expedida por la Contraloría General de Boyacá establece, que la información debe ser confiable teniendo en cuenta las variables de calidad, oportunidad y suficiencia para emitir el resultado en cuanto al fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal.

Adicionalmente las entidades territoriales deberán aplicar procedimientos transversales para evaluar el Control Interno Contable como lo indica la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, (CGN) "Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, **con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y**

garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel…".

CAUSA: Inefectividad de controles o no aplicación de los mismos para ejecutar el proceso financiero de una forma efectiva, ausencia de medidas tendientes a la verificación periódica del cumplimiento de las políticas contables adoptadas por la entidad, así como ineficacia del comité de sostenibilidad contable.

EFECTO: Información financiera con deficiencias e inobservancia de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, como autoridad reguladora de la contabilidad pública

Atendiendo lo expresado en la respuesta, estas no aclaran la inconsistencia por lo tanto queda en firme la observación de la cuenta 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, En la cuenta 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, estos datos fueron tomados de los documentos suministrados por la Entidad y que reposan en sus archivos, así las cosas, la observación se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 5**, para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 6 CUENTA 13 CUENTAS POR COBRAR CON INCONSISTENCIAS EN SOBRESTIMACIONES.

CONDICIÓN: En el análisis y revisión de los estados financieros junto con los soportes se puede evidenciar que en cuenta **13 CUENTAS POR COBRAR** y de acuerdo con la muestra analizada, en la cual la más representativa el impuesto, sanciones e intereses sobre vehículos automotores, los cuales presentan **SOBRESTIMACIONES** por valor de **$9.508.906.347**, tal como se observa a continuación.

Impuesto sobre Vehículos automotores: Una de las falencias reflejadas en el trámite del cobro de los impuestos, sanciones e intereses y seguimiento del mismo, se da por la falta de celeridad en el trámite de las diferentes etapas procesales ya que vienen desde el año 2010, o sea con más de 14 de años de antigüedad en estos procesos, razón por la cual se hace necesaria la depuración y toma decisiones en el Comité de Sostenibilidad Contable, toda vez que al grupo Auditor no allegaron documentación alguna que demuestre que hayan sido depuradas, no adjuntaron la conciliación de los saldos de impuesto de vehículos y sus respectivas sanciones e intereses corte a 31 de diciembre de 2025 a pesar de haber sido solicitada en varias oportunidades.

El valor total de los procesos en cobro coactivo a 31 de diciembre de 2025 es por $68.668.928.500 corresponde a los años 2010 a 2018 y el saldo a 31 de diciembre de 2024 es por valor de $51.142.713.900, la diferencia corresponde a un valor de $17.526.214.600, que corresponde a un incremento del 34.27%.

Por otra parte, el valor total de los procesos en cobro coactivo – fiscalización de los años 2019 a 2021, con un saldo a 31 de diciembre de 2025 es por $38.413.646.900 y el saldo a 31 de diciembre de 2024 es por valor de $26.637.768.100, la diferencia corresponde a un valor de $11.775.878.800, con una disminución del 44.21%.

Según soportes presentados por la Secretaria de Hacienda del Departamento y la División de Recaudos y Fiscalización, registros que fueron analizados y efectuada la trazabilidad, se pudo establecer que el saldo total que contiene el impuesto, sanción, intereses y descuento del 80% que le corresponde a la Gobernación del Departo está por valor total de $54.938.591.010 y el 20% que les corresponde a los municipios de los mismos ítems corresponde al valor total de $23.243.554.137, para un gran total de $78.182.145.147, que comparado con los soportes da como resultado una diferencia total por valor de $9.513.216.647 que corresponda a una sobrestimación, tal como se establece en la siguiente tabla.

Tabla 25 INFORME CONSOLIDADO DEL TOTAL DE LOS PROCESO EN COBRO COACTIVO Y LAS VIGENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN FISCALIZACIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Vigencia	Impuesto	Sanción	Intereses	Descuento	Total	Etapa proceso
2010	975,707,600	1,931,003,200	3,381,805,100	0	6,288,515,900	Cobro Coactivo
2011	1,070,670,700	2,145,554,500	3,476,537,700	4,310,300	6,688,452,600	Cobro Coactivo
2012	1,194,017,000	2,416,222,700	3,605,472,100	0	7,215,711,800	Cobro Coactivo
2013	1,322,584,000	2,651,142,500	3,677,485,900	0	7,651,212,400	Cobro Coactivo
2014	1,359,564,000	2,828,421,000	3,476,173,200	0	7,664,158,200	Cobro Coactivo
2015	1,344,736,000	3,096,222,100	3,137,705,600	0	7,578,663,700	Cobro Coactivo
2016	1,466,548,500	3,348,494,700	3,088,046,000	0	7,903,089,200	Cobro Coactivo
2017	1,780,146,000	3,752,189,400	3,374,154,000	0	8,906,489,400	Cobro Coactivo
2018	1,867,704,000	3,907,525,500	2,997,405,800	0	8,772,635,300	Cobro Coactivo
TOTALES	**12,381,677,800**	**26,076,775,600**	**30,214,785,400**	**4,310,300**	**68,668,928,500**	
Vigencia	**Impuesto**	**Sanción**	**Intereses**	**Descuento**	**Total**	**Etapa proceso**
2019	2,408,252,100	4,853,881,000	3,326,007,400	0	10,588,140,500	Fiscalización
2020	3,231,445,000	6,080,566,200	3,678,588,400	0	12,990,599,600	Fiscalización
2021	3,880,029,000	7,115,863,200	3,839,014,600	0	14,834,906,800	Fiscalización
TOTALES	**9,519,726,100**	**18,050,310,400**	**10,843,610,400**	**0**	**38,413,646,900**	
saldo según balance	**Impuesto**	**Sanción**	**Intereses**			
	9,905,342,210	**20,861,420,480**	**24,171,828,320**		**54,938,591,010**	
Saldo según soportes	**21,901,403,900**	**44,127,086,000**	**41,058,395,800**	**4,310,300**	**107,082,575,400**	
DIFERENCIAS	**11,996,061,690**	**23,265,665,520**	**16,886,567,480**	**4,310,300**	**52,143,984,390**	
Según balance 31/12/2025 - 80% DEPARTAMENTO	**9,905,342,210**	**20,861,420,480**	**24,171,828,320**		**54,938,591,010**	
Según balance 31/12/2025 - 20% MUNICIPIOS	**6,206,457,777**	**8,825,417,200**	**8,211,679,160**		**23,243,554,137**	

TOTAL	**16,111,799,987**	**29,686,837,680**	**32,383,507,480**		**78,182,145,147**	
Soportes	**12,381,677,800**	**26,076,775,600**	**30,214,785,400**	4,310,300	**68,668,928,500**	
Sobrestimación	**3,730,122,187**	**3,610,062,080**	**2,168,722,080**	**4,310,300**	**9,513,216,647**	

Fuente: División Recaudo y Fiscalización - Gobernación de Boyacá.

En *Impuesto, Sanciones e Intereses Vehículos Automotores* se estableció que en los estados financieros no se reflejan los saldos de los años 2022 a 2025, lo cual fue confrontado entre el saldo registrado contablemente versus el informe reportado por la División de Recaudo y Fiscalización, a pesar de haber solicitado dicha información.


La División de Recaudo y Fiscalización de la Gobernación de Boyacá debe depurar los procesos y/o cuentas que fueron establecidas en los años anteriores en las Actas de Comité de Saneamiento Contable, actuación que hasta el momento no ha sido efectiva.

Por otra parte, la base de datos de los vehículos de servicio particular registrados en las oficinas de Tránsito del Departamento debe ser actualizado en el software SISTAMBOY y con el sistema SIVER que maneja la base de impuesto de vehículos del Departamento de Boyacá, igualmente debe ser integrado con el Software PCTG que maneja la Gobernación de Boyacá, para que sea coherente entre todas las partes. La División de Recaudo y Fiscalización de la Gobernación en su informe de gestión no evidencia la actualización de los datos registrados en sus bases de datos.

Respecto otras subcuentas que conforman las CUENTAS POR COBRAR y de acuerdo a la base de datos registrado en la subdirección de cobro coactivo de la Gobernación de Boyacá, se pudo establecer que aparecen procesos desde el año 2009 a 2025, en un total de 548, de los cuales los más representativos son los del año 2016, con 92 procesos, seguido del año 2017 con 87, le sigue 2015 con 84, continua el año 2018 con 61, para el año 2024 con 55 procesos, para el año 2019 con 41, para el año 2025 con 32, para el año 2014 con 24, para el año 2021 con 23, para el año 2023 con 22, 12 procesos para el año 2022, 9 procesos para el año 2020, 4 parea el año 2013, uno para el año 2012 y uno para el año 2009, por un valor total de $2.242.195.538 por recuperar la Gobernación de Boyacá, razón por la cual es procedente efectuar la depuración.

Teniendo en cuenta la siguiente muestra establecida por el grupo auditor, se pudo establecer que varias de ellas ya fueron contempladas en el Comité Técnico de Contabilidad, en el Acta No. 002 de 2019 con fecha de reunión 30 de enero de 2019, sin presentarse nuevas actuaciones por parte de dicho Comité.

Ilustración 18

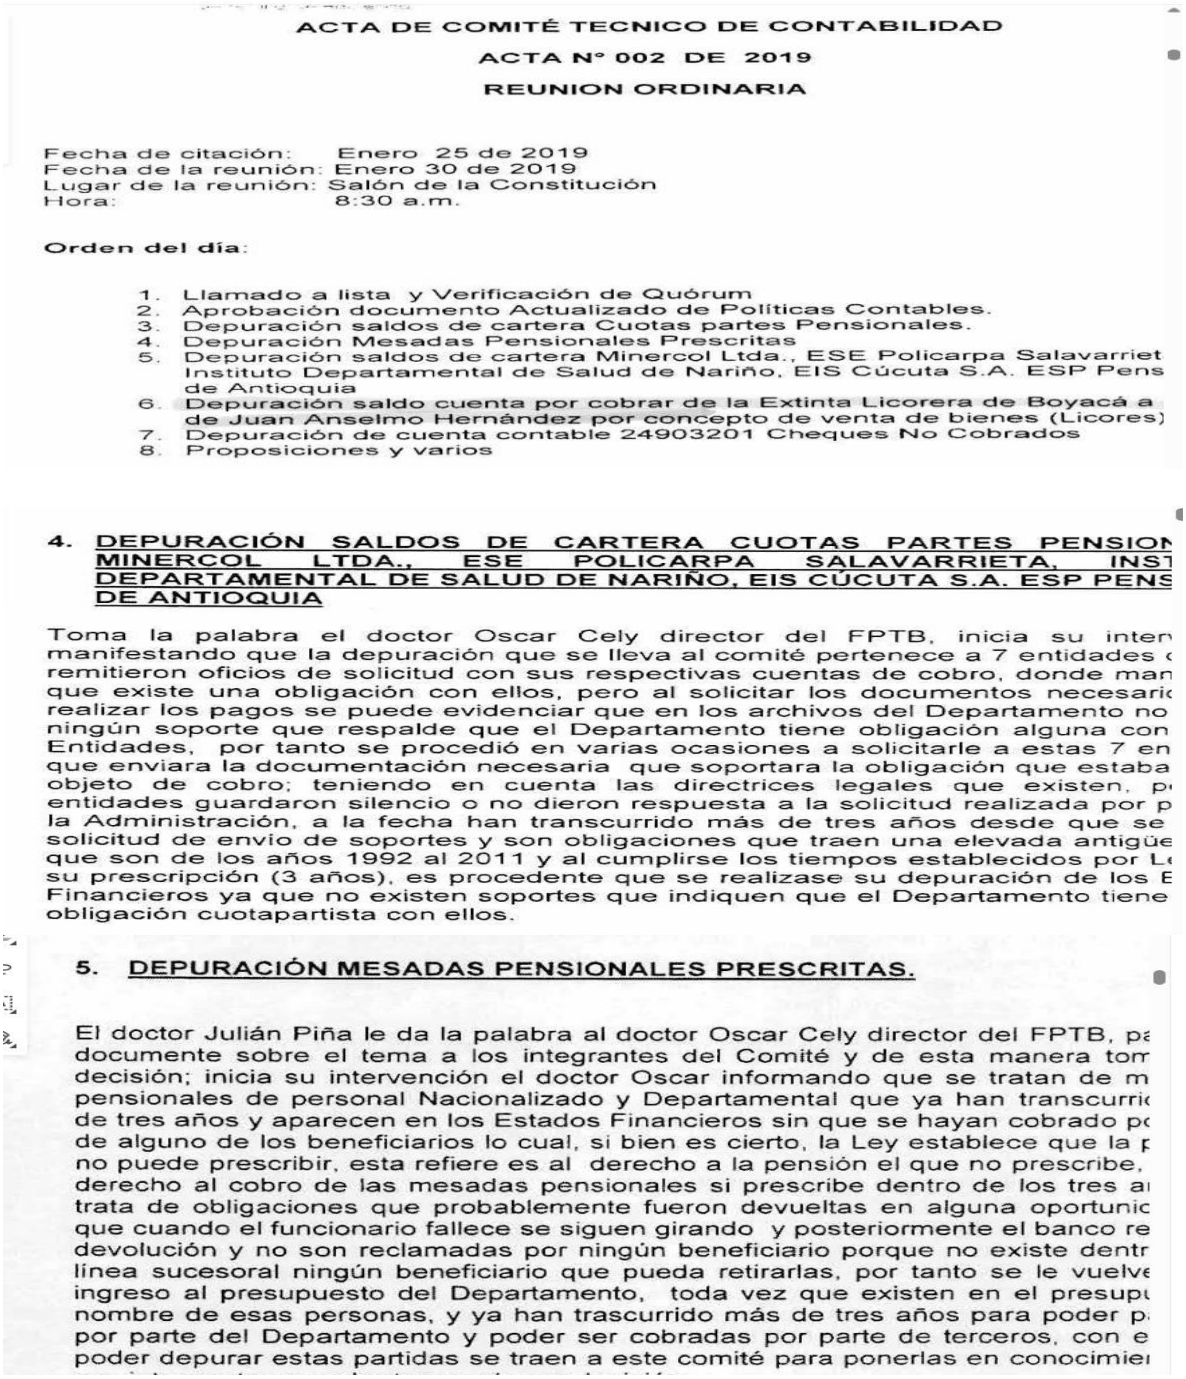

ACTA DE COMITÉ TECNICO DE CONTABILIDAD

ACTA N° 002 DE 2019

REUNION ORDINARIA

Fecha de citación: Enero 25 de 2019
Fecha de la reunión: Enero 30 de 2019
Lugar de la reunión: Salón de la Constitución
Hora: 8:30 a.m.

Orden del día:


1. Llamado a lista y Verificación de Quórum
2. Aprobación documento Actualizado de Políticas Contables.
3. Depuración saldos de cartera Cuotas partes Pensionales.
4. Depuración Mesadas Pensionales Prescritas
5. Depuración saldos de cartera Minercol Ltda., ESE Policarpa Salavarriet Instituto Departamental de Salud de Nariño, EIS Cúcuta S.A. ESP Pens de Antioquia
6. Depuración saldo cuenta por cobrar de la Extinta Licorera de Boyacá a de Juan Anselmo Hernández por concepto de venta de bienes (Licores)
7. Depuración de cuenta contable 24903201 Cheques No Cobrados
8. Proposiciones y varios

4. DEPURACIÓN SALDOS DE CARTERA CUOTAS PARTES PENSION MINERCOL LTDA., ESE POLICARPA SALAVARRIETA, INST DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, EIS CÚCUTA S.A. ESP PENS DE ANTIOQUIA

Toma la palabra el doctor Oscar Cely director del FPTB, inicia su inter manifestando que la depuración que se lleva al comité pertenece a 7 entidades remitieron oficios de solicitud con sus respectivas cuentas de cobro, donde man que existe una obligación con ellos, pero al solicitar los documentos necesari realizar los pagos se puede evidenciar que en los archivos del Departamento no ningún soporte que respalde que el Departamento tiene obligación alguna con Entidades, por tanto se procedió en varias ocasiones a solicitarle a estas 7 en que enviara la documentación necesaria que soportara la obligación que estaba objeto de cobro; teniendo en cuenta las directrices legales que existen, p entidades guardaron silencio o no dieron respuesta a la solicitud realizada por p la Administración, a la fecha han transcurrido más de tres años desde que se solicitud de envio de soportes y son obligaciones que traen una elevada antigüe que son de los años 1992 al 2011 y al cumplirse los tiempos establecidos por L su prescripción (3 años), es procedente que se realizase su depuración de los E Financieros ya que no existen soportes que indiquen que el Departamento tiene obligación cuotapartista con ellos.

5. DEPURACIÓN MESADAS PENSIONALES PRESCRITAS.

El doctor Julián Piña le da la palabra al doctor Oscar Cely director del FPTB, pa documente sobre el tema a los integrantes del Comité y de esta manera tom decisión; inicia su intervención el doctor Oscar informando que se tratan de m pensionales de personal Nacionalizado y Departamental que ya han transcurri de tres años y aparecen en los Estados Financieros sin que se hayan cobrado p de alguno de los beneficiarios lo cual, si bien es cierto, la Ley establece que la p no puede prescribir, esta refiere es al derecho a la pensión el que no prescribe, derecho al cobro de las mesadas pensionales si prescribe dentro de los tres a trata de obligaciones que probablemente fueron devueltas en alguna oportunic que cuando el funcionario fallece se siguen girando y posteriormente el banco re devolución y no son reclamadas por ningún beneficiario porque no existe dentr línea sucesoral ningún beneficiario que pueda retirarlas, por tanto se le vuelve ingreso al presupuesto del Departamento, toda vez que existen en el presup nombre de esas personas, y ya han trascurrido más de tres años para poder p por parte del Departamento y poder ser cobradas por parte de terceros, con e poder depurar estas partidas se traen a este comité para ponerlas en conocimie

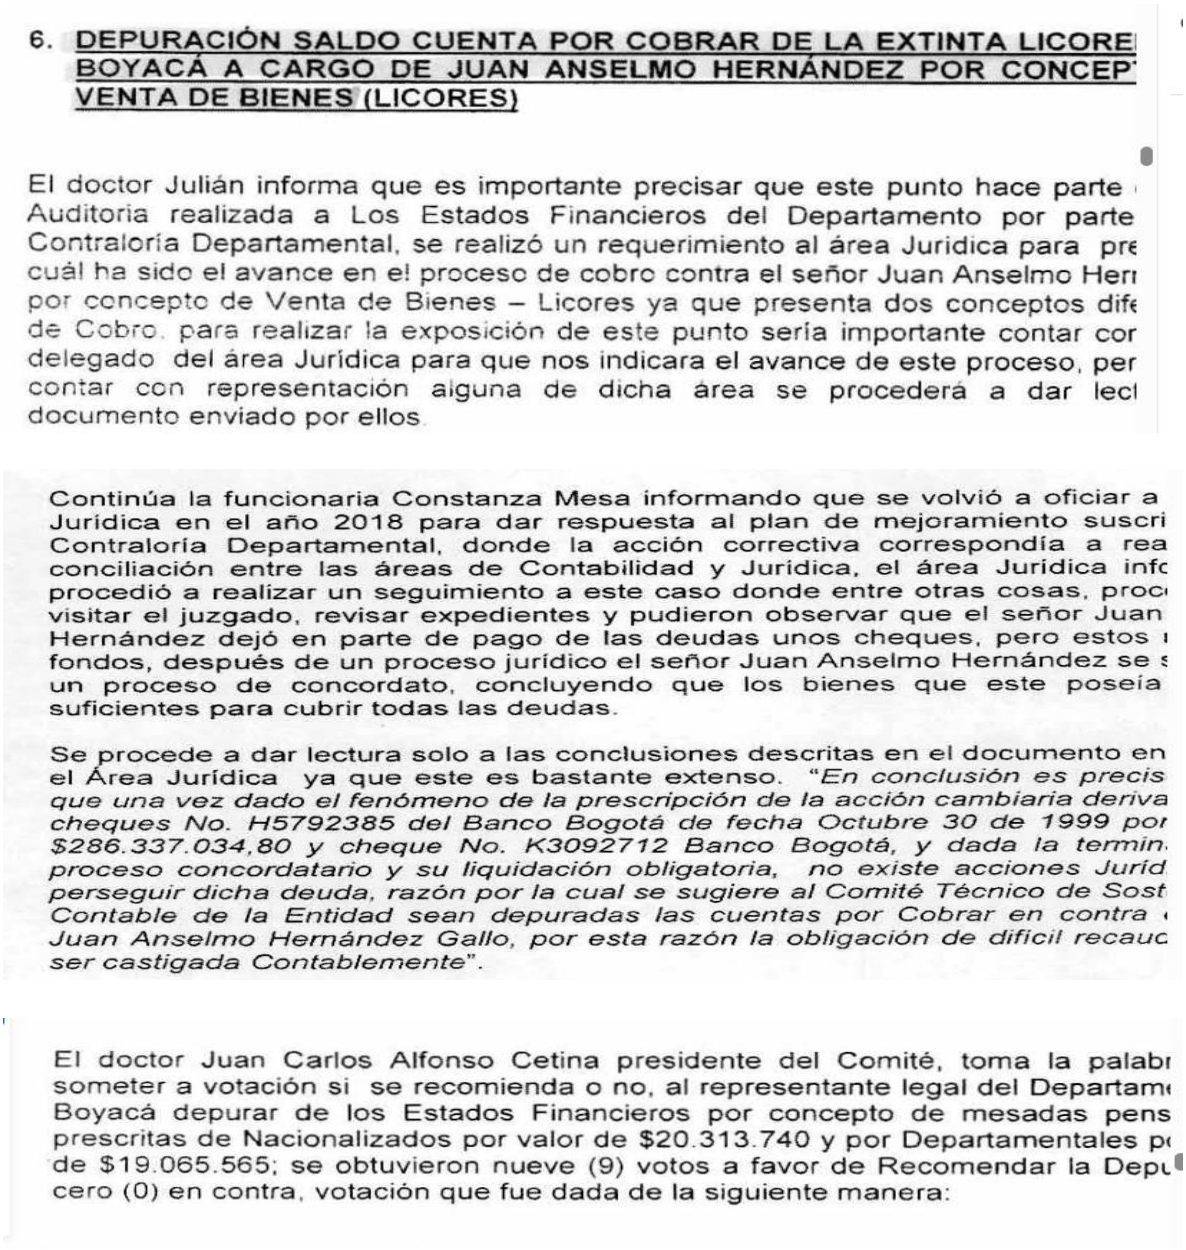

6. DEPURACIÓN SALDO CUENTA POR COBRAR DE LA EXTINTA LICORE BOYACÁ A CARGO DE JUAN ANSELMO HERNÁNDEZ POR CONCEP VENTA DE BIENES (LICORES)

El doctor Julián informa que es importante precisar que este punto hace parte Auditoria realizada a Los Estados Financieros del Departamento por parte Contraloría Departamental, se realizó un requerimiento al área Juridica para pre cuál ha sido el avance en el proceso de cobro contra el señor Juan Anselmo Herr por concepto de Venta de Bienes – Licores ya que presenta dos conceptos dife de Cobro, para realizar la exposición de este punto sería importante contar cor delegado del área Jurídica para que nos indicara el avance de este proceso, per contar con representación alguna de dicha área se procederá a dar lecl documento enviado por ellos.

Continúa la funcionaria Constanza Mesa informando que se volvió a oficiar a Jurídica en el año 2018 para dar respuesta al plan de mejoramiento suscri Contraloría Departamental, donde la acción correctiva correspondía a rea conciliación entre las áreas de Contabilidad y Jurídica, el área Jurídica infc procedió a realizar un seguimiento a este caso donde entre otras cosas, proc visitar el juzgado, revisar expedientes y pudieron observar que el señor Juan Hernández dejó en parte de pago de las deudas unos cheques, pero estos fondos, después de un proceso jurídico el señor Juan Anselmo Hernández se un proceso de concordato, concluyendo que los bienes que este poseía suficientes para cubrir todas las deudas.

Se procede a dar lectura solo a las conclusiones descritas en el documento en el Área Jurídica ya que este es bastante extenso. *"En conclusión es precis que una vez dado el fenómeno de la prescripción de la acción cambiaria deriva cheques No. H5792385 del Banco Bogotá de fecha Octubre 30 de 1999 por $286.337.034,80 y cheque No. K3092712 Banco Bogotá, y dada la termin proceso concordatario y su liquidación obligatoria, no existe acciones Jurid perseguir dicha deuda, razón por la cual se sugiere al Comité Técnico de Sost Contable de la Entidad sean depuradas las cuentas por Cobrar en contra Juan Anselmo Hernández Gallo, por esta razón la obligación de difícil recauc ser castigada Contablemente"*.

El doctor Juan Carlos Alfonso Cetina presidente del Comité, toma la palabr someter a votación si se recomienda o no, al representante legal del Departam Boyacá depurar de los Estados Financieros por concepto de mesadas pens prescritas de Nacionalizados por valor de $20.313.740 y por Departamentales p de $19.065.565; se obtuvieron nueve (9) votos a favor de Recomendar la Depu cero (0) en contra, votación que fue dada de la siguiente manera:

Por lo expuesto anteriormente, se pudo establecer que las decisiones tomadas en El Comité de Técnico de Contabilidad, en el cual sus productos son las Actas de cada una de las vigencias y a las cuales no se les hace seguimiento, puesto que en los informes financieros siguen apareciendo las determinaciones señalas allí, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla.

Tabla 26 CUENTA 13 SUBCUENTAS AÑOS ANTERIORES

CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Descripción	**Saldo**
Imp/lot/foráneas/reg/subsidiado	**44,862,941.00**
Impuesto sobre Vehículos Automotores/Sec/Central Vigencias Anteriores	**9,905,342,210.00**
Reintegros Vigencias Anteriores SPGR	**4,029,566,148.97**
SGP participación agua potable Fonpet-MUNICIPIO DE CHIVOR	**5,071,907,439.00**
Otras Transferencias/ Programas Nacionales-ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**9,440,404,936.00**
Cuotas Partes Pensionales - Persuasivo -MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	**14,178,616,670.60**
Cuotas Partes Pensionales - Coactivo-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	**15,049,544,985.19**
Intereses de mora - Coactivo / FPTB	**3,397,820,714.11**
Rendimientos financieros de asignaciones directas/Sector Central-SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	**4,829,695,566.81**
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo/Venta de Bienes/ILB-HERNANDEZ GALLO JUAN ANCELMO y otros	**3,066,530,310**
Licores - vigencias anteriores-HERNANDEZ GALLO JUAN ANCELMO	**1,560,699,872**
Sanciones - Sentencias de Repetición	**1,891,945,747**
Sanciones - Procesos Rentísticos	**2,242,195,538**
Der/Explot/loteria/reg/subsidiado-LOTERIA DE BOYACA	2,395,118,051
Recurso Coljuegos SSF/Régimen Subsidiado-COLJUEGOS	1,609,202,806
LOTERIA DE BOYACA	235,926,169.00
LOTERIA DE BOYACA	24,286,517.00
LOTERIA DE BOYACA	86,737,563.00
LOTERIA DEL META	4,298,484.00
LOTERIA DEL RISARALDA	388,620.00
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APP DEL DEPTO DEL HUILA	507,756.00
LOTERIA DEL TOLIMA	656,676.00
LOTERIA DE CUNDINAMARCA	5,854,035.00
LOTERIA DEL QUINDIO	114,597.00
LOTERIA SANTANDER	3,147,516.00
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - LOTERIA DE MANIZALES	1,024,641.00
LOTERIA DEL CAUCA	887,808.00
LOTERIA NACIONAL CRUZ ROJA COLOMBIANA	9,301,278.00
LOTERIA DE BOGOTA	7,276,221.00
LOTERIA DEL META	442,491.00
LOTERIA DEL RISARALDA	40,005.00
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APP DEL DEPTO DEL HUILA	52,269.00
LOTERIA DEL TOLIMA	67,599.00
LOTERIA DE CUNDINAMARCA	602,621.25
LOTERIA DEL QUINDIO	11,796.75
LOTERIA SANTANDER	324,009.00
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - LOTERIA DE MANIZALES	105,477.75
LOTERIA DEL CAUCA	91,392.57
LOTERIA NACIONAL CRUZ ROJA COLOMBIANA	957,484.00
LOTERIA DE BOGOTA	749,022.75
LOTERIA DEL META	1,580,325.00
LOTERIA DEL RISARALDA	142,875.00
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APP DEL DEPTO DEL HUILA	186,675.00
LOTERIA DEL TOLIMA	241,425.00
LOTERIA DE CUNDINAMARCA	2,152,218.75
LOTERIA DEL QUINDIO	42,131.25
LOTERIA SANTANDER	1,157,175.00
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - LOTERIA DE MANIZALES	376,706.25

LOTERIA DEL CAUCA	326,400.25
LOTERIA NACIONAL CRUZ ROJA COLOMBIANA	3,419,587.25
LOTERIA DE BOGOTA	2,675,081.25
LOTERIA DE BOYACA	2,343,398,592.00
LOTERIA DE BOYACA	241,232,208.00
LOTERIA DE BOYACA	861,543,600.00
LOTERIA DE BOYACA	726,287,474.00
LOTERIA DE BOYACA	91,691,395.00
VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S	31,195,008.00
Intereses - vehículos-TERCEROS IMPUESTO DE_VEHICULO	24,171,828,320
Apuestas Perman/Régimen Subsidiado-APUESTAS E INVERSIONES JER SA	309,975,519
TOTAL	107,886,758,700.50

Fuente: División Recaudo y Fiscalización - Gobernación de Boyacá.

En el manual de procedimientos contable para cartera, relacionado con el impuesto de vehículos automotores, se presentaron cambios con fecha 23 de agosto de 2019, relacionados con la actualización en el procedimiento, cuyo objeto es el de establecer los pasos a seguir para el registro contable y control de la cartera del impuesto sobre de vehículos de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En el manual de recaudo de cartera del Departamento de Boyacá, se estable que los procesos de difícil recaudo deberán ser sometidos al Comité de Sostenibilidad Contable, en especial al impuesto vehicular, por lo que no fue posible establecer cuales actos administrativos están relacionados con el recaudo de difícil cobro para la vigencia 2025.

Por otra parte con relación a la digitalización de las carpetas de las oficinas de tránsito del Departamento, con la revisión de la información registrada en la base de datos del Departamento, frente a los documentos existentes en las carpetas de las oficinas de tránsito, se deben depurar por cuanto alrededor del 25% de las carpetas intervenidas registran algún tipo de novedad, entre las más importantes se tienen: **cambio de propietario, traslados de cuenta, cambios de servicio y actualización de información para procesos de notificación**.

CRITERIO: Incumplimiento a la Resolución 533 de 2015, aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso siendo necesario que se encuentren integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad

También se presenta la Inobservancia de la Resolución 494 de 2017, en el artículo 14 de la Resolución 494 de 2017 expedida por la Contraloría General de Boyacá establece, que la información debe ser confiable teniendo en cuenta las variables

de calidad, oportunidad y suficiencia para emitir el resultado en cuanto al fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal.

CAUSA: Inefectividad de controles o no aplicación de los mismos para ejecutar el proceso financiero de una forma efectiva, ausencia de medidas tendientes a la verificación periódica del cumplimiento de las políticas contables adoptadas por la entidad, así como ineficacia del comité de sostenibilidad contable.

EFECTO: Información financiera con deficiencias e inobservancia de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, como autoridad reguladora de la contabilidad pública

La Entidad mencionan que han llevado a cabo un informe con corte a 30 de junio de 2026 pero no adjuntan soportes de ese informe y actuaciones realizadas en la plataforma de contabilidad que demuestren estas depuraciones, siendo necesario que los documentos soportes sean amplios y suficientes para desvirtuar las inconsistencias en todas las áreas involucradas en el proceso, la Resolución No. 023 de marzo de 2026 no se adjunta y no es suficiente prueba, por lo que se mantiene las inconsistencias; por tanto, la observación se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 6** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

Cuenta 16 Propiedad, Planta y Equipo

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 7 CUENTA 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON INCONSISTENCIAS EN SOBRESTIMACIONES Y SUBESTIMACIONES.

CONDICIÓN: Se evidencia que en cuenta **16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** y de acuerdo con la muestra analizada, se presentan **SOBRESTIMACIONES** por valor de **$1.566.505.450** y **SUBESTIMACIONES** por valor de **$150.944.419.369** a 31 de diciembre de 2025, entre las principales.

Por lo que la Comisión Auditora procedió a realizar la verificación de cada una de las carpetas en físico allegadas por parte de la Entidad y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, en el que se determinaron inconsistencias que deben ser aclaradas y que aparecen en la columna observación, también las diferencias que se presentan en cada uno de los bienes perteneciente de esta cuenta, tal como se establece en las siguientes tablas:

Edificaciones Pendientes por Legalizar

Tabla 27 EDIFICACIONES PENDIENTES POR LEGALIZAR

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
IPLAQUITANIA-0001-C2	Colegio Departamental de Bachillerato Ramón Ignacio Avella Calle 6 No. 8 - 36 Municipio de Aquitania. Escritura Pública No.175 de Agosto 28 de 1965 Notaría Única de Aquitania. y Escritura Pública No.91 de Julio 28 de 1972 Notaría Única de Aquitania.	96,812,800.00	96,812,800.00	300,136,939.29	-	7,152,970,796	Ficha técnica con fecha 28/10/2020 valor terreno $132.440.000 valor construcción $261.053.500 valor total de $393.493.500 funciona el Colegio Departamental de Bachillerato Ramon Ignacio Avella, en servicio, estudio de títulos con fecha 28/04/2021 observaciones: Adelanto del proceso de saneamiento de la titulación por parte del Colegio con fecha 03/02/2009, hoja de control gestiones administrativas con fecha 14/12/2022 observaciones: El predio se encuentra en proceso de titulación a favor del departamento, certificado de tradición con fecha 28/08/2024 anotación 2 A: Departamento de Boyacá con fecha 10/11/2023, avalúo con fecha marzo de 2018 valor terreno $132.440.000, valor construcción antigua $156.559.200 construcción reciente $96.812.800 cerramiento $7.681.500 valor total $393.493.500. Ficha técnica con fecha 11/06/25 Valor terreno $5,258,171,301,32, valor construcción $7,249,783,596, Informe de peritaje y avalúo Valor colegio departamental Ramon Ignacio Avella sede técnica Terreno $5,258,171,301, Valor Bloque número 1 $4,850,667,736, Valor Bloque No. 2,$1,255,106,160, Valor Bloque No. 3 $794,092,500, Valor total construcción $7,249,783,596. Valor total $12,507,954,897. Impuesto hasta 2025 cancelados. Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 de: Departamento de Boyacá. Aparece con matrícula inmobiliaria No. 095-98941 no debe aparecer como IPL. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $10.080.856.400 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $5,258,171,301 valor construcción $7,249,783,596, valor total $12,507,954,897, no aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad.
IPLAQUITANIA-0002-C1	Terreno Rural Las Veguitas Vereda El Cajón Municipio de Aquitania. Escritura Pública No.395 de Junio 11 de 1948 Notaría Primera de Tunja.	35,640,000.00	35,640,000.00	52,710,426.55	-	17,070,426.55	En carpeta dice casa rural Las Veguitas "vereda el Cajón" y en sistema IPL, Ficha técnica de fecha 16/12/2020 terrenos $18.633.520, construcción $44.760.000, valor total $63.393.520,no explotados sin uso en la actualidad, Estudio de título de fecha 01/06/2021 conclusiones: El depto. de Boyacá debe solicitar a la oficina de instrumentos públicos un certificado especial donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registros, para así adelantar el correspondiente proceso de pertenencia.. Certificado de tradición de fecha 25/11/2022 A: DEPARTAMENTO DE BOYACA. DEBE SACARSE DE IPL e incluirlos en la cuenta correspondiente. Paz y salvo de predial hasta 2021. Avalúo de fecha febrero de 2018, valor terreno: construcción $44.760.000, terreno $18.633.520, construcción 1 $35.640.000 construcción 2 $9.120.000, valor total $63.393.520. Valor Catastral mayor que el valor costo y avalúo. Certificado de tradición de fecha 27/08/2024 esta a nombre de: DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR CATASTRAL $26.755.649. Ficha técnica con fecha 11/06/2025 valor terreno $19.712.512.50, construcción $32.128.956.94 valor total $51.841.469.44. El valor catastral es por mayor al valor comercial. Mal clasificado porque es del Departamento de Boyacá, según certificado de tradición.
IPLAQUITANIA-0002-C2	Terreno Rural Las Veguitas Vereda El Cajón Municipio de Aquitania. Escritura Pública No.395 de Junio 11 de 1948 Notaría Primera de Tunja.	9,120,000.00	9,120,000.00	13,488,189.96	-	4,368,189.96	En carpeta dice casa rural Las Veguitas "vereda el Cajón" y en sistema IPL, Ficha técnica de fecha 16/12/2020 terrenos $18.633.520, construcción $44.760.000, valor total $63.393.520,no explotados sin uso en la actualidad, Estudio de título de fecha 01/06/2021 conclusiones: El depto. de Boyacá debe solicitar a la oficina de instrumentos públicos un certificado especial donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registros, para así adelantar el correspondiente proceso de pertenencia.. Certificado de tradición de fecha 25/11/2022 A: DEPARTAMENTO DE BOYACA. DEBE SACARSE DE IPL e incluirlos en la cuenta correspondiente. Paz y salvo de predial hasta 2021. Avalúo de fecha febrero de 2018, valor terreno: construcción $44.760.000, terreno $18.633.520, construcción 1 $35.640.000 construcción 2 $9.120.000, valor total $63.393.520. Valor Catastral mayor que el valor costo y avalúo. Certificado de tradición de fecha 27/08/2024 está a nombre de: DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR CATASTRAL $26.755.649. Ficha técnica con fecha 11/06/2025 valor terreno $19.712.512.50,

							construcción $32.128.956.94 valor total $51.841.469.44. El valor catastral es por mayor al valor comercial. Mal clasificado porque es del Departamento de Boyacá, según certificado de tradición.
IPLCHIQUINQUIRA-0003	Oficina Primer Piso Carrera 9 No. 17 - 41/49 Municipio de Chiquinquirá. Escritura Pública No. 5 de Enero 02 de 1938 Notaría Segunda de Chiquinquirá.	11,558,400.00	11,558,400.00	498,678,000.00	-	$238,191,600	Ficha técnica de fecha 16/12/2020 valor construcción $11.558.400 valor total $11.558.400 en servicio, oficina arrendada a Municipio de Chiquinquirá para local comercial Melocotón, certificado de tradición de fecha 27/10/2020 a: Municipio de Chiquinquirá, NO ES DUEÑO EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, estudio de títulos DE FECHA 27/04/2021 solicitar al IGAC certificado especial de ubicación, cabida y linderos del inmueble a fin de obtener el título de propiedad de la Gobernación de Boyacá, licencia de subdivisión otorgada por la Secretaria de Planeación del municipio de Chiquinquirá y así proceder a la protocolización de la misma, mientras debe permanecer en la cuenta contable IPL, IMPUESTO PREDIAL (Exento) Avalúo de Febrero de 2018 valor local $11.558.400. Visita de campo de fecha 04/10/2021 recomendaciones: Una vez entregados correspondientes adelantar las acciones para el desenglobe del inmueble, ejecutar las acciones correspondientes en pro de la defensa del inmueble. Liquidación de impuestos 2021 a 2024 con un valor de 3,905,577.
IPLFLORESTA-0001	Puesto de Salud Carrera 3 No. 4 - 10 Municipio de Floresta.	122,640,000.00	122,640,000.00	22,541,430.89	-	$122,640,000.00	Ficha técnica de fecha 11/05/2023 valor terreno $36.450.000, valor construcción $122.640.000, valor avalúo comercial $159.090.000 en servicio funciona puesto de salud del municipio de Floresta, certificado especial de tradición de fecha 12/08/2022 la inexistencia de pleno dominio no se puede certificar a ninguna persona. estudio de título no se adjunta, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $36.450.000 valor construcción $122.640.000 total $159.090.000. Certificado catastral especial con fecha 23/05/2023 nombre del propietario Municipio de FLORESTA. con certificado expedido por la secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Floresta informa que dicho predio es propiedad del municipio de Floresta, con fecha 27/09/2024.
IPLTUNJA-0001-C3	Auditorio Boyaquirá - Casa Urbana Escuela de Artes Carrera 8 No. 21- 23 Municipio de Tunja.	4,898,517,801.44	0.00	0	-	4,898,517,801.44	Ficha técnica sin fecha en Memoria descriptiva dice: Fecha de ingreso 01/01/2018, en servicio, zona urbana; en cuadro de área esta diligenciado en el área construida 2.455.30 Vida útil (años) 34.200, aspectos legales: matricula inmobiliaria IPLTUNJA-0001-C3, valor costo $449.565.000 Mejoras: con fecha 15/12/2021 valor $263.796.689.03 y $898.517.801.44. Ficha técnica con fecha 27/05/2025 valor terreno $1,496,208,000 valor construcción $6,181,674,161 valor total $7,677,882,161,09. Funciona la escuela de Artes hoy en día en servicio por parte del director de Servicios Administrativos y Logísticos, Almacenista y Administrador de Bienes muebles del departamento y Auditorio Totalmente terminado y entregado de acuerdo al acta de recibo final a satisfacción con fecha 19/04/2021. Ficha técnica con fecha 03/07/2025 Valor terreno $1,496,208,000 valor construcción $6,144,147,490,47 valor total $7,640,355,490,47. Avalúo con fecha febrero de 2018 valor terreno $1,496,208,000, construcción 1 $73,800,000, valor construcción 2 $458,468,000, auditorio $449,565,000 valor total construcciones $981,833,000 valor total 42,478,041,000, certificado catastral especial municipio de Tunja, con fecha 11/08/2025. Documento donde admiten demanda de pertenencia instaurada a nombre de Gobernación de Boyacá. Falta nuevo avalúo según las mejoras.
IPLTUNJA-0001-C3	Auditorio Boyaquirá - Casa Urbana Escuela de Artes Carrera 8 No. 21- 23 Municipio de Tunja.	263,796,689.03	0.00		-	185,768,310.97	Ficha técnica sin fecha en Memoria descriptiva dice: Fecha de ingreso 01/01/2018, en servicio, zona urbana; en cuadro de área esta diligenciado en el área construida 2.455.30 Vida útil (años) 34.200, aspectos legales: matricula inmobiliaria IPLTUNJA-0001-C3, valor costo $449.565.000 Mejoras: con fecha 15/12/2021 valor $263.796.689.03 y $898.517.801.44. Ficha técnica con fecha 27/05/2025 valor terreno $1,496,208,000 valor construcción $6,181,674,161 valor total $7,677,882,161,09. Funciona la escuela de Artes hoy en día en servicio por parte del Director de Servicios Administrativos y Logísticos, Almacenista y Administrador de Bienes muebles del departamento y Auditorio Totalmente terminado y entregado de acuerdo al acta de recibo final a satisfacción con fecha 19/04/2021. Ficha técnica con fecha 03/07/2025 Valor terreno $1,496,208,000 valor construcción $6,144,147,490,47 valor total $7,640,355,490,47. Avalúo con fecha febrero de 2018 valor terreno $1,496,208,000, construcción 1 $73,800,000, valor construcción 2 $458,468,000, auditorio $449,565,000 valor total construcciones $981,833,000 valor total 42,478,041,000, certificado catastral especial municipio de Tunja, con fecha 11/08/2025. Documento donde admiten demanda de pertenencia instaurada a nombre de Gobernación de Boyacá.
					-	12,619,527,125	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Edificios Urbanos

Tabla 28 EDIFICIOS URBANOS

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACIÓN	OBSERVACIONES
070-102232	Laboratorio Secretaría de Salud de Boyacá Calle 23 No. 12 - 74 Municipio Tunja. Escritura Pública No.920 de Septiembre 17 de 1957 Notaría Primera de Tunja.	1,154,486,000.00	1,154,486,000.00	1,482,538,770.85	-	328,052,770.85	Ficha técnica de fecha 04/05/2023 valor terreno $170.700.000, valor construcción $1.154.486.000 valor total $1.325.186.000, en servicio, funciona el laboratorio de la Secretaria de Salud de Boyacá, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de título de fecha 06/06/2019 recomendaciones: mantenerlo en inventario y en los estados financieros del departamento de Boyacá, avalúo febrero de 2018 valor terreno $170.700.000 construcción 1 $885.800.000, construcción 2 $224.940.000, valor construcción 3 $43.746.000 valor total construcción $1.154.486.000 valor razonable total $1.325.186.000, ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $170.700.000, valor construcción $1.154.486.000 valor total $1.325.186.000, en servicio funciona el laboratorio de la Secretaria de Salud e Boyacá, certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá, certificado catastral especial con fecha 15/07/2022, valor del avalúo de $1.515.560.000 a nombre de Secretaria de salud de Boyacá. Ficha técnica con fecha 03/06/2025 valor terreno $170,700,000 valor construcción $1,154,486,000 valor total $1,325,186,000. Impuesto predial cancelado hasta el año 2025. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 A: Departamento de Boyacá.
070-102608	Edificio Secretaría de Salud de Boyacá Calle 22A No.12 - 38 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.1742 del noviembre 24 de 1944 Notaría Segunda de Tunja.	736,166,600.00	736,166,600.00	849,721,651.86	-	113,555,052	Ficha técnica de fecha 04/05/2023 valor terreno $1.336.680.000. valor construcción $736.166.600 valor total $2.072.846.600, en servicio, funciona la secretaria de salud de Boyacá, certificado de tradición de 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de títulos sin fecha continuar en los estados financieros y en los inventarios del departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $1.336.680.000 valor construcción $736.166.600, valor total $2.072.846.600. Ficha técnica 21/05/2024 valor terreno $1.336.680.000. valor construcción $736.166.600 valor total $2.072.846.600, en servicio, funciona la secretaria de salud de Boyacá, certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 03/06/2025 valor terreno $1,336,680,000 valor construcción $736,166,600 valor total $2,072,846,600. Impuestos cancelados hasta 2026. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá.
070-1306	Edificio Bicentenario - Edificio Urbano - Carrera 9 No.17 - 50/60 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.238 de Febrero 17 de 2015 Notaría Primera de Tunja	1,794,190,000.00	1,794,190,000.00	1,602,314,929.71	-	11,588,491,157	Ficha técnica de fecha 31/10/2023 valor terreno $981.200.000 valor construcción $13.382.681.157 valor total $14.363.881.157, en servicio, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 de: Contraloría General de Boyacá a Gobernación de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de título sin fecha recomendaciones: Debe seguir en los estados financieros y en bienes reales del departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2018, valor terreno $981.200.000 valor construcción $1.794.190.000 valor razonable $2.775.390.000. Contrato de interventoría No.3552 de fecha 04/10/2019. Terreno Urbano. Adquirido mediante Cesión Gratuita de la Contraloría General de Boyacá dentro del Convenio Marco de Cooperación Interadministrativo entre la Contraloría general de Boyacá y la Gobernación de Boyacá. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $981.200.000 valor construcción $13.382.681.157 valor total $14.363.881.157, en servicio, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá anotación No. 6 con fecha 06/04/2015.Con contrato de Obra No. 3471 de 2019 por valor total de $10.829.612.707 (Valor inicial del contrato $7.745.500.557 adición por valor de

							$3.084.112.150), contrato de interventoría No. 3552 de 2019 por valor total 758.878.450(valor inicial $542.990.654 adición de $215.887.850) Para un gran total de $ de $ Se realizaron mejoras por valor de $11.588.491.157, por lo tanto es necesario realizar un nuevo avalúo del inmueble. Ficha técnica con fecha 03/06/2025 valor terreno $981,200,000 valor construcción $13,382,681,157 valor total $14,363,881,157. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 a: Departamento de Boyacá.
070-50400-C1	Edificio Escalafón y CEP Secretaría de Educación de Boyacá Calle 18 No. 10 - 23/29 Municipio de Tunja. Acta de Cesión Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	559,072,500.00	559,072,500.00	1,340,164,008.67	-	781,091,509	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 Valor terreno $274.300.000, valor construcción $607.372.500, valor total $881.672.500, funciona la oficina de gestión documental y otros, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial hasta 2025, Estudio de títulos con fecha 31/08/2018 recomendaciones: mantener en el inventario del Departamento. Avalúo de marzo de 2018 valor terreno $274.300.000, valor construcción Piso 1 al 5 $559.072.500 construcción piso 6 $48.300.000, valor total construcción $607.372.500, valor total $881.672.500. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $274.300.000, valor construcción $607.372.500, valor total $881.672.500, en servicio funciona Oficina de Infraestructura gestión documental y otros. Certificado de tradición con fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá anotación No. 3 con fecha 03/01/1997. Certificado de tradición con fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2025. Ficha técnica de fecha 04/06/2025 valor terreno $274,300,000 valor construcción $607,372,500 valor total $881,672,500
070-50400-C2	Edificio Escalafón y CEP Secretaría de Educación de Boyacá Calle 18 No. 10 - 23/29 Municipio de Tunja. Acta de Cesión del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	48,300,000.00	48,300,000.00	115,780,907.88	-	67,480,908	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 Valor terreno $274.300.000, valor construcción $607.372.500, valor total $881.672.500, funciona la oficina de gestión documental y otros, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial hasta 2025, Estudio de títulos con fecha 31/08/2018 recomendaciones: mantener en el inventario del Departamento. Avalúo de marzo de 2018 valor terreno $274.300.000, valor construcción Piso 1 al 5 $559.072.500 construcción piso 6 $48.300.000, valor total construcción $607.372.500, valor total $881.672.500. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $274.300.000, valor construcción $607.372.500, valor total $881.672.500, en servicio funciona Oficina de Infraestructura gestión documental y otros. Certificado de tradición con fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá anotación No. 3 con fecha 03/01/1997. Certificado de tradición con fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2025. Ficha técnica de fecha 04/06/2025 valor terreno $274,300,000 valor construcción $607,372,500 valor total $881,672,500
070-68717-C1	Edificio Urbano Carrera 14 No. 3 - 17 "Casa del Menor Marco Fidel Suárez" Municipio de Tunja. Escritura Pública No.130 de Febrero 06 de 1940 Notaría Primera de Tunja	212,586,000.00	212,586,000.00	250,883,904.99	-	38,297,905	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción $1.116.288.000 en servicio valor comercial $3.036.588.000 casa del menor Marco Fidel Suárez contrato de comodato. Certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2021, estudio de títulos de fecha 05/10/2018 recomendaciones: mantenerse en los inventarios y estados financieros del depto., solicita que se incorpore en la escritura pública del inmueble. Avalúo de fecha marzo de 2018 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción 1 $212.586.000, construcción 2 $318.613.000, construcción 3 $523.445.000, construcción 4 $27.000.000 Cerramiento $34.644.000. valor construcciones $1.116.288.000 valor total $3.036.588.000. Contrato de Comodato No.0946 del Febrero 18 de 2020.celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Igualmente se informa que el área del Cerramiento es de 577.40 metros lineales. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial: exento. Acta de cierre de comodato con fecha 31/07/2023. En la cual se dispone: Cerrar el expediente y ordenar el archivo del comodato... Contrato de Comodato No.0946 de Febrero 18 de 2020, celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 A: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024.

070-68717-C2	Edificio Urbano Carrera 14 No. 3 - 17 "Casa del Menor Marco Fidel Suárez" Municipio de Tunja. Escritura Pública No.130 de Febrero 06 de 1940 Notaría Primera de Tunja	318,613,000.00	318,613,000.00	376,011,936.91	-	57,398,937	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción $1.116.288.000 en servicio valor comercial $3.036.588.000 casa del menor Marco Fidel Suárez contrato de comodato. Certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2021, estudio de títulos de fecha 05/10/2018 recomendaciones: mantenerse en los inventarios y estados financieros del depto., solicita que se incorpore en la escritura pública del inmueble. Avalúo de fecha marzo de 2018 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción 1 $212.586.000, construcción 2 $318.613.000, construcción 3 $523.445.000, construcción 4 $27.000.000 Cerramiento $34.644.000. valor construcciones $1.116.288.000 valor total $3.036.588.000. Contrato de Comodato No.0946 del Febrero 18 de 2020.celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Igualmente se informa que el área del Cerramiento es de 577.40 metros lineales. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial: exento. Acta de cierre de comodato con fecha 31/07/2023. En la cual se dispone: Cerrar el expediente y ordenar el archivo del comodato... Contrato de Comodato No.0946 de Febrero 18 de 2020, celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 A: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024.
070-68717-C3	Edificio Urbano Carrera 14 No. 3 - 17 "Casa del Menor Marco Fidel Suárez" Municipio de Tunja. Escritura Pública No.130 de Febrero 06de 1940 Notaría Primera de Tunja.	523,445,000.00	523,445,000.00	617,744,939.21	-	94,299,939	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción $1.116.288.000 en servicio valor comercial $3.036.588.000 casa del menor Marco Fidel Suárez contrato de comodato. Certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2021, estudio de títulos de fecha 05/10/2018 recomendaciones: mantenerse en los inventarios y estados financieros del depto., solicita que se incorpore en la escritura pública del inmueble. Avalúo de fecha marzo de 2018 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción 1 $212.586.000, construcción 2 $318.613.000, construcción 3 $523.445.000, construcción 4 $27.000.000 Cerramiento $34.644.000. valor construcciones $1.116.288.000 valor total $3.036.588.000. Contrato de Comodato No.0946 del Febrero 18 de 2020.celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Igualmente se informa que el área del Cerramiento es de 577.40 metros lineales. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial: exento. Acta de cierre de comodato con fecha 31/07/2023. En la cual se dispone: Cerrar el expediente y ordenar el archivo del comodato... Contrato de Comodato No.0946 de Febrero 18 de 2020, celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 A: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024.
070-68717-C4	Edificio Urbano Carrera 14 No. 3 - 17 "Casa del Menor Marco Fidel Suárez" Municipio de Tunja. Escritura Pública No.130 de febrero 6 de 1940 Notaría Primera de Tunja	27,000,000.00	27,000,000.00	31,864,118.21	-	4,864,118	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción $1.116.288.000 en servicio valor comercial $3.036.588.000 casa del menor Marco Fidel Suárez contrato de comodato. Certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2021, estudio de títulos de fecha 05/10/2018 recomendaciones: mantenerse en los inventarios y estados financieros del depto., solicita que se incorpore en la escritura pública del inmueble. Avalúo de fecha marzo de 2018 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción 1 $212.586.000, construcción 2 $318.613.000, construcción 3 $523.445.000, construcción 4 $27.000.000 Cerramiento $34.644.000. valor construcciones $1.116.288.000 valor total $3.036.588.000. Contrato de Comodato No.0946 del Febrero 18 de 2020.celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Igualmente se informa que el área del Cerramiento es de 577.40 metros lineales. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial: exento. Acta de cierre de comodato con fecha 31/07/2023. En la cual se dispone: Cerrar el expediente y ordenar el archivo del comodato... Contrato de Comodato No.0946 de Febrero 18 de 2020, celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 A: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024.
070-1306	Edificio Bicentenario - Edificio Urbano - Carrera 9 No.17 - 50/60 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.238 de Febrero 17 de	10,829,612,707.00	0.00	1,427,009,380.78	-	1,794,190,000	Ficha técnica de fecha 31/10/2023 valor terreno $981.200.000 valor construcción $13.382.681.157 valor total $14.363.881.157, en servicio, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 de: Contraloría General de

	2015 Notaría Primera de Tunja						Boyacá a Gobernación de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de título sin fecha recomendaciones: Debe seguir en los estados financieros y en bienes reales del departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2018, valor terreno $981.200.000 valor construcción $1.794.190.000 valor razonable $2.775.390.000. Contrato de interventoría No.3552 de fecha 04/10/2019. Terreno Urbano. Adquirido mediante Cesión Gratuita de la Contraloría General de Boyacá dentro del Convenio Marco de Cooperación Interadministrativo entre la Contraloría general de Boyacá y la Gobernación de Boyacá. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $981.200.000 valor construcción $13.382.681.157 valor total $14.363.881.157, en servicio, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá anotación No. 6 con fecha 06/04/2015.Con contrato de Obra No. 3471 de 2019 por valor total de $10.829.612.707 (Valor inicial del contrato $7.745.500.557 adición por valor de $3.084.112.150), contrato de interventoría No. 3552 de 2019 por valor total 758.878.450(valor inicial $542.990.654 adición de $215.887.850) Se realizaron mejoras por valor de $11.588.491.157, por lo tanto es necesario realizar un nuevo avalúo del inmueble. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $981,200,000 valor construcción $13,382,681,157 valor total $14,363,881,157. No tiene el valor avalúo por $13,382,681,157. Impuesto cancelado hasta 2025. Ficha técnica con fecha 03/06/2025 valor terreno $981,200,000 valor construcción $13,382,681,157 valor total $14,363,881,157. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 de: Contraloría General de Boyacá A: Departamento de Boyacá.
070-1306	Edificio Bicentenario - Edificio Urbano - Carrera 9 No.17 - 50/60 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.238 de febrero 17 de 2015 Notaría Primera de Tunja	758,878,450.00	0.00	1,427,009,380.78	758,878,450	-	Ficha técnica de fecha 31/10/2023 valor terreno $981.200.000 valor construcción $13.382.681.157 valor total $14.363.881.157, en servicio, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 de: Contraloría General de Boyacá a Gobernación de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de título sin fecha recomendaciones: Debe seguir en los estados financieros y en bienes reales del departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2018, valor terreno $981.200.000 valor construcción $1.794.190.000 valor razonable $2.775.390.000. Contrato de interventoría No.3552 de fecha 04/10/2019. Terreno Urbano. Adquirido mediante Cesión Gratuita de la Contraloría General de Boyacá dentro del Convenio Marco de Cooperación Interadministrativo entre la Contraloría general de Boyacá y la Gobernación de Boyacá. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $981.200.000 valor construcción $13.382.681.157 valor total $14.363.881.157, en servicio, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá anotación No. 6 con fecha 06/04/2015.Con contrato de Obra No. 3471 de 2019 por valor total de $10.829.612.707 (Valor inicial del contrato $7.745.500.557 adición por valor de $3.084.112.150), contrato de interventoría No. 3552 de 2019 por valor total 758.878.450(valor inicial $542.990.654 adición de $215.887.850) Se realizaron mejoras por valor de $11.588.491.157, por lo tanto es necesario realizar un nuevo avalúo del inmueble. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $981,200,000 valor construcción $13,382,681,157 valor total $14,363,881,157. No tiene el valor avalúo por $13,382,681,157. Impuesto cancelado hasta 2025. Ficha técnica con fecha 03/06/2025 valor terreno $981,200,000 valor construcción $13,382,681,157 valor total $14,363,881,157. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 de: Contraloría General de Boyacá A: Departamento de Boyacá.
					758,878,450	14,867,722,295.58	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Locales

Tabla 29 LOCALES

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-119135	Local 1 Calle 29 No. 11 - 42 Centro Comercial Omnicentro Municipio de Tunja. Sentencia de Adjudicación del Divisorio No.2003-00-137 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja de febrero 03 de 2004.	40,154,400.00	40,154,400.00	41,578,000.00		1,423,600	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $0. valor construcción $40.154.400 valor total $40.154.400, en comodato para el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección, certificado de tradición de 28/01/2021 anotación 16 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2025 estudio de títulos de fecha 02/09/2020 recomendaciones: realizar visita al centro comercial Omni Centro, solicitar a Secretaria de Hacienda oficina de impuesto desprendibles de pago que se han venido desempeñando sobre el bien inmueble... permanecer en los inventarios y en los estados financieros del depto. Avalúo febrero de 2018 local $40.154.000. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $0. valor construcción $40.154.400 valor total $40.154.400, en comodato para el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección. Ficha técnica con fecha 06/06/2025 valor terreno $0. valor construcción $40.154.400 valor total $40.154.400, en comodato para el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección.
070-119140	Local 6 Calle 29 No. 11 - 22 Centro Comercial Omnicentro Municipio de Tunja. Sentencia de Adjudicación del Divisorio No.2003-00-137 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja de febrero 03 de 2004	40,154,400.00	40,154,400.00	41,578,000.00		1,423,600	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $0. valor construcción $40.154.400 valor total $40.154.400, no explotado-disponible, certificado de tradición de 28/01/2021 anotación 16 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial canelado hasta 2025 estudio de títulos de fecha septiembre de 2018 recomendaciones: permanecer en los inventarios y en los estados financieros del depto. avalúo febrero de 2018 local $40.154.000. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $0. valor construcción $40.154.400 valor total $40.154.400 no explotado-disponible. Certificado de tradición de 22/01/2026 anotación 16 a: Departamento de Boyacá, Ficha técnica de fecha 06/6/2025 valor terreno $0. valor construcción $40.154.400 valor total $40.154.400, no explotado-disponible.
070-119141	Local 7 Calle 29 No. 11 - 16 Tunja Centro Comercial Omnicentro Municipio de Tunja. Sentencia de Adjudicación del Divisorio No.2003-00-137 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja de febrero 03 de 2004.	40,154,400.00	40,154,400.00	41,578,000.00		1,423,600	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor construcción $40.154.000 valor comercial $40.154.400, en comodato funciona el Sindicato de servidores públicos de Colombia, subdirectiva, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 anotación 16 a: Departamento de Boyacá, estudio de títulos septiembre de 2018 recomendaciones: continuar en los estados financieros e inventarios del depto. avalúo de febrero de 2018 valor local $40.154.400. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $40.154.000 valor comercial $40.154.400, en comodato funciona el Sindicato de servidores públicos de Colombia, subdirectiva Seccional Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2025. Ficha técnica de fecha 06/06/2025 valor construcción $40.154.000 valor comercial $40.154.400, en comodato funciona el Sindicato de servidores públicos de Colombia, subdirectiva
TOTAL						4,270,800	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Oficinas

Tabla 30 OFICINAS

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACIÓN	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-108493	Oficina 203B Interior Calle 20 No. 13 - 10 Centro Cívico Plaza Real Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 4066 de diciembre 31 de 1997 Notaría Primera de Tunja	76,694,000.00	76,694,000.00	80,081,000.00		3,387,000	Ficha técnica de fecha 13/10/2020 valor construcción $76.694.000 valor comercial $76.694.000 en servicio funciona oficinas de secretaria de planeación de Boyacá, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 a: Departamento de Boyacá, impuestos predial hasta 2025, estudio de títulos 10/09/2019 recomendación: Debe permanecer en los estados financieros e inventarios del depto. Avalúo de febrero de 2018 valor oficina 203 $76.694.000. Ficha técnica de fecha 09/06/2025 valor construcción $76.694.000, certificado de tradición de fecha 09/09/2025 a: Departamento de Boyacá

070-108496	Oficina 206B Interior Calle 20 No. 13 - 10 Centro Cívico Plaza Real Municipio de Tunja Escritura Pública No. 4066 de diciembre 31 de 1997 Notaria Primera Tunja	117,924,000.00	117,924,000.00	121,816,000.00		3,892,000	Ficha técnica de fecha 13/10/2020 valor construcción $117.924.000 valor comercial $117.924.000 en servicio funciona departamento administrativo de planeación de Boyacá, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de títulos de fecha 14/08/2018 recomienda: mantenerse dentro del inventario y estados financieros del depto. avalúo febrero de 2018, oficina 206B $117.924.000. Impuesto predial pago hasta 2025. Ficha técnica de fecha 09/06/2025 valor construcción $117.924.000 valor comercial $117.924.000 en servicio funciona departamento administrativo de planeación de Boyacá
070-108497	Oficina 207B Interior Calle No. 13 - 10 Centro Cívico Plaza Real Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 4066 de diciembre 31 de 1997 Notaría Primera Tunja	117,924,000.00	117,924,000.00	121,816,000.00		3,892,000	Ficha técnica de fecha 13/10/2020, valor construcción $117.924.000, valor comercial $117.924.000 en servicio funciona las oficinas de departamento administrativo de planeación de Boyacá, certificado de tradición 28/01/2021 a: departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de títulos 14/08/2018 recomendaciones: Mantenerse dentro del inventario y estados financieros del depto. Avalúo de fecha febrero de 2018 oficina 207B valor $117.924.000. Ficha técnica de fecha 09/07/2025, valor construcción $117.924.000, valor comercial $117.924.000 en servicio funciona las oficinas de departamento administrativo de planeación de Boyacá, impuesto predial vigente hasta 2025
070-108498	Oficina 208B Interior Calle 20 No. 13 - 10 Centro Cívico Plaza Real Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 4066 de diciembre 31 de 1997 Notaría Primera Tunja	117,924,000.00	117,924,000.00	121,816,000.00		3,892,000	Ficha técnica de fecha 13/10/2020 valor construcción $117.924.000 valor comercial $117.924.000 en servicio funciona oficinas del departamento administrativo de planeación de Boyacá, , certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de títulos de fecha 14/08/2018 mantenerse en el inventario y en lo estados financieros del depto., avalúo de febrero de 2018 valor oficina 208B $117.924.000. Ficha técnica de fecha 09/06/2025, impuesto predial vigente hasta 2025.
070-108499	Oficina 209B Interior Calle 20 No. 13 - 10 Centro Cívico Plaza Real Municipio de Tunja Escritura Pública No. 4066 de diciembre 31 de 1997 Notaría Primera Tunja	117,924,000.00	117,924,000.00	121,816,000.00		3,892,000	Ficha técnica de fecha 13/10/2020 valor construcción $117.924.000 valor comercial $117.924.000 en servicio funciona oficinas departamento administrativo de Planeación Gobernación de Boyacá, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2024, estudio de títulos de fecha 14/08/2018 mantener en el inventario y en los estados financieros del depto., avalúo febrero de 2018 valor oficina 209 $117.924.000. Ficha técnica de fecha 09/06/2025 valor construcción $117.924.000, impuesto predial vigente 2025.
070-50601	Oficina 2 y Mezanine Carrera 10 No. 18 - 68 Secretaría de Educación de Boyacá Municipio de Tunja. Acta de Cesión de Inmuebles del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	92,708,000.00	92,708,000.00	588,360,000.00		495,652,000	Ficha técnica de fecha 13/10/2020 Valor construcción $92.708.000 valor comercial $92.708.000 en servicio funciona la Secretaria de Educación de Boyacá, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025, estudio de títulos de fecha octubre de 2018 recomiendan: mantenerse dentro de los estados financieros del departamento, engloba todas las oficinas del edificio para evitar presunto detrimento patrimonial por el pago de impuestos, avalúo de fecha febrero de 2018 valor oficina2 y mezanine $92.708.000. Certificado catastral Nacional con fecha 17/06/2022 avalúo por $523.989.000 a nombre de Departamento de Boyacá.
070-50604	Oficina 1A Centro de Cableado Piso 2 Carrera 10 No. 18 - 68 Secretaría de Educación de Boyacá Municipio de Tunja. Acta de Cesión de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	43,120,000.00	43,120,000.00	47,186,000.00		4,066,000	Ficha técnica de fecha 13/10/2020 Valor construcción $43.120.000 en servicio funciona la Secretaria de Educación de Boyacá, certificado de tradición de fecha 21/06/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025, estudio de títulos de fecha 10/2018 recomendaciones: Permanecer dentro de los estados financieros e inventario del depto. de Boy. Englobal las oficinas del edificio de la Secretaria de Educación de Boyacá para evitar detrimento patrimonial por pago de Impuestos. avalúo de febrero de 2018 valor oficina 1A centro de cableado piso 2 valor razonable $43.120.000.
			TOTAL			518,673,000	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Otras Edificaciones

Tabla 31 OTRAS EDIFICACIONES

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-39487	Cerramiento Terreno Urbano denominado "Tuberculosos"	818,500.00	818,500.00	435,579.66	$818,500.00	-	Ficha técnica de fecha 25/04/2022 valor terreno $321.200.000 valor comercial $321.200.000, no explotado

	Carrera 7 No. 19 - 17 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.881 de octubre 21 de 1937 Notaría Primera de Tunja.						lote de la gobernación de Boyacá con cerramiento sin utilizar, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025, estudio de título de fecha 11/09/2018 recomendaciones: debe ser incluido en los estados financieros y en el inventario del depto. de Boyacá, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $321.200.000 cerramiento: $818.500 valor total $322.018.500, Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $321.200.000 valor comercial $321.200.000, no explotado lote de la gobernación de Boyacá con cerramiento sin utilizar. El cerramiento tiene un área de 16.37 metros lineales. Ficha técnica con fecha 25/06/2025 Valor terreno $321,200,000 Valor construcción $0,00 valor total $321,200,000. Certificado de tradición con fecha 19/11/2025 a: Departamento de Boyacá.
070-68717-C5	Cerramiento Carrera 14 No. 3 - 17 "Casa del Menor Marco Fidel Suárez". Escritura Pública No.130 de Febrero 06 de 1940 Notaría Primera de Tunja	34,644,000.00	34,644,000.00	40,885,204.13	-	6,241,204	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción $1.116.288.000 en servicio valor comercial $3.036.588.000 casa del menor Marco Fidel Suárez contrato de comodato. Certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2021, estudio de títulos de fecha 05/10/2018 recomendaciones: mantenerse en los inventarios y estados financieros del depto., solicita que se incorpore en la escritura pública del inmueble. Avalúo de fecha marzo de 2018 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción 1 $212.586.000, construcción 2 $318.613.000, construcción 3 $523.445.000, construcción 4 $27.000.000 Cerramiento $34.644.000. valor construcciones $1.116.288.000 valor total $3.036.588.000. Contrato de Comodato No.0946 del febrero 18 de 2020.celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Igualmente se informa que el área del Cerramiento es de 577.40 metros lineales. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial: exento. Acta de cierre de comodato con fecha 31/07/2023. En la cual se dispone: Cerrar el expediente y ordenar el archivo del comodato... Contrato de Comodato No.0946 de febrero 18 de 2020, celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 A: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024.
TOTAL					$818,500.00	6,241,204	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Terreno Ambiental

Tabla 32 TERRENO AMBIENTAL

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_ COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-131498	Reserva Hídrica Terreno Rural denominado "El Cardonal 2" Vereda Centro del Municipio Motavita, Escritura Pública No. 1859 del 31 de diciembre de 2008 de la Notaria Cuarta de Tunja	194,300,000.00	194,300,000.00	53,820,000.00	0	194,300,000.00	Ficha técnica de fecha 04/05/2023 valor terreno $194.300.000 avalúo el mismo, en servicio, reserva hídrica, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial paz y salvo de impuesto predial 2023, solicitud de excepción de impuesto predial en el año 2022. Estudio de títulos del 14/08/2020 recomendación: ... Se debe realizar visita por parte de la Dirección de Servicios Administrativos y Logístico, con el fin de inspeccionar las adecuaciones, linderos, comprobar si se encuentra en esta de abandono o no, determinar el uso y si existe alguna perturbación. Avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $194.300.000, Ficha técnica de fecha 10/07/2025 valor terreno $194.300.000 avalúo el mismo, en servicio, reserva hídrica. certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Municipio de Motavita.
078-13438	Reserva Hídrica Terreno Rural denominado "La Despensa" Vereda Quigua Arriba Municipio de Garagoa. Escritura Pública No. 3315 de diciembre 28 de 2007 de la Notaria Segunda de Tunja y Escritura Pública No.104 de enero 29 de 2008 Aclaratoria de Linderos Nota	174,943,880.00	174,943,880.00	134,750,755.50	0	174,943,880.00	Ficha técnica de fecha 06/10/2020 valor terreno $174.943.880, construcción $18.480.000, valor total $193.423.880, en comodato. Certificado de tradición de fecha 17/02/2022 a: Departamento de Boyacá X A. Diocesis de Garagoa. Impuesto predial exento, estudio de título fecha 21/08/2018 recomendación: Proyectar ordenanza, continuar en los estados financieros y en los inventarios del depto. Avalúo febrero de 2018 valor terreno $174.943.880 valor construcción $18.480.000 valor total $193.423.880. Certificado de tradición con fecha 10/03/2025 a: Departamento de Boyacá y a: Diocesis de Garagoa.

090-27224	Reserva Hídrica Terreno Rural denominado "San Miguel" Vereda Reavita Municipio de Ciénega. Escritura Pública No.1736 de septiembre 20 de 2010 Notaría Segunda de Tunja.	30,105,600.00	30,105,600.00	16,860,000.00	0	30,105,600.00	Ficha técnica de fecha 08/05/2023 valor terreno $30.105.600, en servicio, reserva hídrica, certificado de tradición de fecha 23/02/2022 de: Departamento de Boyacá a: Municipio de Cienega. Impuesto predial exento. Estudio de títulos de agosto de 2018 recomendación: Proyectar Ordenanza, debe permanecer en los estados financieros y en los inventarios del departamento, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $30.105.600. Reserva Hídrica del Municipio de Cienega. Certificado de tradición con fecha 12/04/2024 a: Municipio de Cienega.
TOTAL					-	399,349,480.00	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Terrenos Pendientes de Legalizar

Tabla 33 TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
IPLAQUITANIA-0002	Terreno Rural Las Veguitas Vereda El Cajón Municipio de Aquitania. Escritura Pública No.395 de Junio 11 de 1948 Notaría Primera de Tunja.	18,633,520.00	18,633,520.00	27,558,383.49	-	10,003,855.99	En carpeta dice casa rural Las Veguitas "vereda el Cajón" y en sistema IPL, Ficha técnica de fecha 16/12/2020 terrenos $18.633.520, construcción $44.760.000, valor total $63.393.520,no explotados sin uso en la actualidad, Estudio de título de fecha 01/06/2021 conclusiones: El depto. de Boyacá debe solicitar a la oficina de instrumentos públicos un certificado especial donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registros, para así adelantar el correspondiente proceso de pertenencia... Certificado de tradición de fecha 25/11/2022 A: DEPARTAMENTO DE BOYACA. DEBE SACARSE DE IPL e incluirlos en la cuenta correspondiente. Paz y salvo de predial hasta 2021. Avalúo de fecha febrero de 2018, valor terreno: construcción $44.760.000, terreno $18.633.520, construcción 1 $35.640.000 construcción 2 $9.120.000, valor total $63.393.520. Valor Catastral mayor que el valor costo y avalúo. Certificado de tradición de fecha 27/08/2024 esta a nombre de: DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR CATASTRAL $26.755.649. Ficha técnica con fecha 11/06/2025 valor terreno $19.712.512.50, construcción $32.128.956.94 valor total $51.841.469.44. El valor catastral es mayor que el valor comercial. Mal clasificado porque es del Departamento de Boyacá, según certificado de tradición.
IPLFLORESTA-0001	Terreno Urbano Puesto de Salud Carrera 3 No. 4 - 10 Municipio de Floresta.	36,450,000.00	36,450,000.00	6,699,569.11	-	$36,450,000	Ficha técnica de fecha 11/05/2023 valor terreno $36.450.000, valor construcción $122.640.000, valor avalúo comercial $159.090.000 en servicio funciona puesto de salud del municipio de Floresta, certificado especial de tradición de fecha 12/08/2022 la inexistencia de pleno dominio no se puede certificar a ninguna persona. estudio de título no se adjunta, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $36.450.000 valor construcción $122.640.000 total $159.090.000. Certificado catastral especial con fecha 23/05/2023 nombre del propietario Municipio de FLORESTA. con certificado expedido por la secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Floresta informa que dicho predio es propiedad del municipio de Floresta, con fecha 27/09/2024.
IPLPAIPA-0001	Terreno Rural denominado "El Bosque" de San José Vereda El Volcán Municipio de Paipa	106,600,000.00	106,600,000.00	7,925,000.00	-	106,600,000	Ficha técnica de fecha 18/07/2023 valor terreno $106.600.000 valor total igual, no explotado, impuesto predial hasta 2025, Certificado de tradición no adjuntan, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $106.600.000. Estudio de título con fecha 24/05/2024 recomiendan: la expedición de certificados especiales con el fin de legalizar el inmueble a favor del depto. de Boyacá. 4 este predio está siendo explotado para extracción de carbón por particulares. Estudio de títulos con fecha 24 de mayo de 2023, recomienda: adelantar las gestiones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de acuerdo con la expedición de los certificados especiales. Informe de visita de campo con fecha 01/10/2024 en donde se concluye: Teniendo en cuenta la visita y los informes que reposan en el expediente es necesario cercar y colocar valla en el predio para evitar que personas puedan entrar a talar árboles y realizar afectaciones que puedan colocar en peligro las especies que se encuentran en dicho terreno, realizar visitas constantes.
IPLTUNJA-0001	Terreno Urbano Casa Urbana Escuela de Artes y Auditorio Carrera 8 No. 21 - 23 Municipio de Tunja.	1,496,208,000.00	1,496,208,000.00	1,612,954,636.87	-	116,746,637	Ficha técnica de fecha 29/10/2020 valor terreno $5.310.000 valor de la construcción $975.000 total $6.285.000, en servicio, terreno rural para la antena de la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá, certificado de tradición de fecha 18/06/2021 anotación No. 10 a: Departamento de Boyacá en anotación 15 Sentencia Juzgado IV saneamiento titulación a; González Gutiérrez Margarita, proceso de aclaración de pertenencia sin fecha demandante : Departamento de Boyacá demandado Wenseslago Ayala y Leopoldina González, estudio de título sin fecha recomendaciones: Iniciar proceso de pertenencia una vez recaudado el material probatorio. Debe incorporase en la cuenta IPL incluir en el inventario del depto. Avalúo de febrero de 2018 Escuela de Artes y Auditorio. valor terreno $1,496,208,000, valor construcción 1 $73,800,000, Construcción 2 $458,468,000, auditorio $449,565,000, valor total $2,478,041,000. Ficha técnica con fecha 03/12/2021, valor terreno $1,496,208,000 valor construcción $6,144,147,490,47 valor total $7,640,355,490,47. Impuesto predial hasta 2025. Certificado catastral especial con fecha 23/05/2023 en el cual aparece como nombre de propietarios Colegio Departamental Silvino Rodríguez, Certificado Catastral Especial municipio de Tunja, con fecha 11/08/2025, por identificar. Ficha técnica con fecha 03/07/2025, valor terreno $1,496,208,000, valor construcción $6,144,147,490,47 valor total $7,640,355,490,47. Avalúo catastral superior al avalúo comercial.
TOTAL					-	269,800,493	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Terreno Rural

Tabla 34 TERRENO RURAL

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_ COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-147203	Terreno Rural Vereda Pirgua Municipio de Tunja. Escritura Pública No.3251 de diciembre 27 de 2007 Notaría Segunda de Tunja	145,109,400.00	145,109,400.00	329,616,000	-	184,506,600	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $145.109.400 valor comercial igual, en servicio Jardín Botánico José Joaquin Camacho y lago de Tunja, certificado de tradición de fecha 29/11/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025, estudio de título sin fecha recomienda solicitan hacer trámites para que el predio vuelva ser parte del lote denominado finca El Curubal, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $145.109.400, certificado de tradición con fecha 25/07/2024 a: Departamento de Boyacá. Ficha técnica de fecha 06/06/2025 valor terreno $145.109.400 valor comercial igual, en servicio Jardín Botánico José Joaquin Camacho y lago de Tunja, certificado de tradición de fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial hasta 2025,
070-8221/Lote 1	Terreno Rural Granja Agrícola Vereda Centro Municipio de Villa de Leyva. Escritura Pública No. 476 de mayo 28 de 1942 Notaría Primera de Tunja.	2,177,520,000.00	2,177,520,000.00	237,794,610	-	28,835,404,196	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno granja agrícola $2.177.520.000, valor construcción $109.800.000 valor total $2.287.320.000 en comodato al municipio de Villa de Leyva, cabaña valor terreno $2.797.523.200 valor construcción $295.050.000, valor total $3.092.573.200 no explotados y terreno rural entregado al depto.; terreno rural base fuerzas militares $987.436.800, valor terreno igual está en otros el lote de terreno está dividido en tres partes 2 de ellas se encuentran en comodato y en la 3 se encuentra una base militar sin legalizar tenencia; certificado de tradición 05/12/2023 de: Departamento de Boyacá a Universidad Nacional de Colombia. Impuesto predial con paz y salvo hasta el 2022, estudio de títulos sin fecha: recomendaciones: Incluir el predio en los bienes del departamento y en los estados financieros del depto. Avalúo de febrero de 2018 Granja agrícola: valor terreno $2.177.520.000, construcción 4 $14.940.000, construcción 5 $28.980.000, construcción 6$17.840.000, construcción 7$36.840.000, ramada $11.200.000 valor construcciones $109.800.000 valor total $2.287.320.000; Lote 2 Corpoboyacá valor Terreno $2.797.523.200, cabaña Bachué $14.000.000, Cabaña Bochica $8.250.000, cabaña y auditorio $172.800.000 almacén trabajadores $100.000.000 valor construcciones $295.050.000 valor total $3.092.573.200; lote 3 base fuerzas militares $987.436.800 valor total el mismo. Valor total del inmueble $6.367.330.000. La tercera parte del terreno Rural, se encuentra una Base Fuerzas Militares, sin legalizar la tenencia., impuesto predial hasta el 2023. Certificado de tradición con fecha 5 de diciembre de 2023 de Departamento de Boyacá, Ministerio de Defensa Nacional - Ejecito Nacional y Universidad Nacional, certificado de tradición con fecha 17 de septiembre de 2024 departamento de Boyacá a: Ministerio de Defensa y Universidad Nacional, certificado de tradición con fecha 9 de enero de 2025 De: Departamento de Boyacá a Universidad Nacional y a Ministerio de Defensa. Avalúo con fecha 17 de enero de 2025. Valor del Predio 1 $56,493,346,000, Valor de la construcción de un piso de la Granja Agrícola $43,377,068, Valor de la Construcción Casa deposito $5,639,850, Valor de la construcción base, Batallón de Infantería, No. 2 Marcial Antonio José de Sucre $65,074,063, valor del terreno de 38,000mt2 y construcción de la Granja Agrícola de Villa de Leyva $56,542,362,918, Predio No. 2 Granja Agrícola valor $31,012,924,196. Otras construcciones Granja Agrícola Valor $12,484,989. Valor de la Construcción Cabaña Bachué $9,375,000. Valor de la construcción Cabaña auditorio en tres niveles $369,600,000. Valor de la construcción depósito de vivienda trabajadores $107,791,666, valor final de la construcción terreno N. 2 $626,518,321, Valor terreno No. 2 más las construcciones $31,639,442,517. Valor final de la Granja Agrícola de Villa de Leyva $88,181,805,435.

070-89838	Terreno Rural Vereda Pirgua Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 2294 de septiembre 14 de 2015 Notaría Cuarta de Tunja.	12,942,900.00	12,942,900.00	132,246,000	-	119,303,100	Terreno cedido por el municipio de Tunja, para la construcción del Centro de Atención especializada CAE. Ficha técnica de fecha 26/04/2022 valor terreno $12.942.900 valor comercial igual, no explotado, funciona Centro de Atención Especializada CAE, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2025, estudio de títulos no adjunta, avalúo de fecha mayo de 2018 valor terreno $12.942.900. Terreno cedido por el municipio de Tunja, para la construcción del Centro de Atención especializada CAE. Ficha técnica de fecha 21/05/2024 valor terreno $12.942.900 valor comercial igual, no explotado, funciona Centro de Atención Especializada CAE, certificado de tradición de fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá. Ficha técnica de 28/05/2025 valor terreno $12.942.900 valor comercial igual, no explotado, funciona Centro de Atención Especializada CAE.
072-13382	Terreno Rural denominado "El Tablón" Vereda Cubo Municipio de Caldas. Escritura Pública No.382 de marzo 12 de 1981 Notaría Segunda de Tunja.	19,500,000.00	19,500,000.00	22,845,000	-	3,345,000	Ficha técnica de fecha 30/11/2020 valor terreno $19.500.000 valor construcción $0.00 valor total $19.500.000, no explotado. Para resevera, certificado de tradición de fecha 25/02/2022 a: secretaria de Obras Públicas de Boyacá, impuesto predial hasta 2025 no está cancelado, estudio de título septiembre 02/2019 recomienda: Mantenerlo en los estados financieros y oficiar IGAC para que allegue planos del terreno. Avalúo de febrero de 2018 valor terreno $19.500.000. Certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: Secretaria de Obras Públicas de Boyacá.
074-15763	Terreno Rural Antigua Planta Bienestarina Vereda El Salitre Municipio de Paipa. Escritura Pública No.749 de Julio 18 de 1939 Notaría Primera de Tunja.	263,523,000.00	263,523,000.00	231,883,071	263,523,000	-	Ficha técnica de fecha 18/07/2023 valor terreno $263.523.000, valor construcción $685.620.000 valor total 949.143.000, certificado de tradición de fecha 18/09/2023 anotación 261 de: Departamento de Boyacá a: Policía Nacional anotación 262 de: Ministerio de Cultura. Impuesto predial a nombre de Instituto Financiero de Boyacá, cancelado hasta 2023. Avalúo de julio de 2018, valor bodega $496.980.000, valor construcción $188.640.000, valor terreno $263.523.000, valor total $949.143.000. Estudio de títulos sin fecha sin archivar recomendaciones: 1. requerir al INFIBOY... 2. Requerir al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR... 3. Requerir a la oficina de registros e instrumentos públicos del municipio de Duitama. 4. Solicitar la entrega del inmueble al INFIBOY con el fin de incluirlo en los estados financieros del departamento. Certificado de tradición de fecha 19/12/2024 a nombre De: Departamento de Boyacá a: Policía Nacional. Anotación 261 de fecha 25/05/2005. Con oficio de fecha13/11/2024 la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de Servicios Administrativo, solicita la entrega formal del inmueble identificado con matrícula predial 074-15763. POR LO EXPUESTO SE DEBE RECLASIFICAR
078-31115	Terreno Rural Granja Agrícola de San Luis de Gaceno Vereda El Cairo. Escritura Pública No.210 del 17 de febrero de 1956 de la Notaría Segunda de Tunja	486,000,000.00	486,000,000.00	55,094,531	486,000,000	-	Ficha técnica de fecha 27/03/2023 valor terreno $486.000.000 valor construcción $90.325.700, valor total $576.325.700, no explotados, inmueble entregado en comodato al municipio de San Luis de Gaceno, certificado de tradición del 17/02/2022 de: Gobernación de Boyacá a: Grupo de energía de Bogotá. Impuesto predial paz y salvo hasta 2023, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $486.000.000 valor construcción 1 $38.916.000 construcción 2 $33.255.700, construcción 3 $18.154.000 valor total $576.325.700. Ficha técnica de fecha 23/05/2024 Valor terreno $486.000.000 valor construcción $90.325.700 Valor total $576.325.700. Contrato de Comodato No.02035 de diciembre 26 de 2017 celebrado con Municipio de San Luis de Gaceno NIT.891.802.151-9. Ficha técnica con fecha 25 de junio de 2025: Valor terreno $486.000.000, valor construcción $90.325.700 valor total comercial $576.325.700, entregado en comodato al municipio de San Luis de Gaceno, certificados de tradición con fechas 21 de agosto y 12 de noviembre de 2025 de: Gobernación de Boyacá a: Grupo Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
078-3889	Terreno Rural Puesto de Salud Vereda Bancos de Páramo Municipio Garagoa. Resolución No. 0444 de octubre 23 de 2009 de la Secretaría General del Departamento de Boyacá.	1,248,480.00	1,248,480.00	2,488,155	-	1,239,675	Ficha técnica de fecha 05/07/2022 valor terreno $1.248.480 valor construcción $1.836.900 valor total $3.085.380 en servicio, no explotado puesto de salud vereda Bancos del Páramo de Garagoa, impuesto predial hasta 2022, certificado de tradición de fecha 05/08/2021 a: depto. de Boyacá, estudio de títulos sin fecha recomendaciones: permanecer en los estados financieros del depto. hacer entrega por parte de la Secretaria de Salud del departamento al municipio de Garagoa para su administración, incluir el predio en los bienes del depto. avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $1.248.480 valor construcción $1.836.900, valor total $3.085.380. Certificado de tradición con fecha 10

							de marzo de 2025 de a: Departamento de Boyacá. Valor Catastral superior al valor comercial Terreno. Estudio e títulos sin fecha recomiendan: Debe permanecer en los estados financieros del departamento de Boyacá. Hacer entrega por parte de la Secretaria de Salud del departamento de Boyacá al municipio de Garagoa para que administre el puesto de salud, incluir el predio en los bienes del Departamento.
079-26807	Terreno Rural Granja Agrícola El Porvenir Vereda Guavita Municipio de Guayatà. Escritura Pública No 224 de marzo 12 de 1938 Notaría Primera de Tunja. Escritura Pública No.895 de octubre 03 de 1940 Notaría Segunda de Tunja.	58,104,000.00	58,104,000.00	49,196,162	58,104,000	-	Ficha técnica de fecha 03/11/2020 Valor terreno $58.104.000, valor construcción $ 285.974.100, valor total $344.078.100, arrendada a la Corporación Agropecuaria del Oriente CANNOR para el funcionamiento de la Granja Agrícola EL PORVENIR, como contraprestación pagar el impuesto predial. Certificado de tradición de fecha 22/02/2022 DE: Municipio de Guayatá a: DEPARTAMENTO DE BOYACA matrícula 079-26807 y aparece certificado de tradición de matrícula 079-26805 de fecha 22/02/2022 de LEON RUBIANO PEDRO a: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Impuesto predial hasta año 2022. Aparece informe de visita de campo de fecha 06/04/2021 en recomendaciones existe un contrato de arrendamiento del departamento de Boyacá con CANNOR desde el año 2005 y lo han venido prorrogando cada cinco años, en solicitud el Alcalde de ceder predio informan que no es posible. Estudio de títulos de fecha 21/07/2021 recomienda actualizar avalúo comercial del inmueble en razón a que la vigencia del mismo es de 3 años. Aparece Ordenanza No. 0003 de fecha 27/04/2009, por el cual se autoriza al Gobernador a ceder un inmueble de propiedad del Departamento. Avalúo de fecha febrero de 2018, valor terreno $58.104.000, área industrial $274.882.500, construcción 1 $11.091.600, valor construcciones $285.974.100, valor total $344.078.100. Contrato de Arrendamiento Sin Número de noviembre 02 de 2005 Corporación Agropecuaria del Oriente NIT. 820.003.983-3. Contrato de Arrendamiento Sin Número de noviembre 02 de 2005 Corporación Agropecuaria del Oriente NIT. 820.003.983-3. SE DEBE RECLASIFICAR POR CUANTO ESTA CEDIDO. Certificado de tradición con fecha 03/04/2025 A: Departamento de Boyacá, Impuesto predial hasta 2025.
082-19230	Terreno Rural Vereda Morro Arriba Escuela Morro Arriba Municipio de Miraflores. Escritura Pública No. 392 de noviembre 07 de 1944 Notaria Única Miraflores.	6,336,000.00	6,336,000.00	20,143,586	-	13,807,586	Ficha Técnica: 13/09/2023, Valor terreno $6.336.000 valor construcción $39.600.000 Valor total Comercial: $45.936.000. Destinación: En servicio, escuela Morro Arriba vereda Morro de Miraflores, Avalúo Comercial: febrero de 2018, Valor Terreno $6.336.000 valor construcción 1 $39.600.000 Valor Total $45.936.000. Certificado de Tradición y Libertad 5 de febrero de 2020 a nombre del Departamento de Boyacá. Impuesto predial: Oficio N° ACL-1026 de la Alcaldía de Miraflores dando respuesta al termino de Prescripción del impuesto predial. En el expediente no tiene recibo ni liquidación del impuesto predial. Certificado de tradición de fecha 23/02/2022 a: Departamento de Boyacá. Certificado de existencia catastral con fecha 27/10/2022 avalúo actual $69.971.000 a nombre del municipio de MIRAFLORES... LOTE PARA ESCUELA VEREDA EL MORRO DEL MUNICPIO DE MIRAFLORES, certificado de existencia catastral con fecha 12/08/2024 avalúo de $75.320.000 a nombre de Municipio de MIRAFLORES. Estudio de títulos sin fecha recomendaciones: Debe continuar incorporado a los estados financieros y en el inventario del departamento de Boyacá. VALOR CATASTRAL $64.931.034. certificado de tradición con fecha 20/03/2025 a: Departamento de Boyacá
TOTAL					807,627,000	29,157,606,157	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Terreno Urbano.

Tabla 35 TERRENO URBANO

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_ COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACI	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES

070-102258	Terreno Urbano Transversal 9 No. 29A - 05 Casa Fiscal Barrio Maldonado Municipio de Tunja. Escritura Pública No.1548 de diciembre 05 de 1960 Notaría Primera de Tunja	62,253,000.00	62,253,000.00	109,556,842	-	47,303,842	Ficha técnica de fecha 05/11/2020 valor terreno $62.253.000 valor construcción $93.036.800 valor total $155.289.800 en convenio marco interadministrativo atención y reparación a las víctimas y el municipio de Tunja, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de títulos de fecha 17/09/2018 recomendaciones: permanecer en los estados financieros y en los inventarios del departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $62.253.000 valor construcción antigua $47.520.000, construcción reciente apartamento $45.516.800 valor total construcción $93.036.800, valor total $155.289.800. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá, con fecha 14/12/1960 anotación No. 1. Valor catastral mayor a avalúo y al balance. VALOR CATASTRAL $109.556.842.22.
070-102261	Terreno Urbano Casa Fiscal Maldonado, Diagonal 30 No. 8A - 71 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.1548 de diciembre 05 de 1960 Notaria Primera de Tunja.	117,902,400.00	117,902,400.00	140,908,957	117,902,400	-	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $117.902.400 valor construcción $80.274.000 valor total $198.176.400 no explotados, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2023, estudio de título con fecha julio de 2018, recomendación: Continúen en los inventarios del departamento y en los estados financieros, restitución del inmueble por parte de Indeportes (uso indebido), es procedente mantener el predio dentro de los inventarios y estados financieros del departamento de Boyacá. Avalúo marzo de 2018 valor terreno $117.902.400, valor construcción $80.274.000 valor total $198.176.400. Reclasificación IPL. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $117.902.400, valor construcción $80.274.000 valor total $198.176.400, No explotados. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá, con fecha 14/12/1960 anotación No. 1. Entregada en Comodato a INDEPORTES desde el 17 de enero de 2006. Impuesto predial hasta 2025, Certificado de tradición con fecha 10/06/2025 de: Instituto de Crédito Territorial a DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Aparece en los estados financieros de las 2 Entidades.
070-15390	Terreno Urbano Transversal 5 No. 67 - 10 Casa Fiscal. Barrio Los Muiscas Municipio de Tunja. Escritura Pública No.1808 de octubre 22 de 1979 Notaría Segunda de Tunja.	31,850,000.00	31,850,000.00	47,914,382	-	16,064,382	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $31.850.000 valor construcción $49.956.000, valor total $81.806.000, no explotados, certificado de tradición de 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de títulos con fecha 05/10/2018, recomendación: Que se mantenga en los inventarios y estados financieros del departamento de Boyacá, avalúo de marzo de 2018 valor terreno $31.850.000, valor construcción $49.956.000, valor total $81.806.000. Funciona Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos del Departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $31.850.000 construcción $49.956.000 valor total $81.806.000 no explotado. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá, con fecha 07/11/1979 anotación No. 2. Funciona Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos del Departamento de Boyacá. Certificado de tradición con fecha 9 de enero de 2025, de: Departamento de Boyacá, Impuesto predial 2025, falta comprobante de banco, ficha técnica con fecha 28/05/2025 Valor terreno $31,850,000 valor construcción $49,956,000 valor total comercial $81,806,000. Se presenta diferencia respecto al valor catastral con el valor del avalúo.
070-18741	Terreno Urbano Carrera 10B No. 28A - 52 /64 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.2945 de diciembre 30 de 2004 Notaría Segunda de Tunja.	421,470,000.00	421,470,000.00	587,621,623	-	166,151,623	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $421.470.000 valor construcción $451.440.000 valor total $872.910.000, en servicio, en comodato, certificado de tradición de fecha 24/09/2018 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial hasta 2023, estudio de títulos sin fecha, recomendación: debe continuar en los archivos y en los inventarios del depto., legalizar el comodato; avalúo de fecha 02/2018 valor terreno $241. 470.valor construcción $451.440.000, valor total $872.910. 000.. Contrato de Comodato No.2344 de diciembre 21 de 2018 celebrado con Defensa Civil Colombiana. NIT. 899.999.971-7. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $421.470.000, valor construcción $451.440.000 valor total $872.910.000. Certificado de tradición con fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá con fecha 20/01/2005 anotación No. 3. Valor catastral superior al valor del avalúo y al del balance. Pago impuesto predial hasta 2025. Ficha técnica con fecha 25/06/2025 Valor terreno $421,470,000, valor construcción $451,440,000 valor total $872,910,000. Acta de entrega y supervisión con fecha 26/12/2025 entrega a DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, fecha terminación 15/12/2027.

070-270	Terreno Urbano Casa Privada del Señor Gobernador Calle 32 No.2 - 54 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.710 de abril 28 de 1978 Notaria Primera de Tunja	1,652,960,000.00	1,652,960,000.00	1,837,325,395	-	184,365,395	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $1.652.960.000 valor construcción $1.303.457.500 valor total $2.956.417.500, en servicio casa privada del señor Gobernador, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de título sin fecha recomendación debe permanecer en los estados financieros del depto. Avalúo febrero de 2018, valor terreno $1.652.960.000 valor construcción principal $807.764.000 bodega $67.288.000, garaje $158.404.500 cerramiento $270.000 valor construcción $1.303.457.500, valor total $2.956.417.500. Ficha técnica de fecha 21/05/2024 valor terreno $1.652.960.000 valor construcción $1.303.457.500 Valor Total $2.956.417.500, Casa privada del señor Gobernador. Valor catastral superior al balance. Pago de impuesto hasta 2025, Ficha técnica con fecha 03/06/2025 valor terreno $1,652,960,000, valor construcción $1,303,457,500, valor total comercial $2,956,417,500. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 de: MALAVER PARADA CAYO LEONIDAS A: CHAPARRO CASTAÑEDA CARLOS, No aparece a nombre del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, está mal clasificado IPL, Se presenta diferencia entre el valor catastral y el valor del avalúo. Impuesto predial cancelado hasta 2025.
070-3828	Terreno Urbano Casa Fiscal Barrio Los Muiscas Transversal 1 No. 67 - 18 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.1808 de octubre 22 de 1979 Notaría Segunda de Tunja.	29,400,000.00	29,400,000.00	43,924,508	-	14,524,508	Ficha técnica de fecha 11/05/2022 valor terreno $29.400.000 valor construcción $47.797.200 valor total $77.197.200, no explotado, certificado de tradición de 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial hasta 2023, estudio de título sin fecha recomendación: permanecer en los estados financieros y en los inventarios del departamento de Boyacá, avalúo de marzo de 2018 valor terreno $29.400.000 valor construcción $47.797.200 valor total $77.197.200. En comodato a los padres SOMASCOS como vivienda para los niños de la guerra. Ficha técnica de fecha 21/05/2024 valor terreno $29.400.000 valor construcción $47.797.200 valor total $77.197.200 No explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá con fecha 07/11/1979 anotación No. 3. Valor catastral superior al avalúo. Ficha técnica con fecha 29/05/2025 valor terreno $29,400,000 valor construcción $47,797,200, valor total comercial $77,197,200, acta de entrega de supervisor 26/12/2025 objeto entrega en comodato asociación grupo de veteranos de la fuerza pública un inmueble Manzana 24 casa 3 transversal 1 No. 67-18 Barrio Los Muiscas terminación 30/12/2027.
070-68717	Terreno Urbano Carrera 14 No. 3 - 17 "Casa del Menor Marco Fidel Súarez " Municipio de Tunja. Escritura Pública No.130 de febrero 06 de 1940 Notaría Primera de Tunja	1,920,300,000.00	1,920,300,000.00	2,266,246,897	-	345,946,897	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción $1.116.288.000 en servicio valor comercial $3.036.588.000 casa del menor Marco Fidel Suárez contrato de comodato. Certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto hasta 2021, estudio de títulos de fecha 05/10/2018 recomendaciones: mantenerse en los inventarios y estados financieros del depto., solicita que se incorpore en la escritura pública del inmueble. Avalúo de fecha marzo de 2018 valor terreno $1.920.300.000 valor construcción 1 $212.586.000, construcción 2 $318.613.000, construcción 3 $523.445.000, construcción 4 $27.000.000 Cerramiento $34.644.000. valor construcciones $1.116.288.000 valor total $3.036.588.000. Contrato de Comodato No.0946 del febrero 18 de 2020.celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Igualmente se informa que el área del Cerramiento es de 577.40 metros lineales. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial: exento. Acta de cierre de comodato con fecha 31/07/2023. En la cual se dispone: Cerrar el expediente y ordenar el archivo del comodato... Contrato de Comodato No.0946 de febrero 18 de 2020, celebrado con Casa del Menor Marco Fidel Suárez Nit.891.801.333-8. Certificado de tradición con fecha 09/01/2024 A: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024. Avalúo Catastral esta por encima del avalúo comercial.
078-23138	Terreno Urbano Parte del Terminal de Transportes de Garagoa Calle 13 No. 11 - 85 Municipio de Garagoa. Escritura Pública No. 421 de junio 25 de 1965 Notaría Única de Garagoa.	126,000,000.00	126,000,000.00	127,416,000	-	1,416,000	Ficha técnica de fecha 28/10/2020 valor terreno$126.000.000 valor comercial $126.000.000, en servicio, parte del terminal de transportes de Garagoa, certificado de tradición de fecha 17/02/2022 a: Departamento de Boyacá, recibos de impuesto predial exento, estudio de título no se adjunta, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $126.000.000 valor total $126.000.000. No cuenta con ningún cambio.

078-23139	Terreno Urbano Colegio San Luis de Gaceno Carrera 3 No. 5 - 08 Municipio de San Luis de Gaceno. Escritura Pública No. 1364 de diciembre 23 de 1973 Notaría Única de Garagoa.	185,658,000.00	185,658,000.00	284,813,000	-	99,155,000	Ficha técnica con fecha 23/05/2024 valor terreno $185.658.000, valor construcción $0 valor total $185.658.000 no explotado, sin uso la edificación fue demolida para construir un nuevo colegio. Avalúo de febrero de 2018 valor terreno $185.658.000 valor construcción antigua $547.288.000 construcción reciente $73.309.600 canchas $48.180.000 cerramiento 1 $13.806.000 cerramiento 2 $20.938.000, valor construcciones $703.521.600 valor total $889.179. 600.Estudio de títulos sin fecha recomendaciones. - Excluir de los inventarios y de los estados financieros del departamento la planta física o construcción del colegio, mediante acta de inicio No. 01 el municipio de San Luis de Gaceno inicio el contrato No. C-MSLG-MC 057-2018, objeto "Apoyo a la demolición de la construcción existente de la Institución Educativa San Luis de Gaceno para la construcción de la nueva planta física" se evidencia dentro del expediente que el objeto del contrato llego a su culminación y fue entregado el día 13/07/2018. Los terrenos urbanos deben continuar incorporado en los inventarios y estado financiero del Departamento de Boyacá, Impuesto predial cancelado hasta año 2025, certificado de tradición con fecha 10/03/2025 a Departamento de Boyacá anotación No. 1 con fecha 13/01/1974. Ficha Técnica con fecha 26/06/2025 Valor terreno $185,658,000. construcción $0,00 Valor total $185,658,000. Informe parcial de supervisión con fecha 27/06/2025. Solicitud de modificación/suspensión/terminación.
079-11411	Terreno Urbano Colegio Las Mercedes Sección Internado Carrera 6 No. 9A - 61 Municipio de Guayatà. Acta de Cesión del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	284,425,000.00	284,425,000.00	320,104,145	-	35,679,145	Ficha Técnica: 02 de agosto 2022, Valor terreno $284.425.000 valor construcción $508.620.000 Valor total: $793.045.000. no explotado, funciona El Colegio las Mercedes Sección Internado de Guayatá, Matricula Inmobiliaria con fecha 22 de febrero de 2022 a nombre del Departamento de Boyacá. Avalúo Comercial de febrero 2018, valor terreno $284.425.000 construcción 1 $358.560.000 construcción 2 $134.760.000, construcción 3 $15.300.000 Valor construcciones $508.620.000 valor total de $793.045.000, Impuesto predial: Acuerdo N° 015 de fecha 27 de diciembre de 2014, articulo 8, exención de Impuestos. Estudio de títulos de fecha 18 de Julio de 2021, recomendaciones Jurídicas y Administrativas: 1. Abstenerse de entregar el inmueble en comodato, toda vez que el fin pretendido por el Alcalde de Guayatá es diferente al de prestación de servicio público educativo estatal y contrario a lo expresamente contenido en el acta de cesión y las disposiciones legales vigentes. 2. Solicitar concepto jurídico al MEN, en caso de insistir en la celebración de comodato entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Guayatá. Certificado de tradición con fecha 03/04/2025 a: Departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 25/06/2025 Valor terreno $284,425,000 valor construcción $508,620,000 valor total $793,045,000.
095-94197	Terreno Urbano Colegio Liceo Cooperativo Campestre Transversal 8 No.2 - 105 Municipio de Sogamoso. Escritura Pública No. 704 de agosto 19 de 1941 Notaría Primera de Tunja.	1,015,380,000.00	1,015,380,000.00	1,794,687,867	-	779,307,867	Ficha Técnica: 26 de abril 2022. Valor terreno $1.015.380.000 valor construcción $939.532.500 Valor total: $1.954.912.500. en comodato a Cooperativa de trabajadores de Acerías Paz de Rio, funciona el Liceo Cooperativo Campestre Consideraciones del Avaluó: Se aclara que este inmueble tiene varias construcciones por tal razón tiene varias vidas remanentes según componentes: C1, C3, C4, C5, C6, Patio; Cerramiento y cancha múltiple = 45 años; y C2 = 95 años. El predio cuenta con un cerramiento de 126 metros lineales con un valor de $6.300.000 que está incluido en el valor total de las construcciones. Destinación: En comodato. Impuesto predial pago hasta el año 2023 por valor de $1.374.687. Avaluó comercial: febrero 2018 valor terreno $1.015.380.000 valor construcción 1 $810.000.000 construcción 2 $60.912.500 patio $28.440.000 canchas $33.880.000 cerramiento $6.300.000 valor construcciones $939.532.500 valor total: $1.954.912.500. Certificado de Tradición y libertad: 01 de junio de 2021 a Nombre del Departamento de Boyacá. Contrato de Comodato de fecha 08 de febrero de 1980 el Departamento de Boyacá, y la cooperativa de trabajadores de Acerías Paz del Rio COOTRAPAZDELRIO, firman un contrato de COMODATO dando el Departamento de Boyacá el inmueble identificado con folio de Matricula N°095-94197 y COOTRASOG se compromete a la construcción de un colegio de primaria y bachillerato. Así mismo el término del Contrato de Comodato seria por el tiempo de 99 años prorrogables por voluntad de las partes. Estudio de Títulos sin fecha, recomendaciones: 1. El Departamento de Boyacá debe iniciar las acciones administrativas y judiciales para la resolución del contrato de Comodato suscrito. 2. Ejecutar un contrato de sesión del inmueble con la Alcaldía del

							municipio de Sogamoso, ya que este ente territorial está certificado en educación según la Ley 715 año 2021. 3. De presentarse una eventual renegociación y renovación del contrato de comodato por voluntad de las partes, el Departamento de Boyacá debe actualizar la normatividad especial y contable que regula la atinente a los contratos de comodato, a fin de continuar con el control del activo. Contrato de Comodato Sin Número de febrero 08 de 1980 celebrado con Cooperativa de Trabajadores de Acerías Paz del Río actualmente Cooperativa Especializada en Educación "COOTRAPAZDELRIO". Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 a: Departamento de Boyacá. Certificado de paz y salvo impuesto predial hasta año 2023. Ficha técnica con fecha 20/07/2025 Valor terreno $1,015,380,000 valor construcción $939,532,500 valor total $1,954,912,500. Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 a: Departamento de Boyacá.
TOTAL					117,902,400	1,689,914,659	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Colegios y Escuelas

Tabla 36 COLEGIOS Y ESCUELAS

MAT_anterior	UBICACION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
079-11411	Carrera 6 No.9A - 61 Municipio de Guayatá	508,620,000.00	508,620,000.00	572,422,855	-	63,802,855	Ficha Técnica: 02 de agosto 2022, Valor terreno $284.425.000 valor construcción $508.620.000 Valor total: $793.045.000. no explotado, funciona El Colegio las Mercedes Sección Internado de Guayatá, Matricula Inmobiliaria con fecha 22 de febrero de 2022 a nombre del Departamento de Boyacá. Avalúo Comercial de febrero 2018, valor terreno $284.425.000 construcción 1 $358.560.000 construcción 2 $134.760.000, construcción 3 $15.300.000 Valor construcciones $508.620.000 valor total de $793.045.000, Impuesto predial: Acuerdo N° 015 de fecha 27 de diciembre de 2014, articulo 8, exención de Impuestos. Estudio de títulos de fecha 18 de Julio de 2021, recomendaciones Jurídicas y Administrativas: 1. Abstenerse de entregar el inmueble en comodato, toda vez que el fin pretendido por el Alcalde de Guayatá es diferente al de prestación de servicio público educativo estatal y contrario a lo expresamente contenido en el acta de cesión y las disposiciones legales vigentes. 2. Solicitar concepto jurídico al MEN, en caso de insistir en la celebración de comodato entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Guayatá. Certificado de tradición con fecha 03/04/2025 a: Departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 25/06/2025 Valor terreno $284,425,000 valor construcción $508,620,000 valor total $793,045,000.
082-19230	Vereda Morro Arriba Municipio de Miraflores	39,600,000.00	39,600,000.00	125,897,414	-	86,297,414	Ficha Técnica: 13/09/2023, Valor terreno $6.336.000 valor construcción $39.600.000 Valor total Comercial: $45.936.000. Destinación: En servicio, escuela Morro Arriba vereda Morro de Miraflores, Avalúo Comercial: febrero de 2018, Valor Terreno $6.336.000 valor construcción 1 $39.600.000 Valor Total $45.936.000. Certificado de Tradición y Libertad 5 de febrero de 2020 a nombre del Departamento de Boyacá. Impuesto predial: Oficio N° ACL-1026 de la Alcaldía de Miraflores dando respuesta al termino de Prescripción del impuesto predial. En el expediente no tiene recibo ni liquidación del impuesto predial. Certificado de tradición de fecha 23/02/2022 a: Departamento de Boyacá. Certificado de existencia catastral con fecha 27/10/2022 avalúo actual $69.971.000 a nombre del municipio de MIRAFLORES. . LOTE PARA ESCUELA VEREDA EL MORRO DEL MUNICPIO DE MIRAFLORES, certificado de existencia catastral con fecha 12/08/2024 avalúo de $75.320.000 a nombre de Municipio de MIRAFLORES. Estudio de títulos sin fecha recomendaciones: Debe continuar incorporado a los estados financieros y en el inventario del departamento de Boyacá. VALOR CATASTRAL $64.931.034. certificado de tradición con fecha 20/03/2025 a: Departamento de Boyacá

095-94197-C2	Transversal 8 No. 2 - 105 Municipio de Sogamoso	60,912,500.00	60,912,500.00	107,663,067	-	46,750,567	Ficha Técnica: 26 de abril 2022. Valor terreno $1.015.380.000 valor construcción $939.532.500 Valor total: $1.954.912.500. en comodato a Coopeativa de trabajadores de Acerías Paz de Rio, funciona el Liceo Cooperativo Campestre Consideraciones del Avaluó: Se aclara que este inmueble tiene varias construcciones por tal razón tiene varias vidas remanentes según componentes: C1, C3, C4, C5, C6, Patio; Cerramiento y cancha múltiple = 45 años; y C2 = 95 años. El predio cuenta con un cerramiento de 126 metros lineales con un valor de $6.300.000 que está incluido en el valor total de las construcciones. Destinación: En comodato. Impuesto predial pago hasta el año 2023 por valor de $1.374.687. Avaluó comercial: febrero 2018 valor terreno $1.015.380.000 valor construcción 1 $810.000.000 construcción 2 $60.912.500 patio $28.440.000 canchas $33.880.000 cerramiento $6.300.000 valor construcciones $939.532.500 valor total: $1.954.912.500. Certificado de Tradición y libertad: 01 de junio de 2021 a Nombre del Departamento de Boyacá. Contrato de Comodato de fecha 08 de febrero de 1980 el Departamento de Boyacá, y la cooperativa de trabajadores de Acerías Paz del Rio COOTRAPAZDELRIO, firman un contrato de COMODATO dando el Departamento de Boyacá el inmueble identificado con folio de Matricula N°095-94197 y COOTRASOG se compromete a la construcción de un colegio de primaria y bachillerato. Así mismo el término del Contrato de Comodato seria por el tiempo de 99 años prorrogables por voluntad de las partes. Estudio de Títulos sin fecha, recomendaciones: 1. El Departamento de Boyacá debe iniciar las acciones administrativas y judiciales para la resolución del contrato de Comodato suscrito. 2. Ejecutar un contrato de sesión del inmueble con la Alcaldía del municipio de Sogamoso, ya que este ente territorial está certificado en educación según la Ley 715 año 2021. 3. De presentarse una eventual renegociación y renovación del contrato de comodato por voluntad de las partes, el Departamento de Boyacá debe actualizar la normatividad especial y contable que regula la atinente a los contratos de comodato, a fin de continuar con el control del activo. Contrato de Comodato Sin Número de febrero 08 de 1980 celebrado con Cooperativa de Trabajadores de Acerías Paz del Río actualmente Cooperativa Especializada en Educación "COOTRAPAZDELRIO". Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 a: Departamento de Boyacá. Certificado de paz y salvo impuesto predial hasta año 2023. Ficha técnica con fecha 20/07/2025 Valor terreno $1,015,380,000 valor construcción $939,532,500 valor total $1,954,912,500. Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 a: Departamento de Boyacá. Contrato de Comodato Sin Número de febrero 08 de 1980 celebrado con Cooperativa de Trabajadores de Acerías Paz del Río actualmente Cooperativa Especializada en Educación "COOTRAPAZDELRIO"
					-	196,850,835	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Clínicas – Hospitales

Tabla 37 CLINICAS Y HOSPITALES

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
078-3889	Puesto de Salud Vereda Banco de Páramo Municipio Garagoa. Resolución No. 0444 del octubre 23 de 2009 de la Secretaría General del Departamento de Boyacá.	1,836,900.00	1,836,900.00	3,660,845.05	-	1,823,945	Ficha técnica de fecha 05/07/2022 valor terreno $1.248.480 valor construcción $1.836.900 valor total $3.085.380 en servicio, no explotado puesto de salud vereda Bancos del Páramo de Garagoa, impuesto predial hasta 2022, certificado de tradición de fecha 05/08/2021 a: depto. de Boyacá, estudio de títulos sin fecha recomendaciones: permanecer en los estados financieros del depto. hacer entrega por parte de la Secretaria de Salud del departamento al municipio de Garagoa para su administración, incluir el predio en los bienes del depto. avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $1.248.480 valor construcción $1.836.900, valor total $3.085.380. Certificado de tradición con fecha 10 de marzo de 2025 de a: Departamento de Boyacá. Valor Catastral superior al valor comercial Terreno. Estudio e títulos sin fecha recomiendan: Debe permanecer en los estados financieros del

							departamento de Boyacá. Hacer entrega por parte de la Secretaria de Salud del departamento de Boyacá al municipio de Garagoa para que administre el puesto de salud, incluir el predio en los bienes del Departamento.
083-13570	Puesto de Salud Vereda Muñones y Camachos Municipio de San José de Pare. Resolución No.0444 de octubre 23 de 2009 del a Secretaría General Departamento de Boyacá	18,818,800.00	18,818,800.00	19,198,179.73	-	379,380	Ficha Técnica de Fecha 20 de octubre de 2020, valor terreno: $1.380.000, valor construcción: $18.818.800, valor avalúo comercial: $20.198.800, en servicio, funciona puesto de salud vereda Muñones y Camachos, certificado de libertad de fecha: 10 de Julio de 2020 a Departamento de Boyacá, recibo de impuestos de 2000 a 2023 sin cancelar, petición para la declaración de silencio administrativo positivo, estudios de Títulos sin fecha recomendaciones. permanecer en los estados financiero e inventario del Departamento, hacer entrega por parte de la secretaria de salud del Departamento de Boyacá al municipio de **Floresta sic.** para que se administre. Avalúo de fecha: febrero de 2018 Terrenos: $1.380.000, valor construcción: $18.818.800, valor total: $20.198.800. Certificado de tradición con fecha 26/06/2024 A: Departamento de Boyacá. Certificado de tradición con fecha 10/04/2025 a: Departamento de Boyacá.
					-	2,203,325	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Casas Urbanas

Tabla 38 CASAS URBANAS

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_ COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-102258-C1	Casa Fiscal Barrio Maldonado Transversal 9 No. 29A - 05 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.1548 del diciembre 22 de 1960 Notaría Primera de Tunja	47,520,000.00	47,520,000.00	83,628,759.13		$36,108,759	Ficha técnica de fecha 05/11/2020 valor terreno $62.253.000 valor construcción $93.036.800 valor total $155.289.800 en convenio marco interadministrativo atención y reparación a las víctimas y el municipio de Tunja, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de títulos de fecha 17/09/2018 recomendaciones: permanecer en los estados financieros y en los inventarios del departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $62.253.000 valor construcción antigua $47.520.000, construcción reciente apartamento $45.516.800 valor total construcción $93.036.800, valor total $155.289.800. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá, con fecha 14/12/1960 anotación No. 1. Valor catastral mayor a avalúo y al balance. Valor Catastral $83.628.759.13.
070-102261	Casa Fiscal Maldonado Diagonal 30 No. 8A - 71 Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 1548 de diciembre 05 de 1960 Notaria Primera de Tunja.	80,274,000.00	80,274,000.00	95,938,043.47	80,274,000.00	$15,664,043	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $117.902.400 valor construcción $80.274.000 valor total $198.176.400 no explotados, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2023, estudio de título con fecha julio de 2018, recomendación: Continúen en los inventarios del departamento y en los estados financieros, restitución del inmueble por parte de Indeportes (uso indebido), es procedente mantener el predio dentro de los inventarios y estados financieros del departamento de Boyacá. Avalúo marzo de 2018 valor terreno $117.902.400, valor construcción $80.274.000 valor total $198.176.400. Reclasificación IPL. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $117.902.400, valor construcción $80.274.000 valor total $198.176.400, No explotados. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá, con fecha 14/12/1960 anotación No. 1. Entregada en Comodato a INDEPORTES desde el 17 de enero de 2006. Impuesto predial hasta 2025, Certificado de tradición con fecha 10/06/2025 de: Instituto de Crédito Territorial a DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Aparece en los estados financieros de las **2 Entidades**. Valor Catastral mayor que avalúo comercial. Entregada en Comodato a INDEPORTES desde el 17 de enero de 2006.

070-15390	Casa Fiscal Transversal 5 No. 67 - 10 Barrio los Muiscas Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 1808 de octubre 22 de 1979 Notaría Segunda de Tunja.	49,956,000.00	49,956,000.00	75,152,617.80		$23,007,997	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $31.850.000 valor construcción $49.956.000, valor total $81.806.000, no explotados, certificado de tradición de 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de títulos con fecha 05/10/2018, recomendación: Que se mantenga en los inventarios y estados financieros del departamento de Boyacá, avalúo de marzo de 2018 valor terreno $31.850.000, valor construcción $49.956.000, valor total $81.806.000. Funciona Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos del Departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $31.850.000 construcción $49.956.000 valor total $81.806.000 no explotado. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá, con fecha 07/11/1979 anotación No. 2. Funciona Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos del Departamento de Boyacá. Certificado de tradición con fecha 9 de enero de 2025, de: Departamento de Boyacá, Impuesto predial 2025, falta comprobante de banco, ficha técnica con fecha 28/05/2025 Valor terreno $31,850,000 valor construcción $49,956,000 valor total comercial $81,806,000. Se presenta diferencia respecto al valor catastral con el valor del avalúo. Entregada en Comodato a INDEPORTES desde el 17 de enero de 2006. Funciona Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos del Departamento de Boyacá.
070-18741	Casa Urbana Carrera 10B No. 28A - 52 /64 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.2945 de diciembre 30 de 2004 Notaría Segunda de Tunja	451,440,000.00	451,440,000.00	629,406,376.74		$177,966,377	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $421.470.000 valor construcción $451.440.000 valor total $872.910.000, en servicio, en comodato, certificado de tradición de fecha 24/09/2018 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial hasta 2023, estudio de títulos sin fecha, recomendación: debe continuar en los archivos y en los inventarios del depto., legalizar el comodato; avalúo de fecha 02/2018 valor terreno $241. 470.valor construcción $451.440.000, valor total $872.910. 000. Contrato de Comodato No.2344 de diciembre 21 de 2018 celebrado con Defensa Civil Colombiana. NIT. 899.999.971-7. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $421.470.000, valor construcción $451.440.000 valor total $872.910.000. Certificado de tradición con fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá con fecha 20/01/2005 anotación No. 3. Valor catastral superior al valor del avalúo y al del balance. Pago impuesto predial hasta 2025. Ficha técnica con fecha 25/06/2025 Valor terreno $421,470,000, valor construcción $451,440,000 valor total $872,910,000. Acta de entrega y supervisión con fecha 26/12/2025 entrega a DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, fecha terminación 15/12/2027. Contrato de Comodato No.2344 de diciembre 21 de 2018 celebrado con Defensa Civil Colombiana. NIT. 899.999.971-7
070-270	Casa Privada del Señor Gobernador Calle 32 No. 2 - 54 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.710 de abril 28 de 1978 Notaria Primera de Tunja.	1,303,457,500.00	1,303,457,500.00	1,448,840,604.87		$145,383,104	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $1.652.960.000 valor construcción $1.303.457.500 valor total $2.956.417.500, en servicio casa privada del señor Gobernador, certificado de tradición de fecha 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de título sin fecha recomendación debe permanecer en los estados financieros del depto. Avalúo febrero de 2018, valor terreno $1.652.960.000 valor construcción principal $807.764.000 bodega $67.288.000, garaje $158.404.500 cerramiento $270.000 valor construcción $1.303.457.500, valor total $2.956.417.500. Ficha técnica de fecha 21/05/2024 valor terreno $1.652.960.000 valor construcción $1.303.457.500 Valor Total $2.956.417.500, Casa privada del señor Gobernador. Valor catastral superior al balance. Pago de impuesto hasta 2025, Ficha técnica con fecha 03/06/2025 valor terreno $1,652,960,000, valor construcción $1,303,457,500, valor total comercial $2,956,417,500. Certificado de

							tradición con fecha 05/02/2026 de: MALAVER PARADA CAYO LEONIDAS A: CHAPARRO CASTAÑEDA CARLOS, No aparece a nombre del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, esta mal clasificado IPL, Se presenta diferencia entre el valor catastral y el valor del avalúo.
070-3828	Casa Fiscal Los Muiscas Transversal 1 No. 67 - 18 Barrio Los Muiscas Municipio de Tunja. Escritura Pública No 1808 de octubre 22 de 1979 Notaría Segunda de Tunja.	47,797,200.00	47,797,200.00	71,410,492.38		$23,613,292	Ficha técnica de fecha 11/05/2022 valor terreno $29.400.000 valor construcción $47.797.200 valor total $77.197.200, no explotado, certificado de tradición de 02/02/2022 a: Departamento de Boyacá, Impuesto predial hasta 2023, estudio de título sin fecha recomendación: permanecer en los estados financieros y en los inventarios del departamento de Boyacá, avalúo de marzo de 2018 valor terreno $29.400.000 valor construcción $47.797.200 valor total $77.197.200. En comodato a los padres SOMASCOS como vivienda para los niños de la guerra. Ficha técnica de fecha 21/05/2024 valor terreno $29.400.000 valor construcción $47.797.200 valor total $77.197.200 No explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá con fecha 07/11/1979 anotación No. 3. Valor catastral superior al avalúo. Ficha técnica con fecha 29/05/2025 valor terreno $29,400,000 valor construcción $47,797,200, valor total comercial $77,197,200, acta de entrega de supervisor 26/12/2025 objeto entrega en comodato asociación grupo de veteranos de la fuerza pública un inmueble Manzana 24 casa 3 transversal 1 No. 67-18 Barrio Los Muiscas terminación 30/12/2027. En comodato a los padres SOMASCOS como vivienda para los niños de la guerra.
TOTAL					$ 80,274,000	$421,743,573	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Bodegas

Tabla 39 BODEGAS

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-39800-C1	Bodega Talleres de Obras Públicas del Departamento de Boyacá Calle 31 No. 2 Este - 160 Barrio La Esmeralda Municipio de Tunja. Escritura Pública No.810 de junio 26 de 1951 Notaría Segunda de Tunja	91,560,000.00	91,560,000.00	15,163,410.88	91,560,000.00	0.00	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 Valor terreno $5.493.000.000, valor construcción $323.200.000, valor total $5.816.200.000, funciona los talleres de obras públicas y la bodega del departamento de Boyacá, certificado de tradición de fecha 14/12/2023 de: Municipio de Tunja, avalúo de fecha noviembre de 2018,valor terreno $5.493.000.000, construcción antigua $91.560.000, Bodega nueva $33.330.000, parqueadero cubierto $185.326.000, Cerramiento $12.984.000, valor total $5.816.200.000, Estudio de títulos sin fecha recomienda: Debe permanecer estados financieros, incluir el predio en los inventarios real de los bienes propiedad del departamento de Boyacá. Informe de visita de fecha 12/05/2019, recomienda: Demoler en su totalidad el cerramiento perimetral existente que no posee elementos de confinamiento por el costado occidental, junto con los muros internos que se amarran a este y presenta fisuras de fallas considerables ya que están en alto riesgo de volcamiento.... Demoler en su totalidad el pórtico en concreto reforzado de la portería ya que una de las columnas está en alto riesgo de colapso. Reemplazar las tejas translucidas de las zonas de pasillos... Desinstalar las rejillas en concreto reforzado... Demoler en su totalidad el cárcamo existente... Llevar a cabo mantenimiento de pintura y adelantar un estudio de patología y análisis de vulnerabilidad sísmica a la totalidad de

							la estructura... Estudio de vulnerabilidad sísmica sin fecha, con recomendaciones - Se determinó que el muro lateral izquierdo de las oficinas se encuentra en grave estado... el muro ... no aporta rigidez y resistencia. La mampostería del muro se encuentra suelta... la cimentación presenta daños estructurales... Aunque la mayoría de la estructura cumple con los parámetros de diseños y construcción se debe: Demoler el muro..., se debe hacer nueva estructura... Impuesto predial cancelado hasta año 2024. Ficha técnica de fecha 21 de mayo de 2024 valor terreno $5.493.000.000, valor construcción $323.200.000 valor total $5.816.200.000. Funcionan los talleres de Obras Públicas y la Bodega del departamento de Boyacá. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 De: Municipio de Tunja desde el 18/06/2013, SE DEBE RECLASIFICAR SEGÚN LO EXPUESTO. Impuesto predial cancelado hasta el año 2025. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 donde aparece de: Municipio de Tunja, se confirma que se debe reclasificar según lo expuesto. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $6,028,471,744 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
070-39800-C2	Bodega Talleres de Obras Públicas del Departamento de Boyacá Calle 31 No. 2 Este - 160 Barrio La Esmeralda Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 810 de junio 26 de 1951 Notaría Segunda de Tunja.	33,330,000.00	33,330,000.00	5,519,839.28	33,330,000.00		Ficha técnica de fecha 27/04/2023 Valor terreno $5.493.000.000, valor construcción $323.200.000, valor total $5.816.200.000, funciona los talleres de obras públicas y la bodega del departamento de Boyacá, certificado de tradición de fecha 14/12/2023 de: Municipio de Tunja, avalúo de fecha noviembre de 2018,valor terreno $5.493.000.000, construcción antigua $91.560.000, Bodega nueva $33.330.000, parqueadero cubierto $185.326.000, Cerramiento $12.984.000, valor total $5.816.200.000, Estudio de títulos sin fecha recomienda: Debe permanecer estados financieros, incluir el predio en los inventarios real de los bienes propiedad del departamento de Boyacá. Informe de visita de fecha 12/05/2019, recomienda: Demoler en su totalidad el cerramiento perimetral existente que no posee elementos de confinamiento por el costado occidental, junto con los muros internos que se amarran a este y presenta fisuras de fallas considerables ya que están en alto riesgo de volcamiento.... Demoler en su totalidad el pórtico en concreto reforzado de la portería ya que una de las columnas está en alto riesgo de colapso. Reemplazar las tejas translucidas de las zonas de pasillos... Desinstalar las rejillas en concreto reforzado... Demoler en su totalidad el cárcamo existente... Llevar a cabo mantenimiento de pintura y adelantar un estudio de patología y análisis de vulnerabilidad sísmica a la totalidad de la estructura... Estudio de vulnerabilidad sísmica sin fecha, con recomendaciones - Se determinó que el muro lateral izquierdo de las oficinas se encuentra en grave estado... el muro ... no aporta rigidez y resistencia. La mampostería del muro se encuentra suelta... la cimentación presenta daños estructurales... Aunque la mayoría de la estructura cumple con los parámetros de diseños y construcción se debe: Demoler el muro..., se debe hacer nueva estructura... Impuesto predial cancelado hasta año 2024. Ficha técnica de fecha 21 de mayo de 2024 valor terreno $5.493.000.000, valor construcción $323.200.000 valor total $5.816.200.000. Funcionan los talleres de Obras Públicas y la Bodega del departamento de Boyacá. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 De: Municipio de Tunja desde el 18/06/2013, SE DEBE RECLASIFICAR SEGÚN LO EXPUESTO. Impuesto predial cancelado hasta el año 2025. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 donde aparece de: Municipio de Tunja, se confirma que se debe reclasificar según lo expuesto.
070-39800-C3	Bodega Talleres de Obras Públicas del Departamento de Boyacá Calle 31 No. 2 Este - 160 Barrio La Esmeralda Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 810 de junio 26 de 1951 Notaría Segunda de Tunja.	185,326,000.00	185,326,000.00	30,692,161.26	185,326,000.00		Ficha técnica de fecha 27/04/2023 Valor terreno $5.493.000.000, valor construcción $323.200.000, valor total $5.816.200.000, funciona los talleres de obras públicas y la bodega del departamento de Boyacá, certificado de tradición de fecha 14/12/2023 de: Municipio de Tunja, avalúo de fecha noviembre de 2018,valor terreno $5.493.000.000, construcción antigua $91.560.000, Bodega nueva $33.330.000, parqueadero cubierto $185.326.000, Cerramiento $12.984.000, valor total $5.816.200.000, Estudio de títulos sin fecha recomienda: Debe permanecer estados financieros, incluir el predio en los inventarios real de los bienes propiedad del departamento de Boyacá. Informe de visita de

							fecha 12/05/2019, recomienda: Demoler en su totalidad el cerramiento perimetral existente que no posee elementos de confinamiento por el costado occidental, junto con los muros internos que se amarran a este y presenta fisuras de fallas considerables ya que están en alto riesgo de volcamiento.... Demoler en su totalidad el pórtico en concreto reforzado de la portería ya que una de las columnas está en alto riesgo de colapso. Reemplazar las tejas translucidas de las zonas de pasillos... Desinstalar las rejillas en concreto reforzado... Demoler en su totalidad el cárcamo existente... Llevar a cabo mantenimiento de pintura y adelantar un estudio de patología y análisis de vulnerabilidad sísmica a la totalidad de la estructura... Estudio de vulnerabilidad sísmica sin fecha, con recomendaciones - Se determinó que el muro lateral izquierdo de las oficinas se encuentra en grave estado... el muro ... no aporta rigidez y resistencia. La mampostería del muro se encuentra suelta... la cimentación presenta daños estructurales... Aunque la mayoría de la estructura cumple con los parámetros de diseños y construcción se debe: Demoler el muro..., se debe hacer nueva estructura... Impuesto predial cancelado hasta año 2024. Ficha técnica de fecha 21 de mayo de 2024 valor terreno $5.493.000.000, valor construcción $323.200.000 valor total $5.816.200.000. Funcionan los talleres de Obras Públicas y la Bodega del departamento de Boyacá. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 De: Municipio de Tunja desde el 18/06/2013, SE DEBE RECLASIFICAR SEGÚN LO EXPUESTO. Impuesto predial cancelado hasta el año 2025. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 donde aparece de: Municipio de Tunja, se confirma que se debe reclasificar según lo expuesto.
TOTAL					310,216,000.00	0.00	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

Apartamento

Cuadro 2 APARTAMENTO

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SOBRESTIMACION	SUBESTIMACION	OBSERVACIONES
070-102258-C2	Apartamento Barrio Maldonado Transversal 9 No. 29A - 05 Barrio Maldonado Municipio de Tunja. Escritura Pública No.1548 de diciembre 05 de 1960 Notaría Primera de Tunja.	45,516,800.00	45,516,800.00	80,103,398.65	-	34,586,599	Ficha técnica de fecha 05/11/2020 valor terreno $62.253.000 valor construcción $93.036.800 valor total $155.289.800 en convenio marco interadministrativo atención y reparación a las víctimas y el municipio de Tunja, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial cancelado hasta 2024, estudio de títulos de fecha 17/09/2018 recomendaciones: permanecer en los estados financieros y en los inventarios del departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $62.253.000 valor construcción antigua $47.520.000, construcción reciente apartamento $45.516.800 valor total construcción $93.036.800, valor total $155.289.800. Certificado de tradición de fecha 09/01/2025 A: Departamento de Boyacá, con fecha 14/12/1960 anotación No. 1. Valor catastral mayor a avalúo y al balance. VALOR CATASTRAL $80.103.398.65.
TOTAL						34,586,599	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

CRITERIO: Incumplimiento a la Resolución 533 de 2015, aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso no se encuentran integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad. Numeral 4.1 de la Resolución N° 525 de 2016 por la cual se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso contable y sistema

documental contable. Resolución N°620 de 2015 mediante la cual se incorporó el Catálogo General de Cuentas utilizado por las Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación. Inobservancia de la Resolución 494 de 2017. Resolución 620 de 2008 del IGAC y Decreto 1420 de 1998, los avalúos se deben realizar bajo las normas NIIF y otras leyes aplicables.

CAUSA: Falta de controles efectivos a la gestión financiera en lo relacionado con Propiedad Planta y Equipo.

Presentación de la información de la Situación Financiera con inconsistencias de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.

EFECTO: Presentación de la información de la Situación Financiera con inconsistencias de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.

Una vez verificada la información allegada por la Gobernación de Boyacá y la respuesta por parte de la Secretaria General, aceptan que debe realizarse un estudio técnico y financiero, que permita esclarecer la actualización efectiva del valor del avalúo comercial; pero se aclara que dicha observación viene desde hace más de 5 años y no se ha efectuado ningún ajuste a pesar de presentar avalúos desde el año 2023 en algunos bienes del Departamento, también es necesario que se siga realizando la depuración de la Cuenta 16 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**, por lo que se mantienen las sobrestimaciones y subestimaciones y se sugiere se tenga en cuenta en especial la columna observaciones para realizar la estimación del valor comercial (avalúo comercial) y por consiguiente se debe realizar los avalúos teniendo en cuenta la Resolución 620 de 2008 del IGAC y Decreto 1420 de 1998, los avalúos se deben realizar bajo las normas NIIF y otras leyes aplicables; así las cosas, la observación se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 7**, para que sea incluido en el plan de mejoramiento, haciendo la aclaración a que este hallazgo es repetitivo puede generar el inicio de un proceso administrativo fiscal sancionatorio.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 8 DE LA CUENTA 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- LOS CONTRATOS Nos.: SMC-GB-005-2023 y 4159 DE 2024 SOBRE AVALÚOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

CONDICIÓN: Se evidencia que en la cuenta **16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** una continua en las inconsistencias, puesto que son repetitivas en los planes de mejoramiento resultados de las Auditorías anteriores.

Por otra parte, se celebró el contrato No 4159 con fecha 29 de octubre de 2024, cuyo objeto era: "Contratar la estimación del valor comercial y levantamiento topográfico de los predios de propiedad del Departamento de Boyacá" valor inicial $75.313.500 valor adicional $36.800.000 valor total **$112.113.500.**

Ilustración 19

Boyacá	FORMATO	CÓDIGO: A-AD-GC-F-018
	ACEPTACIÓN DE OFERTA	FECHA: 24/Jul/2019

Tunja, 29 OCTUBRE 2024

No. PROCESO SMC 057/2024

No. DE CONTRATO 4159

SEÑOR:
ALIRIO ALVARADO AVILA
C.C. 6.752.669 EXPEDIDA EN TUNJA
NIT. 6752669-5
DIRECCIÓN: Calle 28 No. 9 – 26 Oficina 101 Barrio Maldonado
CIUDAD: Tunja

Referencia: Aceptación de oferta Invitación: SMC-GB-057-2024


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado en la Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada de manera incondicional.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que con usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía que a partir de la fecha queda codificado de la siguiente manera:

Fecha:	29 OCTUBRE 2024	
Tipo de contrato:	**Contrato de Prestación de Servicios**	
Objeto:	**CONTRATAR LA ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	
Contratista	**Nombre:** ALIRIO ALVARADO AVILA	
	NIT. 6752669-5	
	Teléfono: 3123608142	Correo electrónico: alirioalvaradoavila@hotmail.com
CDP	**5921 del 23 de septiembre de 2024**	
Proyecto:	N.A.	N.A.
Valor:	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($75.313.500,00) M/CTE.**, valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.	
Forma de Pago:	Un único pago, una vez ejecutado el ciento por ciento (100%) de la entrega de los suministros contratados, mediante acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la entrada a almacén, suscripción del acta de recibo final y liquidación, recibido a satisfacción por parte del supervisor. SI con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO I: SI el Contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago. PARÁGRAFO II: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaría de Contratación y deberán ser visados por la supervisión del contrato. PARÁGRAFO III: Para el último pago se deberá presentar el Acta de liquidación por parte del supervisor.	
Plazo:	DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Lugar de Ejecución	El presente contrato se ejecutará en los siguientes municipios: Tunja, Aquitania, Paipa, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá y Villa Leyva.	

Acta de recibo final a satisfacción con fecha 28 de julio de 2025, firmada por: ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ, Interventor y/o Supervisor; ALIRIO ALVARADO AVILA, Contratista, tal como aparece:

Ilustración 20

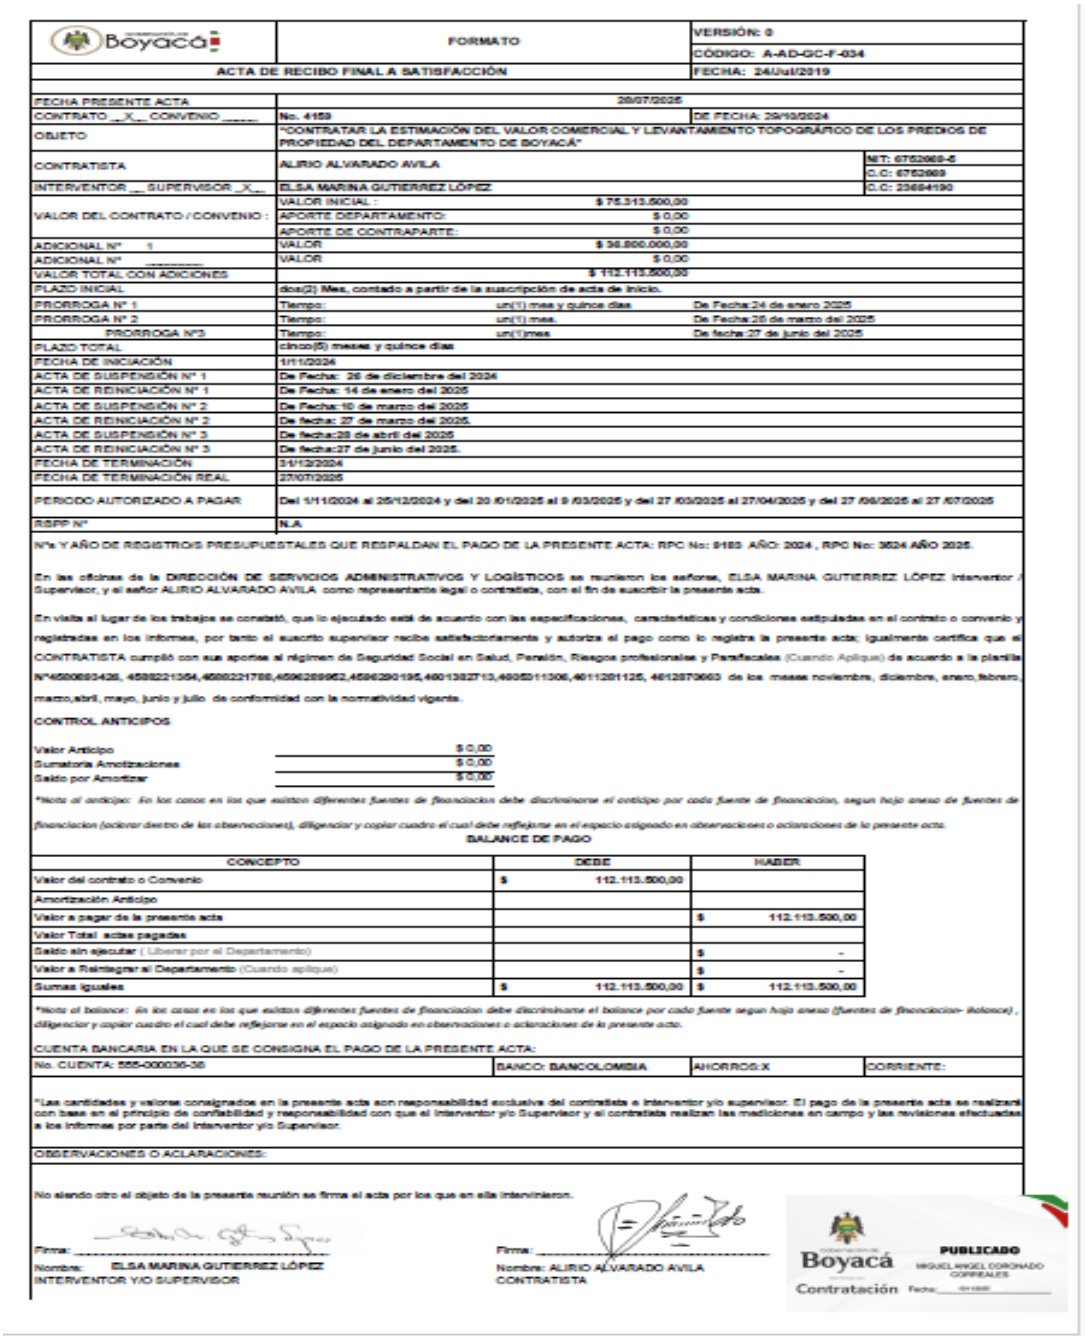

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	28/07/2025		
CONTRATO _X_ CONVENIO _____	No. 4159	DE FECHA: 29/10/2024	
OBJETO	"CONTRATAR LA ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
CONTRATISTA	ALIRIO ALVARADO AVILA		NIT: 6752669-5 C.C: 6752669
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ		C.C: 23684190
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 75.313.500,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 36.800.000,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 112.113.500,00	
PLAZO INICIAL	dos(2) Mes, contado a partir de la suscripción de acta de inicio.		
PRORROGA N° 1	Tiempo:	un(1) mes y quince días	De Fecha:24 de enero 2025
PRORROGA N° 2	Tiempo:	un(1) mes.	De Fecha:28 de marzo del 2025
PRORROGA N°3	Tiempo:	un(1)mes	De fecha 27 de junio del 2025
PLAZO TOTAL	cinco(5) meses y quince días		
FECHA DE INICIACIÓN	1/11/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	De Fecha: 26 de diciembre del 2024		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1	De Fecha: 14 de enero del 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	De Fecha:10 de marzo del 2025		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 2	De fecha: 27 de marzo del 2025.		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3	De fecha:28 de abril del 2025		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 3	De fecha:27 de junio del 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27/07/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 1/11/2024 al 25/12/2024 y del 20 /01/2025 al 9 /03/2025 y del 27 /03/2025 al 27/04/2025 y del 27 /06/2025 al 27 /07/2025		
RSPP N°	N.A		

N°s Y AÑO DE REGISTROS PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 9183 AÑO: 2024 , RPC No: 3624 AÑO 2025.

En las oficinas de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS se reunieron los señores, ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ Interventor / Supervisor, y el señor ALIRIO ALVARADO AVILA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la planilla N°45006693426, 45692221364,45692221788,45962289962,45962290195,46013927 13,46055111306,46112911125, 46128793663 de los meses noviembre, diciembre, enero,febrero, marzo,abril, mayo, junio y julio de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (ocultar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 112.113.500,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 112.113.500,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		$ -
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		$ -
Sumas iguales	$ 112.113.500,00	$ 112.113.500,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 555-000036-36	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: ALIRIO ALVARADO AVILA
CONTRATISTA

Boyacá Contratación — PUBLICADO — MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES — Fecha: ____

En la prórroga No. 3 al Contrato de Prestación de Servicios No. 4159 de 2024, celebrado entre el Departamento de Boyacá y Alirio Alvarado Avila, cuyo objeto es:" Contratar la estimación del valor comercial y levantamiento topográfico de los predios de propiedad del Departamento de Boyacá".

Ilustración 21



PRÓRROGA No.3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4159 de 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ALIRIO ALVARADO AVILA, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, identificado con número de **NIT 891.800.498-1**, quien para los efectos de la presente prórroga se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, **ALIRIO ALVARADO AVILA**, identificado con cédula de **6.752.669 expedida en Tunja**, quien para los efectos del presente se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar **Prórroga No.3** al contrato de prestación de servicios **No. 4159 de 2024**, previas las siguientes consideraciones: **1**. – Que, el día 29 de octubre de 2024, el **DEPARTAMENTO** suscribió el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4159 de 2024** con el **CONTRATISTA**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**. **2**. – Que, de acuerdo al contrato el valor se estableció en **SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($75.313.500,00) M/CTE**. **3**. - Que, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de prestación de servicios, el plazo de ejecución se estableció en **DOS (02) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **4**. – Que, con fecha 01 de noviembre de 2024 se realizó **Acta de inicio al contrato de prestación de servicios**. **5**. – Que, con fecha 26 de diciembre de 2024, se realizó **Acta de suspensión No. 01 del contrato**. **6**. – Que, el día 14 de enero de 2025, se realizó **Acta de reiniciación No. 01** del contrato con efectos a partir del 20 de enero de 2025. **7**. – Que, el día 24 de enero del 2025 se suscribió **prórroga** del contrato de prestación de servicios No. **4159 de 2024** por un término en **UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS**. **8**. – Que, El día 10 de marzo del 2025 se suscribió **acta de suspensión No. 2 del contrato**. **9**. – Que, mediante **Acta de Reiniciación No. 2** de fecha 27 de marzo de 2025, solicitan dar reinicio al contrato de prestación de servicios No. 4159 de 2024 a partir del día veintisiete (27) de marzo de 2025. **10**. – Que, con fecha 28 de marzo de 2025 se suscribió **adición** del valor del contrato en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($36.800.000,00) M/CTE**, estimando el presente contrato en la suma de **CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($112.113.500,00) M/CTE**, además, de la **prorroga del plazo No. 02** por el término de **TREINTA (30) DÍAS**. **11**. – Que, con fecha 28 de abril de 2025, se realizó **Acta de suspensión No. 03 del contrato**. **12**. – Que, mediante **Acta de Reiniciación No. 3** de fecha 27 de junio de 2025, solicitan dar reinicio al contrato de prestación de servicios No. 4159 de 2024 a partir del **día veintisiete (27) de junio de 2025**. **13**. – Que, el contrato se encuentra vigente y es viable jurídica y técnicamente la celebración de la prórroga. **14**. Que, mediante estudios previos presentados ante la Secretaría de Contratación, por CÉSAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA, Director de Servicios Administrativos y Logísticos y WILMAR ANCISAR TRIANA GONZÁLEZ, Secretario General de la Gobernación de Boyacá, solicitan prórroga No. 3 del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.4159

Gobernación de Boyacá | Contratación

de 2024, teniendo en cuenta que: **a)** Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". **b)** La constitución de 1991, en su artículo 209, consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. **c)** El departamento de Boyacá, de conformidad con el artículo 298 de la constitución Política como Entidad Territorial de la división político - administrativa del Estado, tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. **d)** El Departamento de Boyacá cuenta con 166 bienes inmuebles en diferentes municipios de Boyacá, que se encuentran dentro de los estados financieros del departamento, por ello para actualizar el valor comercial de estos inmuebles y actualizar áreas de los mismos el Departamento suscribió contrato prestación de servicios N°4159 de fecha 29 de octubre 2024, en el que figura como contratista ALIRIO ALVARADO AVILA por un valor total con adicionales de CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS PESOS($112.113.500) M/CTE. **e)** El plazo inicial para la ejecución del presente contrato de prestación de servicios se estableció por el término de DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **f)** El acta de inicio del contrato de prestación de servicios N°4159 del 2024 tuvo como fecha de suscripción el día 1 de noviembre del 2024. **g)** El 26 de diciembre del 2024 se solicitó la suspensión del contrato de prestación de servicios N°4159 del 2024, ya que el contratista no podía culminar en su totalidad con el objeto del contrato. **h)** En fecha 14 de enero del 2025 mediante acta, se reinició el contrato de prestación de servicios N°4159 del 2024. **i)** El día 24 de enero del 2025 se suscribió prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. 4159 de 2024 por un término en UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS. **j)** El día 10 de marzo del 2025 se suscribió acta de suspensión de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que el supervisor y el contratista y estimaron conveniente la necesidad de adicionales a cuatro de los predios reinicio de inmuebles objeto del contrato, con el fin de optimizar los recursos públicos. **k)** El día 27 de marzo del 2025 se reinició el contrato 4159 de 2024 y se suscribió adición en valor N° 1 por un valor de $ 36.800.000 por un término de TREINTA (30) DÍAS del contrato 4159 de 2024. **l)** El día 28 de abril del 2025, las partes de común acuerdo deciden suspender la ejecución del contrato de prestación de servicios N°4159 de 2024 teniendo en cuenta que el contratista por motivos de fuerza mayor no se encuentra dentro del país y requieren realizar la entrega de la documentación pertinente, previa revisión del supervisor. **m)** El día 27 de junio del 2025, mediante acta, se reinició el contrato de prestación de servicios N°4159 del 2024. **n)** El contratista expresó que requiere un plazo de un mes (30 días calendario) para finalizar la revisión por parte del supervisor y la entrega formal de la documentación correspondiente a los inmuebles que fueron adicionados, ya que es necesario realizar correcciones de fondo avalúos comerciales y los levantamientos topográficos. **ñ)** Para efectuar visitas a algunos de estos inmuebles con el fin de corroborar la información recolectada durante la primera visita. Esta medida se considera necesaria debido a las observaciones de forma y fondo realizadas por el supervisor respecto a los avalúos comerciales y algunos levantamientos topográficos. **15**. –

Se presentan los avalúos en los siguientes informes:

Ilustración 22

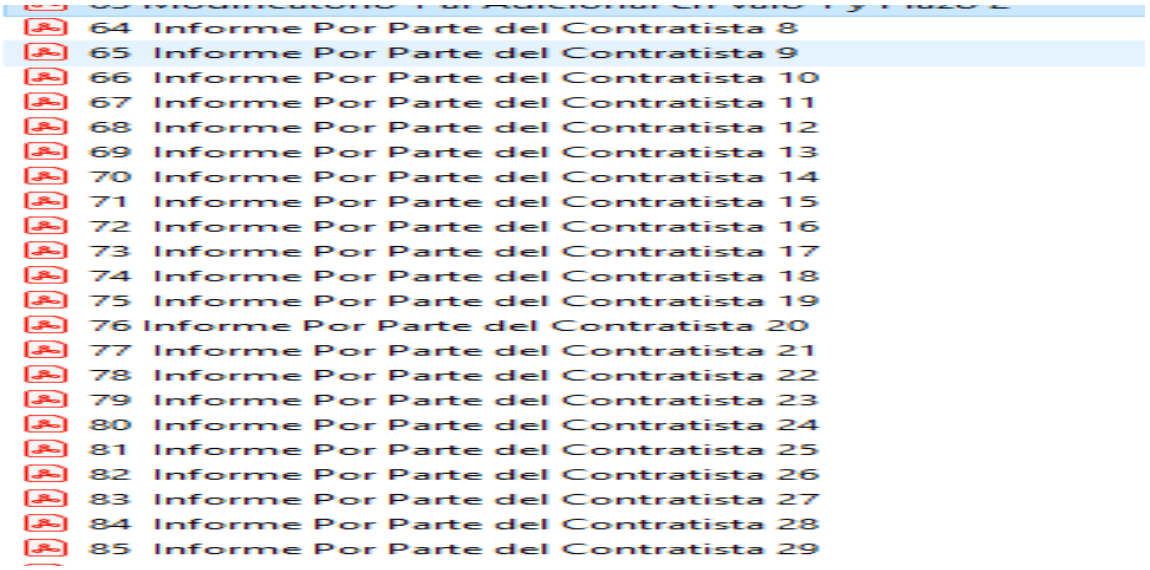

Avalúos en un comienzo de 25 bienes inmuebles de propiedad del Departamento de Boyacá, los cuales inclusive a la fecha no se encuentran incorporados en las carpetas de cada bien, tampoco se encuentran en los Estados Financieros de la Entidad; toda vez que desde la ejecución de la Auditoria Financiera y de Gestión de la vigencia 2024 ya se tenía conocimiento de la ejecución del contrato 4159 con fecha 29 de octubre de 2024, solicitando el grupo auditor a la Entidad Auditada, se procediera al registro estos bienes con sus nuevos avalúos en los Estados Financieros de la vigencia 2025.

Tabla 40 AVALÚOS DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	SEGUN AVALUO 17-01-2025	INCONSISTENCIA	OBSERVACIONES
074-15763-C2	Bodega Antigua Planta Bienestarina Vereda El Salitre Municipio de Paipa. Escritura Pública No.749 de Julio 18 de 1939 Notaría Primera de Tunja.	496,980,000	-	437,310,020	498,415,310	1,435,310	Ficha técnica de fecha 18/07/2023 valor terreno $263.523.000, valor construcción $685.620.000 valor total 949.143.000, certificado de tradición de fecha 18/09/2023 anotación 261 de: Departamento de Boyacá a: Policía Nacional anotación 262 de: Ministerio de Cultura. Impuesto predial a nombre de Instituto Financiero de Boyacá, cancelado hasta 2023. Avalúo de julio de 2018, valor bodega $496.980.000, valor construcción $188.640.000, valor terreno $263.523.000, valor total $949.143.000. Estudio de títulos sin fecha sin archivar recomendaciones: 1. requerir al INFIBOY... 2. Requerir al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIESTAR FAMILIAR... 3. Requerir a la oficina de registros e instrumentos públicos del municipio de Duitama. 4. Solicitar la entrega del inmueble al INFIBOY con el fin de incluirlo en los estados financieros del departamento. Certificado de tradición de fecha 19/12/2024 a nombre De: Departamento de Boyacá a: Policía Nacional. Anotación 261 de fecha 25/05/2005. Con oficio de fecha13/11/2024 la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de Servicios Administrativo, solicita la entrega formal del inmueble identificado con matrícula predial 074-15763. POR LO EXPUESTO SE DEBE RECLASIFICAR, certificados de libertad con fechas 07/05/2025 y 12/11/2025 no aparece como propietario el DEPARTAMENTO DE BOYACA, por lo tanto, se sigue confirmando que se debe reclasificar. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $4,427,906,245 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS

							ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $5,530,056,434 valor construcción $498,415,310 valor total $6,028,471,744.
095-100031	Casa Urbana denominada "Casa de Acogida" Calle 28 No. 10 - 38 Municipio de Sogamoso. Resolución No.649 de mayo 13 de 2020 Entrega en Destinación Provisional Bien Inmueble Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE al Departamento de Boyacá	232,035,000	232,035,000	-	452,594,914	220,559,914	Ficha técnica de fecha 21/09/2023 valor terreno $0. construcción $232.035.000 valor total $232.035.000 en servicio, Impuesto predial cancelado hasta 2023, certificado de tradición de fecha 01/06/2021 a: Departamento de Boyacá, fecha 01/10/2020 Anotación No. 12. Estudio de títulos con fecha 10/12/2020, recomendaciones: Incorporar el inmueble a los estados financieros del departamento, avalúo no se anexa. Impuesto predial hasta año 2025. Certificado de tradición con fecha 02/09/2025 De: Departamento de Boyacá. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $713.644.983 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, Valor terreno $261,050,069 valor construcción $452,594,914, valor total $713,644,983. no está en la carpeta ni en los estados financieros del departamento de Boyacá.
070-102549-C1	Casa Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá Carrera 10 No. 19 - 17 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.589 de junio 15 de 1957 Notaría Primera de Tunja	1,242,540,000	1,242,540,000	-	2,551,720,128	1,309,180,128	Ficha técnica de fecha 15/05/2023 valor terreno $0. valor construcción $245.550.000 valor total $245.550.000, en servicio, certificado de tradición de 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, con fecha 27/06/1957 anotación No.1., impuesto predial cancelado hasta 2023, estudio de títulos de fecha sin, recomendaciones: debe permanecer en los estados financieros y en los inventarios del depto. de Boyacá, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $2.600.100.000 valor local $245.550.000 valor casona $1.242.540.000 valor construcción $1.488.090.000, valor total $4.088.190.000. Certificado de tradición con fecha 15/08/2024 de: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta año 2025. Visita de campo con fecha 25/11/2024, Recomendaciones: Balcón de madera realizar análisis por un Ingeniero especializado, sugerencia restauración y limpieza monitoreo continuo, Ingeniero Forestal especializado en patrimonio, para estudio más avanzado. Certificado de tradición con fecha 09/01/2025 de: Departamento de Boyacá. Impuesto cancelado hasta 2025. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR La SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $6.542.819.700 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $3,991,099,572 valor construcción $2,551,720,128 valor total $6,542,819,700 no aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad.
074-45130	Instituto Técnico Agrícola "Sede Central Ciclo Superior Paipa ITA" Vereda El Salitre Municipio de Paipa. Acta de Cesión del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	4,291,670,000	4,291,670,000	1,456,152,425	12,120,150,911	7,828,480,911	Ficha Técnica: 08 de octubre de 2020. Valor terreno $10.489.160.000 valor construcción $711.410.000 Valor total: $11.200.570.000. Destinación: En Servicio, funciona el I. Agrícola sede Básica. Certificado de Tradición y libertad de fecha 04 marzo de 2019 a nombre de la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. Y una anotación de Servidumbre eléctrica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -U.PT.C A la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. Impuesto predial: Municipio de Paipa, Resolución 122-00155 DE FECHA 16-03-2023, Articulo 36 exenciones del Impuesto Predial Unificado. Avalúo Comercial febrero 2018, Valor terreno $10.489.160.000 valor construcción $711.410.000, valor total $11.200.570.000. NOTA: oficio por parte del Municipio de Paipa dirigido a la Secretaria de La Gobernación de Boyacá, de fecha 13 de Julio de 2022, de asunto: Formalización Comodato Predio Vereda Canocas Paipa, considerar poder sellar esta alianza entre los gobiernos de orden local y departamental, soportado en un modelo de economía circular que les permita a los municipios, el poder incorporar sus desechos orgánicos a nuevos ciclos productivos en armonía con la protección y conservación de los recursos naturales de los boyacenses y su entorno, disminuyendo las afectaciones ambientales de aquellas zonas de las cuales actualmente se disponen los recursos orgánicos en rellenos sanitarios. Certificado de tradición con fecha 11/09/2024 a: Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP. anotación 11 con fecha 14/10/2016, certificado catastral especial con fecha 26/08/2024 avalúo de 1.843.122.000 a nombre del Departamento de Boyacá. Estudio de títulos con fecha 04/09/2018 recomendaciones: Debe ser incluido en los estados financieros y en los bienes del departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 08/06/2025 Valor Terreno $18,307,735,124,77 valor construcción $75,772,424 valor total comercial $18,383507,548,77. Certificado catastral especial con fecha 21/07/2025 a nombre de Departamento de Boyacá. Certificado de tradición con fecha 12/11/2025 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial recibo hasta vigencia 2026. En carpeta 3 no aparece avalúo de febrero de 2018, tampoco avalúo donde se demuestre que el bien tiene un costo por valor de $4,291,670,000. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025

							REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $18,165,831,993 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $32,448,957,677 valor construcción $12,120,150,911 valor total $44,569,108,588 no aparece en la carpeta ni en el balance.
074-45130-Básica	Instituto Técnico Agropecuario "Sede Básica" Vereda Canocas Municipio de Paipa. Acta de Cesión del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	711,410,000	711,410,000	120,578,875	75,772,424	-635,637,576	Ficha Técnica: 08 de octubre de 2020. Valor terreno $10.489.160.000 valor construcción $711.410.000 Valor total: $11.200.570.000. Destinación: En Servicio, funciona el I. Agrícola sede Básica. Certificado de Tradición y libertad de fecha 04 marzo de 2019 a nombre de la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. Y una anotación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -U.P.T.C A la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. Impuesto predial: Municipio de Paipa, Resolución 122-00155 DE FECHA 16-03-2023, Articulo 36 exenciones del Impuesto Predial Unificado. Avalúo Comercial febrero 2018, Valor terreno $10.489.160.000 valor construcción $711.410.000, valor total $11.200.570.000. NOTA: oficio por parte del Municipio de Paipa dirigido a la Secretaria de La Gobernación de Boyacá, de fecha 13 de Julio de 2022, de asunto: Formalización Comodato Predio Vereda Canocas Paipa, considerar poder sellar esta alianza entre los gobiernos de orden local y departamental, soportado en un modelo de economía circular que les permita a los municipios, el poder incorporar sus desechos orgánicos a nuevos ciclos productivos en armonía con la protección y conservación de los recursos naturales de los boyacenses y su entorno, disminuyendo las afectaciones ambientales de aquellas zonas de las cuales actualmente se disponen los recursos orgánicos en rellenos sanitarios. Certificado de tradición con fecha 11/09/2024 a: Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP. anotación 11 con fecha 14/10/2016, certificado catastral especial con fecha 26/08/2024 avalúo de 1.843.122.000 a nombre del Departamento de Boyacá. Estudio de títulos con fecha 04/09/2018 recomendaciones: Debe ser incluido en los estados financieros y en los bienes del departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 08/06/2025 Valor Terreno $18,307,735,124,77 valor construcción $75,772,424 valor total comercial $18,383507,548,77. Certificado catastral especial con fecha 21/07/2025 a nombre de Departamento de Boyacá. Certificado de tradición con fecha 12/11/2025 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial recibo hasta vigencia 2026. En carpeta 3 no aparece avalúo de febrero de 2018, tampoco avalúo donde se demuestre que el bien tiene un costo por valor de $4,291,670,000. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, Valor terreno $18,090,059,569 valor construcción $75,772,424, valor total $18,165,861,993, el valor registrado en el balance es superior al valor del avalúo y al valor del avalúo catastral.
095-126649	Colegio Departamental de Bachillerato Ramon Ignacio Avella sede técnica municipio de AQUITANIA	-	4,845,682,700	-	-	4,845,682,700	Según avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $5,252,173,700, valor construcción $4,845,682,700 valor total $10,080,856,400, en aspecto Jurídico en el número de la matrícula inmobiliaria aparece "095-126649 INCERTIDUMBRE -095-94210", no se encuentra firmado, no se allego carpeta ni se encuentra en los estados financieros de la Entidad.
IPLAQUITANIA-0001-C1	Colegio Departamental de Bachillerato Ramón Ignacio Avella Calle 6 No. 8 - 36 Municipio de Aquitania. Escritura Pública No.175 de agosto 28 de 1965 Notaría Única de Aquitania. y Escritura Pública No.91 de Julio 28 de 1972 Notaría Única de Aquitania.	156,559,200	156,559,200	485,361,431	-	-	Ficha técnica con fecha 28/10/2020 valor terreno $132.440.000 valor construcción $261.053.500 valor total de $393.493.500 funciona el Colegio Departamental de Bachillerato Ramon Ignacio Avella, en servicio, estudio de títulos con fecha 28/04/2021 observaciones: Adelanto del proceso de saneamiento de la titulación por parte del Colegio con fecha 03/02/2009, hoja de control gestiones administrativas con fecha 14/12/2022 observaciones: El predio se encuentra en proceso de titulación a favor del departamento, certificado de tradición con fecha 28/08/2024 anotación 2 A: Departamento de Boyacá con fecha 10/11/2023, avalúo con fecha marzo de 2018 valor terreno $132.440.000, valor construcción antigua $156.559.200 construcción reciente $96.812.800 cerramiento $7.681.500 valor total $393.493.500. Ficha técnica con fecha 11/06/25 Valor terreno $5,258,171,301,32, valor construcción $7,249,783,596, Informe de peritaje y avalúo Valor colegio departamental Ramon Ignacio Avella sede técnica Terreno $5,258,171,301, Valor Bloque número 1 $4,850,667,736, Valor Bloque No. 2, $1,255,106,160, Valor Bloque No. 3 $794,092,500, Valor total construcción $7,249,783,596. Valor total $12,507,954,897. Impuesto hasta 2025 cancelados. Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 de: Departamento de Boyacá. Aparece con matrícula inmobiliaria No. 095-98941 no debe aparecer como IPL. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $12.507.954.897 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
IPLCHIQUINQUIRA-0001-C1	Institución Educativa Técnica Pio Alberto Ferro Peña Carrera 7 No. 30 - 31 Municipio de Chiquinquirá. Escritura Pública	556,110,000	556,110,000	464,451,694	12,454,788,555	11,831,038,555	Avalúo con fecha marzo de 2018 Valor terreno: $2,479,500,000, Colegio $556,110,000. Valor Colegio $67,640,000, Valor Cerramiento $249,750,000 Valor total construcciones

	No.1047 de diciembre 31 de 1973 Notaría Segunda de Chiquinquirá y Escritura Pública No.1101 de octubre 25 de 1995 Notaría Segunda de Chi						$873,500,000, Valor total $3,353,000,000. Ficha técnica de fecha 28/10/2020 Valor terreno $2,479,500.000 valor construcción $873.500.000 valor total $3,353,000,000 En servicio Funciona la I.E. Técnica Pío Alberto Ferro Peña. Certificado Catastral Especial con fecha 04/05/2021 Propietario Departamento de Boyacá - Colegio- Pi no tiene documento, ni número de documento. Ficha Técnica con fecha 11 de mayo de 2023 Valor terreno $2,479,500,000, valor construcción $873,500.000, valor total $3,353,000,000. Impuesto predial cancelado hasta 2025, estudio de título con fecha 02/07/2025 recomendaciones: ... Realizar acto administrativo donde se declare la titularidad a favor del Departamento de Boyacá. Resolución No. 00002433 con fecha 31/07/2025 por la cual se declara la propiedad de un bien inmueble urbano nombre del Departamento de Boyacá, se ordena su incorporación al inventario y se dictan otras disposiciones Certificado de tradición con fecha 20 de junio de 2025 A: Colegio Departamental Pio Alberto Ferro Peña de Chiquinquirá. Copia de Escritura No. 1,078 con fecha 30/12/1970. No debe pertenecer a IPL.RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $12,454,788,555 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
IPLCHIQUINQUIRA-0001-C2	Institución Educativa Técnica Pío Alberto Ferro Peña Carrera 7 No. 30 - 31 Municipio de Chiquinquirá. Escritura Pública No.1047 de diciembre 31 de 1973 Notaría Segunda de Chiquinquirá y Escritura Pública No.1101 de octubre 25 de 1995 Notaría Segunda de Chi	67,640,000	67,640,000	56,491,544			
IPLTUNJA-0002	Oficinas Quinto y Sexto Piso Carrera 10 No. 18 - 68 Edificio Secretaría de Educación Municipio de Tunja. Acta de Cesión de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996	1,695,939,000	1,695,939,000	-	6,551,338,412	4,855,399,412	Ficha técnica de fecha 29/10/2020 valor construcción $1.695.939.000 Valor comercial $1.695.939.000, en servicio, Funciona la Secretaria de Educación de Boyacá, certificado de tradición NO EXISTE, recibo impuesto predial NO EXISTE y estudio de títulos no se vislumbra, avalúo de fecha febrero de 2018 valor 5 y 6 piso de la Secretaria de Educación $1.695.939.000. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $6.551.338.412 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
070-102531-C1	Edificio Palacio de La Torre Nuevo Calle 20 No.9 - 62 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.154 de febrero 13 de 1976 Notaría Segunda de Tunja.	4,635,675,000	4,635,675,000	3,149,868,723	6,833,912,085	2,198,237,085	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $2.862.000.000. valor construcción $4.635.675.000 valor total $7.497.675.000, en servicio, funciona la sede de la Gobernación, certificado de tradición de 31/10/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de títulos sin fecha recomendaciones: Iniciar proceso donde se unan los dos predios antiguo y nuevo, para dejarlos en común y proindiviso de esta manera una sola escritura, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $2.862.000.000, valor construcción $4.635.675.000. Certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: Departamento de Boyacá anotación única con fecha 18/02/1976. Impuesto predial cancelado hasta 2025. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $13.688.578.575 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $6,854,666,490 valor de la construcción $6,833,912,085 valor total $13,688,578,575 no aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad
070-102540-C1	Edificio Palacio de la Torre - Antiguo Calle 20 No. 9 - 90 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.293 de Julio 08 de 1891 Notaría Primera de Tunja	9,797,040,000	9,797,040,000	8,599,014,502	11,031,193,988	1,234,153,988	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $2.644.200.000. valor construcción $9.797.040.000 valor total $12.441.240.000, en servicio, funciona la sede de la Gobernación, certificado de tradición de 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2023, estudio de títulos sin fecha recomendaciones: Permanecer en los estados financieros y en los inventarios del depto., avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $2.644.200.000, construcción $9.797.040.000 valor total $12.441.240.000. Certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá anotación uno con fecha 31/07/1996. Certificado catastral especial con fecha 15/07/2022 avalúo por $9.725.154.000 a nombre de Departamento de Boyacá. Certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: Departamento de Boyacá. Impuestos cancelados hasta 2025. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $17.364.216.047 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $6,867,599,823 valor construcción $11,031,193,988 valor total $17,898,793,811 no se encuentra en la carpeta de Secretaria y no está en el estado financiero.
070-226027	EDIFICIO URBANO - TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE TUNJA-BOYACA. AVENIDA CIRCUNVALAR No. 18 - 221 MUNICIPIO DE TUNJA. ESCRITURA PUBLICA No.3310 DE OCTUBRE 20 DE 2017 NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA.	60,756,709,258	60,756,709,258	3,822,886,302	118,277,327,669	118,277,327,669	Ficha técnica de fecha 25/04/2023 valor terreno $30.185.964.000, valor construcción $60.756.709.257.98 valor total $90.942.673.258, en administración, funciona el terminal de transporte terrestre de pasajeros de Tunja Boyacá, entregado de acuerdo al contrato No. 2353 del 13/06/2019, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025 a paz y salvo, estudio de títulos no se evidencia, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $30.185.964.000 valor construcción $0.00. Acta de entrega de inmueble con fecha 19/12/2019 por valor de $60.756.709.257. TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE TUNJA-BOYACA ENTREGADO MEDIANTE CONTRATO DE ADMINISTRACION No.2353 DE JUNIO 13 DE 2019 CELEBRADO CON SOCIEDAD PUBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA SAS NIT.901.154.852-8, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá. Hoja de control gestiones administrativas con fecha 17/11/2023

	ESCRITURA ACLARATORIA No.937 DE ABRIL 19 DE 201						Observaciones: Se sugiere realizar estudio de títulos. En avalúo no se incluye la construcción está pendiente la elaboración del avalúo de la construcción. Impuesto predial cancelado hasta 2025. Certificado de tradición con fecha 04/12/2025 a: Departamento de Boyacá. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $155.869.468.246 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, Valor terreno $37,592,140,577 valor construcciones $118,277,327,669 valor total $155,869,468,246. No aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad.
070-7030-C1	Fábrica Extinta Licorera de Boyacá Calle 8 No. 5 - 05 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.86 de febrero 14 de 1943, Notaría de Pesca.	2,408,291,400	2,408,291,400	8,397,604,511	19,940,914,647	17,532,623,247	Ficha técnica de fecha 19/02/2020 valor terreno $3.596.448.000 valor construcción $2.408.291.400 valor comercial $6.004.739.400 está en comodato, certificado de tradición de fecha 23/01/2020 a: departamento de Boyacá, no anexa recibo de impuestos predial, estudio de títulos de fecha 13/05/2020 recomendaciones: solicitar a la Asamblea departamental autorizar l gobernador ceder a título gratuito bienes inmuebles a la empresa industrial y comercial de estado La Nueva Licorera de Boyacá... realizar levantamiento topográfico de las tres fábricas de propiedad del departamento, planta Jordán, planta Ricaurte de Moniquirá y Planta Frutatenza de Sutatenza... Se recomienda solicitud de englobe de los terrenos que adquirió el departamento de Boyacá mediante escritura pública No. 86 del 14/02/1943... Debe seguir en los inventarios y en los estados financieros del depto. Avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $3.596.448.000 valor vivienda $65.683.000 valor colegio y Universidad $80.408.000 valor oficinas $344.040.000 Bodega almacén grande $1.062.902.400 Industria $855.258.000 valor construcciones$2.408.291.400 valor razonable $6.004.739.400. Valor catastral por encima de avalúo y valor costo. COMODATO No.3668 DE NOVIEMBRE 18 DE 2019 NUEVA LICORERA DE BOYACA NIT. 901.336.631-9 - OTRO SI DE MAYO 15 DE 2020. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $3.596.448.000 valor construcción $2.408.291.400 valor comercial $6.004.739.400 está en comodato a la Nueva Licorera de Boyacá, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Unión Temporal Licor Andes Asociados anotación No. 9 con fecha 20/11/2019. Impuesto predial cancelado hasta 2025. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 a: Departamento de Boyacá a: unión Temporal Licor Andes Asociados. Valor catastral por encima del valor del avalúo de 2018. COMODATO No.3668 DE NOVIEMBRE 18 DE 2019 NUEVA LICORERA DE BOYACA NIT. 901.336.631-9 - OTRO SI DE MAYO 15 DE 2020. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $43,521,702,277 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Así mismo aparece avalúo realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA con fecha 17/01/2025 por un valor total de Valor total construcciones $19.940.914.647 valor terreno $23.425.131.238 total $43,366,045,885, el cual no coinciden con la relación y no aparece en la carpeta que reposa en la Secretaria General.
083-2236	Fábrica Extinta Industria Licorera de Boyacá Carrera 9 No. 10 - 232 Municipio de Moniquirá. Escritura Pública No.341 de marzo 6 de 1944 Notaría Segunda Tunja.	2,605,404,100	3,049,003,512	2,362,650,120	3,183,404,696	578,000,596	Ficha técnica de fecha 25/05/2023 valor terreno $28.373.807.809.60 valor construcción $3.049.003.512 valor comercial $31.422.811.321.60, no explotados, impuesto predial hasta 2022, certificado de tradición de fecha 22/02/2022 a: departamento de Boyacá, avalúo de fecha julio de 2022 valor terreno $28.373.814.954, valor construcción tipo 1 Industrial $2.724.703.770, valor construcción tipo 2 cabañas $130.329.000, valor construcción 3 vías y placas $193.910.244 valor total construcciones $31.422.770.132 valor redondeado $31.423.000.000, certificado de tradición 09/12/2024 a: Departamento de Boyacá anotación 12 con fecha 24/11/2020. Certificado de tradición con fecha 04/12/2025 a: Departamento de Boyacá. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $37,052,316,063 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. ninguno de los avalúos. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $33,168,911,367 valor construcción $3,183,404,696 valor total $37,052,316,063. No aparece en la carpeta del inmueble ni en el balance.

070-50600	Oficina Primer Piso y Mezanine Carrera 10 No. 18 - 68 Secretaría de Educación de Boyacá Municipio de Tunja. Escritura Pública No.3140 de diciembre 13 de 1996, Notaría Segunda de Tunja.	1,727,446,000	1,727,446,000	1,763,370,069	3,624,972,000	1,897,526,000	Ficha técnica de fecha 16/11/2020 valor terreno $525.000.000 valor construcción $1.727.446.000 valor total $2.252.446.000 en servicio funciona la Secretaria de Educación de Boyacá, certificado de tradición de 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta el año 2025, estudio de títulos no se vislumbra, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $525.000.000 valor construcción 1 piso y mezanine $1.727.446.000 valor razonable $2.252.446.000. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $525.000.000 valor construcción $1.727.446.000 valor total $2.252.446.000 en servicio funciona la Secretaria de Educación de Boyacá. Certificado Catastral Nacional con fecha 17/06/2022 avalúo por $2.047.728.000 a nombre de Departamento de Boyacá. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $2,926,366,412 valor construcción $3,624,972,000 valor total $6,551,339,412 no se encuentra firmado, no estaba en la carpeta y no se encuentra en los estados financieros de la Entidad.
095-94197-C3	Cerramiento Colegio Liceo Cooperativo Campestre Transversal 8 No. 2 - 105 Municipio de Sogamoso. Escritura Pública No.704 de agosto 19 de 1941 Notaría Primera de Tunja.	6,300,000	6,300,000	11,435,273	939,530,500	-	Ficha Técnica: 26 de abril 2022. Valor terreno $1.015.380.000 valor construcción $939.532.500 Valor total: $1.954.912.500. en comodato a Cooperativa de trabajadores de Acerías Paz de Rio, funciona el Liceo Cooperativo Campestre Consideraciones del Avaluó: Se aclara que este inmueble tiene varias construcciones por tal razón tiene varias vidas remanentes según componentes: C1, C3, C4, C5, C6, Patio; Cerramiento y cancha múltiple = 45 años; y C2 = 95 años. El predio cuenta con un cerramiento de 126 metros lineales con un valor de $6.300.000 que está incluido en el valor total de las construcciones. Destinación: En comodato. Impuesto predial pago hasta el año 2023 por valor de $1.374.687. Avaluó comercial: febrero 2018 valor terreno $1.015.380.000 valor construcción 1 $810.000.000 construcción 2 $60.912.500 patio $28.440.000 canchas $33.880.000 cerramiento $6.300.000 valor construcciones $939.532.500 valor total: $1.954.912.500. Certificado de Tradición y libertad: 01 de junio de 2021 a Nombre del Departamento de Boyacá. Contrato de Comodato de fecha 08 de febrero de 1980 el Departamento de Boyacá, y la cooperativa de trabajadores de Acerías Paz del Rio COOTRAPAZDELRIO, firman un contrato de COMODATO dando el Departamento de Boyacá el inmueble identificado con folio de Matrícula N°095-94197, y COOTRASOG se compromete a la construcción de un colegio de primaria y bachillerato. Así mismo el término del Contrato de Comodato seria por el tiempo de 99 años prorrogables por voluntad de las partes. Estudio de Títulos sin fecha, recomendaciones: 1. El Departamento de Boyacá debe iniciar las acciones administrativas y judiciales para la resolución del contrato de Comodato suscrito. 2. Ejecutar un contrato de sesión del inmueble con la Alcaldía del municipio de Sogamoso, ya que este ente territorial está certificado en educación según la Ley 715 año 2021. 3. De presentarse una eventual renegociación y renovación del contrato de comodato por voluntad de las partes, el Departamento de Boyacá debe actualizar la normatividad especial y contable que regula la atinente a los contratos de comodato, a fin de continuar con el control del activo. Contrato de Comodato Sin Número de febrero 08 de 1980 celebrado con Cooperativa de Trabajadores de Acerías Paz del Río actualmente Cooperativa Especializada en Educación "COOTRAPAZDELRIO". Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 a: Departamento de Boyacá. Certificado de paz y salvo impuesto predial hasta año 2023. Ficha técnica con fecha 20/07/2025 Valor terreno $1,015,380,000 valor construcción $939,532,500 valor total $1,954,912,500. Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 a: Departamento de Boyacá.
070-233446-C2	Auditorio "Finca El Curubal" Vereda Pirgua Municipio de Tunja. Escritura Pública de División Material (Tres Lotes) No. 984 de mayo 17 de 2019 Notaría Cuarta de Tunja.	940,212,000	940,212,000	105,172,916	2,539,587,275	1,599,375,275	Ficha técnica de fecha 07/07/2021 valor terreno $67.046.873.570 valor de la construcción $1.151.596.600 valor total $68.198.470.170, en servicio, no explotado, en el terreno rural funciona el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, Amparo de niños. 2. En Comodato al Amparo de Niños. 3. Terreno urbano destinado al archivo general del depto. Certificado de tradición de fecha 19/09/2023 a: departamento de Boyacá, Exento de Impuesto predial. Avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $7.848.560.000, Avalúo de noviembre de 2018 valor terreno $43.676.400.000, avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $3.356.892.000 finca el Curubal, Amparo de Niños, avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $12.165.021.560 valor construcción casa $159.762.200. auditorio $940.212.000, gradería $51.622.400, valor construcciones $1.151.596.600 valor total $13.316.618.170 Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, avalúo con fecha noviembre de 2018 valor terreno $7.848.560.000 valor total $7.848.560.000, avalúo con fecha junio de 2022 Valor terreno $1.001.091.403, estudio de títulos sin fecha recomiendan: se hace necesario realizar levantamiento topográfico por parte de la Secretaria de Infraestructura Pública. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $67.046.873.570 valor de la construcción $1.151.596.600 valor total $68.198.470.170, en servicio, no explotado, en Comodato, en el terreno rural funciona el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, Amparo de niños. 2. En Comodato al Amparo de Niños. 3. Terreno urbano destinado al archivo general del

							depto. certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: García Vargas Abelardo de Jesús, certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: García Vargas Abelardo de Jesús. Impuesto predial hasta 2025. Certificado de tradición lote 1 Curubal con fecha 22/10/2025, certificado de tradición lote 2 SENA de fecha 22/10/2025, No se encontró certificado de tradición lote 3. Recomendaciones: se solicita un certificado de tradición actualizado con el fin de verificar que no se hayan inscrito nuevas modificaciones de la situación jurídica de los bienes. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $4,427,906,245 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Según avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA. valor terreno Jardín Botánico $50,024,968,940, valor terreno Amparo de Niños $35,595,278,072, valor terreno denominado El Curubal $11,459,281,600 valor total de terrenos $97,079,528,612, no aparece en las carpetas ni en los estados financieros del departamento de Boyacá. Construcción Jardín Botánico $2,539,587,275, valor Casa rural el Curubal "Fundación Amparo de Niño" No se encuentra valor alguno en el informe de avalúo.
070-233446-C3	Gradería "Fincal El Curubal" Vereda Pirgua Municipio de Tunja. Escritura Pública de División Material (Tres Lotes) No. 984 de mayo 17 de 2019 Notaría Cuarta de Tunja.	51,622,400	51,622,400	5,774,526	-	-	Ficha técnica de fecha 07/07/2021 valor terreno $67.046.873.570 valor de la construcción $1.151.596.600 valor total $68.198.470.170, en servicio, no explotado, en el terreno rural funciona el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, Amparo de niños. 2. En Comodato al Amparo de Niños. 3. Terreno urbano destinado al archivo general del depto. Certificado de tradición de fecha 19/09/2023 a: departamento de Boyacá, Exento de Impuesto predial. Avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $7.848.560.000, Avalúo de noviembre de 2018 valor terreno $43.676.400.000, avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $3.356.892.000 finca el Curubal, Amparo de Niños, avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $12.165.021.560 valor construcción casa $159.762.200. auditorio $940.212.000, gradería $51.622.400, valor construcciones $1.151.596.600 valor total $13.316.618.170 Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, avalúo con fecha noviembre de 2018 valor terreno $7.848.560.000 valor total $7.848.560.000, avalúo con fecha junio de 2022 Valor terreno $1.001.091.403, estudio de títulos sin fecha recomiendan: se hace necesario realizar levantamiento topográfico por parte de la Secretaria de Infraestructura Pública. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $67.046.873.570 valor de la construcción $1.151.596.600 valor total $68.198.470.170, en servicio, no explotado, en el Comodato, en el terreno rural funciona el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, Amparo de niños. 2. En Comodato al Amparo de Niños. 3. Terreno urbano destinado al archivo general del depto. certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: García Vargas Abelardo de Jesús, certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: García Vargas Abelardo de Jesús. Impuesto predial hasta 2025. Certificado de tradición lote 1 Curubal con fecha 22/10/2025, certificado de tradición lote 2 SENA de fecha 22/10/2025, No se encontró certificado de tradición lote 3. Recomendaciones: se solicita un certificado de tradición actualizado con el fin de verificar que no se hayan inscrito nuevas modificaciones de la situación jurídica de los bienes. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $4,427,906,245 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Según avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA. valor terreno Jardín Botánico $50,024,968,940, valor terreno Amparo de Niños $35,595,278,072, valor terreno denominado El Curubal $11,459,281,600 valor total de terrenos $97,079,528,612, no aparece en las carpetas ni en los estados financieros del departamento de Boyacá. Construcción Jardín Botánico $2,539,587,275, valor Casa rural el Curubal "Fundación Amparo de Niño" No se encuentra valor alguno en el informe de avalúo.
IPLAQUITANIA-0001	Terreno Urbano Colegio Departamental de Bachillerato Ramón Ignacio Avella Calle 6 No. 8 - 36 Municipio de Aquitania. Escritura Pública No.175 de agosto 28 de 1965 Notaría Única de Aquitania. y Escritura Pública No.91 de Julio 28 de 1972 Notaría Única de A	132,440,000	132,440,000	410,587,611	5,258,171,301	5,125,731,301	Ficha técnica con fecha 28/10/2020 valor terreno $132.440.000 valor construcción $261.053.500 valor total de $393.493.500 funciona el Colegio Departamental de Bachillerato Ramon Ignacio Avella, en servicio, estudio de títulos con fecha 28/04/2021 observaciones: Adelanto del proceso de saneamiento de la titulación por parte del Colegio con fecha 03/02/2009, hoja de control gestiones administrativas con fecha 14/12/2022 observaciones: El predio se encuentra en proceso de titulación a favor del departamento, certificado de tradición con fecha 28/08/2024 anotación 2 A: Departamento de Boyacá con fecha 10/11/2023, avalúo con fecha marzo de 2018 valor terreno $132.440.000, valor construcción antigua $156.559.200 construcción reciente $96.812.800 cerramiento $7.681.500 valor total $393.493.500. Ficha técnica con fecha 11/06/25 Valor terreno $5,258,171,301,32, valor construcción $7,249,783,596, Informe de peritaje y avalúo Valor colegio departamental Ramon Ignacio Avella sede técnica Terreno $5,258,171,301, Valor Bloque número 1 $4,850,667,736, Valor Bloque No. 2,$1,255,106,160, Valor Bloque No. 3

							$794,092,500, Valor total construcción $7,249,783,596. Valor total $12,507,954,897. Impuesto hasta 2025 cancelados. Certificado de tradición con fecha 27/08/2024 de: Departamento de Boyacá. Aparece con matrícula inmobiliaria No. 095-98941 no debe aparecer como IPL. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $10.080.856.400 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $5,258,171,301 valor construcción $7,249,783,596, valor total $12,507,954,897, no aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad.
IPLCHIQUINQUIRA-0001	Terreno Urbano Institución Educativa Técnica Pío Alberto Ferro Peña Carrera 7 No. 30 - 31 Municipio de Chiquinquirá. Escritura Pública No.1047 de diciembre 31 de 1973 Notaría Segunda de Chiquinquirá y Escritura Pública No.1101 de octubre 25 de 1995 Notaría	2,479,500,000	2,479,500,000	2,070,827,671	14,000,409,533	11,520,909,533	Avalúo con fecha marzo de 2018 Valor terreno: $2,479,500,000, Colegio $556,110,000. Valor Colegio $67,640,000, Valor Cerramiento $249,750,000 Valor total construcciones $873,500,000, Valor total $3,353,000,000. Ficha técnica de fecha 28/10/2020 Valor terreno $2,479,500.000 valor construcción $873.500.000 valor total $3,353,000,000 En servicio Funciona la I.E. Técnica Pio Alberto Ferro Peña. Certificado Catastral Especial con fecha 04/05/2021 Propietario Departamento de Boyacá - Colegio- Pi no tiene documento, ni número de documento. Ficha Técnica con fecha 11 de mayo de 2023 Valor terreno $2,479,500,000, valor construcción $873,500,000, valor total $3,353,000,000. Impuesto predial cancelado hasta 2025, estudio de título con fecha 02/07/2025 recomendaciones: ... Realizar acto administrativo donde se declare la titularidad a favor del Departamento de Boyacá. . Resolución No. 00002433 con fecha 31/07/2025 por la cual se declara la propiedad de un bien inmueble urbano nombre del Departamento de Boyacá, se ordena su incorporación al inventario y se dictan otras disposiciones Certificado de tradición con fecha 20 de junio de 2025 A: Colegio Departamental Pio Alberto Ferro Peña de Chiquinquirá. Copia de Escritura No. 1,078 con fecha 30/12/1970. No debe pertenecer a IPL. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $3.005.079,231 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA valor terreno $14,000,409,533 valor construcción $5,628,433,424 valor total $19,628,842,957 no aparece en el balance ni en la carpeta del inmueble.
070-233446	Terreno Rural "Finca El Curubal" Vereda Pirgua Municipio de Tunja. Escritura Pública de División Material (Tres Lotes) No. 984 de mayo 17 de 2019 Notaría Cuarta de Tunja.	67,046,873,570	67,046,873,570	7,499,920,423	11,459,281,000	-55,587,592,570	Ficha técnica de fecha 07/07/2021 valor terreno $67.046.873.570 valor de la construcción $1.151.596.600 valor total $68.198.470.170, en servicio, no explotado, en el terreno rural funciona el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, Amparo de niños. 2. En Comodato al Amparo de Niños. 3. Terreno urbano destinado al archivo general del depto. Certificado de tradición de fecha 19/09/2023 a: departamento de Boyacá, Exento de Impuesto predial. Avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $7.848.560.000, Avalúo de noviembre de 2018 valor terreno $43.676.400.000, avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $3.356.892.000 finca el Curubal, Amparo de Niños, avalúo de fecha noviembre de 2018 valor terreno $12.165.021.560 valor construcción casa $159.762.200. auditorio $940.212.000, gradería $51.622.400, valor construcciones $1.151.596.600 valor total $13.316.618.170 Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, avalúo con fecha noviembre de 2018 valor terreno $7.848.560.000 valor total $7.848.560.000, avalúo con fecha junio de 2022 Valor terreno $1.001.091.403, estudio de títulos sin fecha recomiendan: se hace necesario realizar levantamiento topográfico por parte de la Secretaria de Infraestructura Pública. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 Valor terreno $67.046.873.570 valor de la construcción $1.151.596.600 valor total $68.198.470.170, en servicio, no explotado, en Comodato, en el terreno rural funciona el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de Tunja, Amparo de niños. 2. En Comodato al Amparo de Niños. 3. Terreno urbano destinado al archivo general del depto. certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: García Vargas Abelardo de Jesús, certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: García Vargas Abelardo de Jesús. Impuesto predial hasta 2025. Certificado de tradición lote 1 Curubal con fecha 22/10/2025, certificado de tradición lote 2 SENA de fecha 22/10/2025, No se encontró certificado de tradición lote 3. Recomendaciones: se solicita un certificado de tradición actualizado con el fin de verificar que no se hayan inscrito nuevas modificaciones de la situación jurídica de los bienes. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo Terreno Rural Finca El Curubal" y Construcciones por la suma de $52.564.556.215, Terreno Rural Finca El Curubal" FUNDACION AMPARO DEL NIÑO - En Comodato, por la suma de $35.595.278.072, Terreno Urbano "Finca EL Curubal " PROYETO CGIRD4, por la suma de $11.459.281.600, para

							un total terreno rural por la suma de $99.619.115.887QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
074-14764	Terreno Rural Finca "El Dividivi" Vereda Quebrada Honda Municipio de Paipa. Acta de Liquidación de la Caja de Previsión Social de Boyacá de Julio 09 de 2009.	399,000,000	399,000,000	171,063,752	-	-	Ficha técnica de fecha 16/12/2020 valor terreno $399.000.000, valor construcción $16.750.000 valor total $415.750.000, no explotados, Visita de campo de fecha 06/09/2022. Recomendaciones: Realizar un inventario forestal completo, no presenta riesgo para el deterioro del bien, Se requiere mantenimiento, se recomienda realizar cerramiento del predio y levantamiento topográfico verificando los linderos del predio, certificado de tradición de fecha 21/06/2021 de: Municipio de Paipa a Departamento de Boyacá. Impuesto predial hasta 2022. Estudio de título de fecha 02/10/2020 recomendación: no tiene. Avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $399.000.000 construcción $16.750.000 valor total $415.750.000. Ficha técnica con fecha 11/06/2025 valor terreno $399.000.000 valor construcción $16.750.000 valor total $415.750.000, certificado de tradición con fecha 02/05/2025, impuesto predial hasta 2025 a nombre de departamento de Boyacá. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $1.892.983.840 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
070-133462	Terreno Rural denominado "El Porvenir" Vereda Tras del Alto Salida a Villa de Leyva Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 197 de marzo 05 de 1957. Notaría Primera de Tunja.	536,149,300	536,149,300	24,894,000	-	-	Ficha técnica de fecha 27/04/2023 valor terreno $536.149.300 valor comercial igual, no explotado, certificado de tradición de fecha 28/01/2021 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2023, estudio de título de fecha no se adjunta, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $536.149.300. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $536.149.300 valor comercial igual, no explotado. certificado de tradición con fecha 09/01//2025 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025, no adjuntan estudio de títulos. EN **RELACION** DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $1.837.361.574 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. NO SE PUEDE DETERMINAR.
074-45130 Básica	Terreno Rural Instituto Técnico Agropecuario "Sede Básica" Vereda Canocas Municipio de Paipa. Acta de Cesión del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	10,489,160,000	10,489,160,000	1,277,837,125	18,090,059,569	7,600,899,569	Ficha Técnica: 08 de octubre de 2020. Valor terreno $10.489.160.000 valor construcción $711.410.000 Valor total: $11.200.570.000. Destinación: En Servicio, funciona el I. Agrícola sede Básica. Certificado de Tradición y libertad de fecha 04 marzo de 2019 a nombre de la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. Y una anotación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -U.P.T.C A la Empresa de Energía de Boyacá S.A ESP. Impuesto predial: Municipio de Paipa, Resolución 122-00155 DE FECHA 16-03-2023, Articulo 36 exenciones del Impuesto Predial Unificado. Avalúo Comercial febrero 2018, Valor terreno $10.489.160.000 valor construcción $711.410.000, valor total $11.200.570.000. NOTA: oficio por parte del Municipio de Paipa dirigido a la Secretaria de La Gobernación de Boyacá, de fecha 13 de Julio de 2022, de asunto: Formalización Comodato Predio Vereda Canocas Paipa, considerar poder sellar esta alianza entre los gobiernos de orden local y departamental, soportado en un modelo de economía circular que les permita a los municipios, el poder incorporar sus desechos orgánicos a nuevos ciclos productivos en armonía con la protección y conservación de los recursos naturales de los boyacenses y su entorno, disminuyendo las afectaciones ambientales de aquellas zonas de las cuales actualmente se disponen los recursos orgánicos en rellenos sanitarios. Certificado de tradición con fecha 11/09/2024 a: Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP. anotación 11 con fecha 14/10/2016, certificado catastral especial con fecha 26/08/2024 avalúo de 1.843.122.000 a nombre del Departamento de Boyacá. Estudio de títulos con fecha 04/09/2018 recomendaciones: Debe ser incluido en los estados financieros y en los bienes del departamento de Boyacá. Ficha técnica con fecha 08/06/2025 Valor Terreno $18,307,735,124,77 valor construcción $75,772,424 valor total comercial $18,383507,548,77. Certificado catastral especial con fecha 21/07/2025 a nombre de Departamento de Boyacá. Certificado de tradición con fecha 12/11/2025 a: Departamento de Boyacá. Impuesto predial recibo hasta vigencia 2026. En carpeta 3 no aparece avalúo de febrero de 2018, tampoco avalúo donde se demuestre que el bien tiene un costo por valor de $4,291,670,000. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, Valor terreno $18,090,059,569 valor construcción $75,772,424, valor total $18,165,861,993, el valor registrado en el balance es superior al valor del avalúo y al valor del avalúo catastral.
070-7030	Terreno Urbano Fábrica Extinta Licorera de Boyacá Calle 8 No. 5 - 05 Municipio de Tunja. Escritura Pública	3,596,448,000	12,540,653,489	-	23,425,131,238	19,828,683,238	Ficha técnica de fecha 19/02/2020 valor terreno $3.596.448.000 valor construcción $2.408.291.400 valor comercial $6.004.739.400 está en comodato, certificado de tradición de fecha 23/01/2020 a: departamento de Boyacá, no anexa recibo de impuestos predial, estudio de títulos de fecha 13/05/2020 recomendaciones: solicitar a la Asamblea departamental autorizar l gobernador ceder a título gratuito bienes


	No.86 de febrero 14 de 1943 Notaría de Pesca						inmuebles a la empresa industrial y comercial de estado La Nueva Licorera de Boyacá... realizar levantamiento topográfico de las tres fábricas de propiedad del departamento, planta Jordán, planta Ricaurte de Moniquirá y Planta Frutatenza de Sutatenza... Se recomienda solicitud de englobe de los terrenos que adquirió el departamento de Boyacá mediante escritura pública No. 86 del 14/02/1943... Debe seguir en los inventarios y en los estados financieros del depto. Avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $3.596.448.000 valor vivienda $65.683.000 valor colegio y Universidad $80.408.000 valor oficinas $344.040.000 Bodega almacén grande $1.062.902.400 Industria $855.258.000 valor construcciones$2.408.291.400 valor razonable $6.004.739.400. Valor catastral por encima de avalúo y valor costo. COMODATO No.3668 DE NOVIEMBRE 18 DE 2019 NUEVA LICORERA DE BOYACA NIT. 901.336.631-9 - OTRO SI DE MAYO 15 DE 2020. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $3.596.448.000 valor construcción $2.408.291.400 valor comercial $6.004.739.400 está en comodato a la Nueva Licorera de Boyacá, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Unión Temporal Licor Andes Asociados anotación No. 9 con fecha 20/11/2019. Impuesto predial cancelado hasta 2025. Certificado de tradición con fecha 05/02/2026 a: Departamento de Boyacá a: unión Temporal Licorandes Asociados. Valor catastral por encima del valor del avalúo de 2018. COMODATO No.3668 DE NOVIEMBRE 18 DE 2019 NUEVA LICORERA DE BOYACA NIT. 901.336.631-9 - OTRO SI DE MAYO 15 DE 2020. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR EL SEÑOR WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $43,521,702,277 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Así mismo aparece avalúo realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA con fecha 17/01/2025 por un valor total de Valor total construcciones $19.940.914.647 valor terreno $23.425.131.238 total $43,366,045,885, el cual no coinciden con la relación y no aparece en la carpeta que reposa en la Secretaria General.
083-2236	Terreno Urbano Industria Licorera de Boyacá Carrera 9 No. 10 - 232 Municipio de Moniquirá. Escritura Pública No.341 de marzo 6 de 1944 Notaría Segunda de Tunja.	5,827,707,340	5,284,720,880	-	33,168,911,367	27,341,204,027	Ficha técnica de fecha 25/05/2023 valor terreno $28.373.807.809.60 valor construcción $3.049.003.512 valor comercial $31.422.811.321.60, no explotados, impuesto predial hasta 2022, certificado de tradición de fecha 22/02/2022 a: departamento de Boyacá, avalúo de fecha julio de 2022 valor terreno $28.373.814.954, valor construcción tipo 1 Industrial $2.724.703.770, valor construcción tipo 2 cabañas $130.329.000, valor construcción 3 vías y placas $193.910.244 valor total construcciones $31.422.770.132 valor redondeado $31.423.000.000, certificado de tradición 09/12/2024 a: Departamento de Boyacá anotación 12 con fecha 24/11/2020. Certificado de tradición con fecha 04/12/2025 a: Departamento de Boyacá. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $37,052,316,063 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. ninguno de los avalúos. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $33,168,911,367 valor construcción $3,183,404,696 valor total $37,052,316,063. No aparece en la carpeta del inmueble ni en el balance.
070-233448	Terreno Urbano Carrera 2A No. 17 - 78 barrio Los Patriotas Municipio de Tunja. Escritura Pública No.984 de mayo 17 de 2019 Notaría Cuarta de Tunja.	12,480,000,000	2,828,595,000	-	14,083,923,600	1,603,923,600	Ficha técnica de fecha 25/04/2022 valor terrenos $12.480.000.000 valor comercial $12.480.000.000, no explotado, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a. Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2023, estudio de títulos de fecha septiembre de 2018 recomienda: solicitar a la oficina de instrumentos públicos certificado especial de libertad para establecer los titulares de derechos reales, iniciar el proceso de pertenencia una vez se tenga el material probatorio, realizar visita técnica al inmueble para la respectiva posesión y realizar levantamiento topográfico para determinar área colindantes y ubicación exacta del inmueble, debe ser incorporado en la cuenta IPL, avalúo de fecha marzo de 2018 valor terreno $12.474.600.000 valor total $12.474.600.000. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valores terrenos $12.480.000.000 valor comercial $12.480.000.000, no explotado sin utilizar. Certificado de tradición con fecha 26/02/2025 a: Gómez Fernández Aura Esperanza. Impuesto predial cancelado hasta 2023 factura a nombre de Departamento de Boyacá. Ficha técnica de fecha 30/05/2025 valores terrenos $12.480.000.000 valor comercial $12.480.000.000, no explotado sin utilizar, certificado de tradición de fecha 22/10/2025 a. Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR La Señora WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $14.324.107.200 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRICO ALVARADO AVILA, Valor terreno $14,083,923,600, no se encuentra en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad.


070-102540	Terreno Urbano Edificio Palacio de la Torre - Antiguo Calle 20 No. 9 - 90 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.293 de Julio 08 de 1891 Notaría Primera de Tunja	2,644,200,000	2,320,855,498	-	6,857,599,823	4,213,399,823	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $2.644.200.000. valor construcción $9.797.040.000 valor total $12.441.240.000, en servicio, funciona la sede de la Gobernación, certificado de tradición de 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2023, estudio de títulos sin fecha recomendaciones: Permanecer en los estados financieros y en los inventarios del depto., avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $2.644.200.000, construcción $9.797.040.000 valor total $12.441.240.000. Certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá anotación uno con fecha 31/07/1996. Certificado catastral especial con fecha 15/07/2022 avalúo por $9.725.154.000 a nombre de Departamento de Boyacá. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $6,867,599,823 valor construcción $11,031,193,988 valor total $17,898,793,811 no se encuentra en la carpeta de Secretaria y no está en el estado financiero.
070-50600	Terreno Urbano Oficina Primer Piso y Mezanine Carrera 10 No. 18 - 68 Secretaría de Educación de Boyacá Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 3140 de diciembre 13 de 1996, Notaría Segunda de Tunja.	525,000,000	535,917,931	-	2,926,366,412	2,401,366,412	Ficha técnica de fecha 16/11/2020 valor terreno $525.000.000 valor construcción $1.727.446.000 valor total $2.252.446.000 en servicio funciona la Secretaria de Educación de Boyacá, certificado de tradición de 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta el año 2025, estudio de títulos no se vislumbra, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $525.000.000 valor construcción 1 piso y mezanine $1.727.446.000 valor razonable $2.252.446.000. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor terreno $525.000.000 valor construcción $1.727.446.000 valor total $2.252.446.000 en servicio funciona la Secretaria de Educación de Boyacá. Certificado Catastral Nacional con fecha 17/06/2022 avalúo por $2.047.728.000 a nombre de Departamento de Boyacá. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $2,926,366,412 valor construcción $3,624,972,000 valor total $6,551,339,412 no se encuentra firmado, no estaba en la carpeta y no se encuentra en los estados financieros de la Entidad.
070-102531	Terreno Urbano Edificio Palacio de La Torre Nuevo Calle 20 No.9 - 62 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.154 de febrero 13 de 1976 Notaría Segunda de Tunja.	2,862,000,000	1,944,684,277	-	6,854,666,490	3,992,666,490	Ficha técnica de fecha 05/10/2020 valor terreno $2.862.000.000. valor construcción $4.635.675.000 valor total $7.497.675.000, en servicio, funciona la sede de la Gobernación, certificado de tradición de 31/10/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2024, estudio de títulos sin fecha recomendaciones: Iniciar proceso donde se unan los dos predios antiguo y nuevo, para dejarlos en común y proindiviso de esta manera una sola escritura, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $2.862.000.000, valor construcción $4.635.675.000. Certificado de tradición con fecha 19/02/2025 a: Departamento de Boyacá anotación única con fecha 18/02/1976. Impuesto predial cancelado hasta 2025. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $13.688.578.575 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $6,854,666,490 valor de la construcción $6,833,912,085 valor total $13,688,578,575 no aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad
070-102549	Terreno Urbano Casa Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y Local Comercial Carrera 10 No. 19 - 17 Municipio de Tunja. Escritura Pública No.589 de junio 15 de 1957 de la Notaría Primera de Tunja.	2,600,100,000	2,037,101,811	-	3,991,099,572	1,390,999,572	Ficha técnica de fecha 15/05/2023 valor terreno $0. valor construcción $245.550.000 valor total $245.550.000, en servicio, certificado de tradición de 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, con fecha 27/06/1957 anotación No.1., impuesto predial cancelado hasta 2023, estudio de títulos de fecha sin, recomendaciones: debe permanecer en los estados financieros y en los inventarios del depto. de Boyacá, avalúo de febrero de 2018 valor terreno $2.600.100.000 valor local $245.550.000 valor casona $1.242.540.000 valor construcción $1.488.090.000, valor total $4.088.190.000. Certificado de tradición con fecha 15/08/2024 de: Departamento de Boyacá. Impuesto predial cancelado hasta año 2025. Visita de campo con fecha 25/11/2024, Recomendaciones: Balcón de madera realizar análisis por un Ingeniero especializado, sugerencia restauración y limpieza monitoreo continuo, Ingeniero Forestal especializado en patrimonio, para estudio más avanzado. Certificado de tradición con fecha 09/01/2025 de: Departamento de Boyacá. Impuesto cancelado hasta 2025. EN RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR La SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $6.542.819.700 QUE NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, valor terreno $3,991,099,572 valor construcción $2,551,720,128 valor total $6,542,819,700 no aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad.


070-226027	Terreno Urbano Desarrollo Terminal de Transportes Avenida Circunvalar No. 18 - 221 Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 3310 de octubre 20 de 2017 Notaria Segunda de Tunja. Y Escritura Aclaratoria No. 937 de abril 19 de 2018 Notaría Segunda de Tunja y	30,185,964,000	1,899,337,698	-	37,592,140,577	7,406,176,577	Ficha técnica de fecha 25/04/2023 valor terreno $30.185.964.000, valor construcción $60.756.709.257.98 valor total $90.942.673.258, en administración, funciona el terminal de transporte terrestre de pasajeros de Tunja Boyacá, entregado de acuerdo al contrato No. 2353 del 13/06/2019, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, impuesto predial hasta 2025 a paz y salvo, estudio de títulos no se evidencia, avalúo de fecha febrero de 2018 valor terreno $30.185.964.000 valor construcción $0.00. Acta de entrega de inmueble con fecha 19/12/2019 por valor de $60.756.709.257. TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE TUNJA-BOYACA ENTREGADO MEDIANTE CONTRATO DE ADMINISTRACION No.2353 DE JUNIO 13 DE 2019 CELEBRADO CON SOCIEDAD PUBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA SAS NIT.901.154.852-8, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá. Hoja de control gestiones administrativas con fecha 17/11/2023 Observaciones: Se sugiere realizar estudio de títulos. En avalúo no se incluye la construcción está pendiente la elaboración del avalúo de la construcción. Impuesto predial cancelado hasta 2025. Certificado de tradición con fecha 04/12/2025 a: Departamento de Boyacá. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $155.869.468.246 NO APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, Avalúo con fecha 17/01/2025 realizado por el señor ALIRIO ALVARADO AVILA, Valor terreno $37,592,140,577 valor construcciones $118,277,327,669 valor total $155,869,468,246. No aparece en la carpeta ni en los estados financieros de la Entidad.


FUENTE: DOCUMENTACIÓN SECOP II – SECRETARIA CONTRATACION GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Ilustración 23

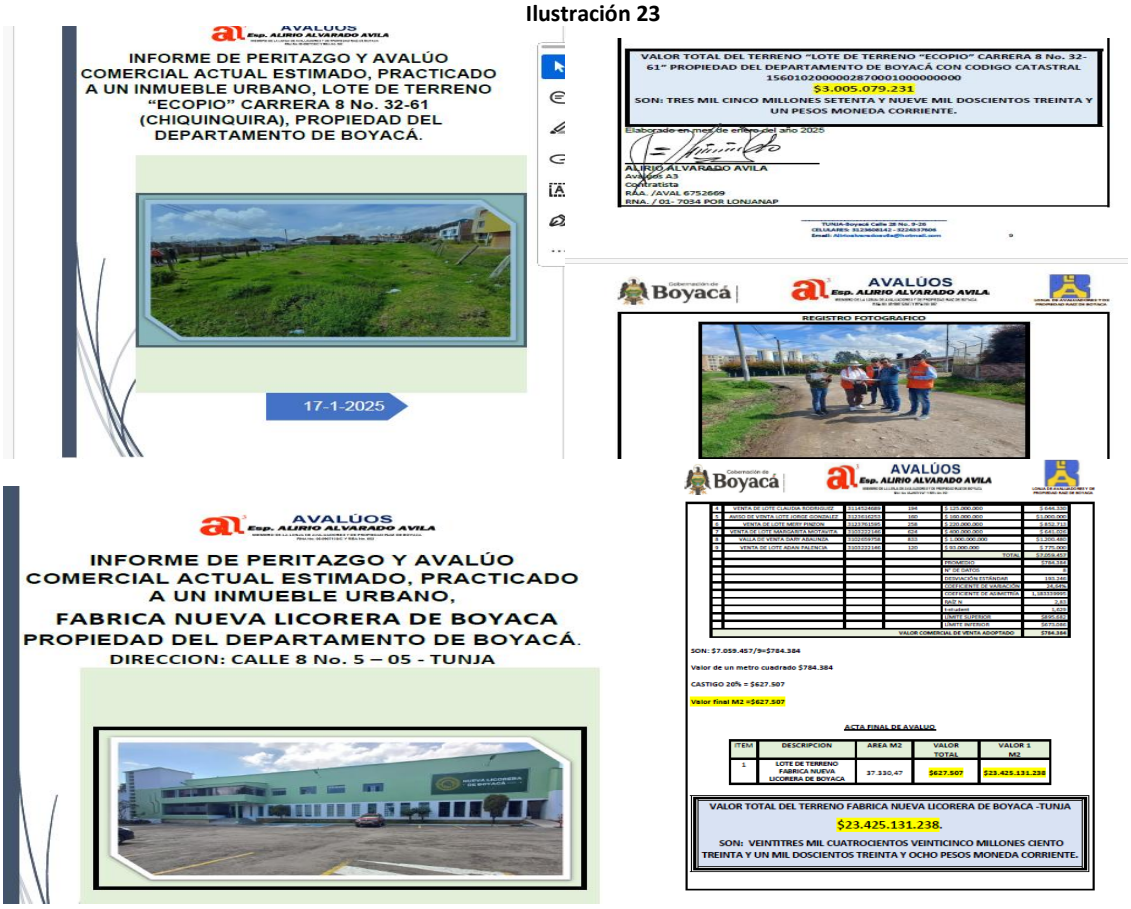

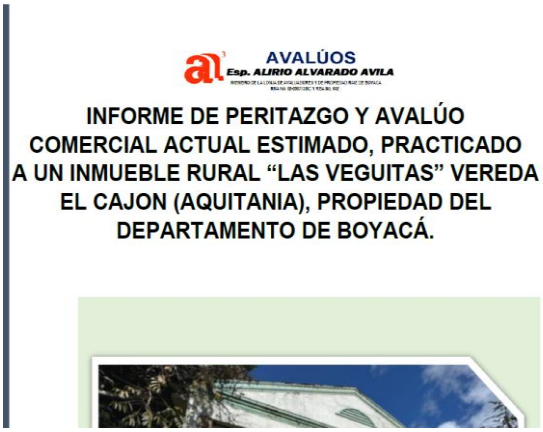
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE RURAL "LAS VEGUITAS" VEREDA EL CAJON (AQUITANIA), PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

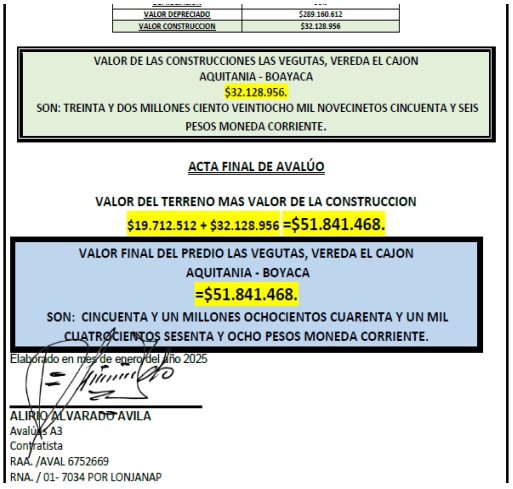

VALOR DEPRECIADO $289.160.612
VALOR CONSTRUCCION $32.128.956
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES LAS VEGUTAS, VEREDA EL CAJON AQUITANIA - BOAYACA
$32.128.956.
SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECINETOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTA FINAL DE AVALÚO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
$19.712.512 + $32.128.956 =$51.841.468.
VALOR FINAL DEL PREDIO LAS VEGUTAS, VEREDA EL CAJON AQUITANIA - BOYACA
=$51.841.468.
SON: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en mes de enero del año 2025
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP



AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "PIO ALBERTO FERRO PEÑA"- SEDE BACHILLERATO MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
DIRECCION: CARRERA 7 No. 30-37 -CHIQUINQUIRA



VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "PIO ALBERTO FERRO PEÑA" - SEDE BACHILLERATO
$ 5.568.433.424
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTA FINAL DE AVALÚO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, "INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "PIO ALBERTO FERRO PEÑA" – SEDE BACHILLERATO, PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CON CODIGO CATASTRAL No. 15-176-01-01-0006-0001-000 Y MATRICULA INMOBILIARIA IPL CHIQUINQUIRA 0001 -072-58989
$19.628.842.957.
SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en mes de enero del año 2025
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP


AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE RURAL, DENOMINADO TERRENO RURAL EL CURUBAL "JARDIN BOTÁNICO JOSE JOAQUIN CAMACHO Y LAGO DE TUNJA" PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
17-1-2025

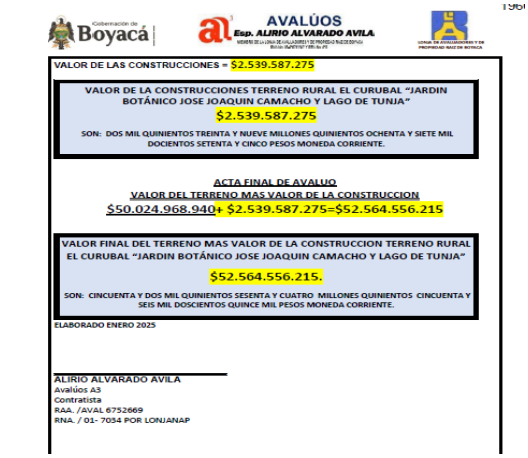

Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES = $2.539.587.275
VALOR DE LA CONSTRUCCIONES TERRENO RURAL EL CURUBAL "JARDIN BOTÁNICO JOSE JOAQUIN CAMACHO Y LAGO DE TUNJA"
$2.539.587.275
SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTA FINAL DE AVALUO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
$50.024.968.940+ $2.539.587.275=$52.564.556.215
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION TERRENO RURAL EL CURUBAL "JARDIN BOTÁNICO JOSE JOAQUIN CAMACHO Y LAGO DE TUNJA"
$52.564.556.215.
SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.
ELABORADO ENERO 2025
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP

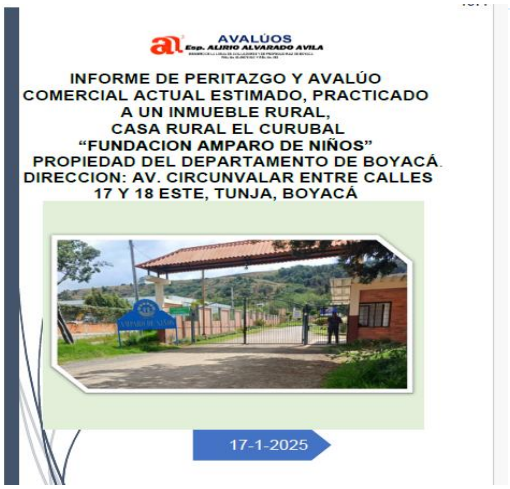

AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE RURAL, CASA RURAL EL CURUBAL "FUNDACION AMPARO DE NIÑOS" PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. DIRECCION: AV. CIRCUNVALAR ENTRE CALLES 17 Y 18 ESTE, TUNJA, BOYACÁ
17-1-2025

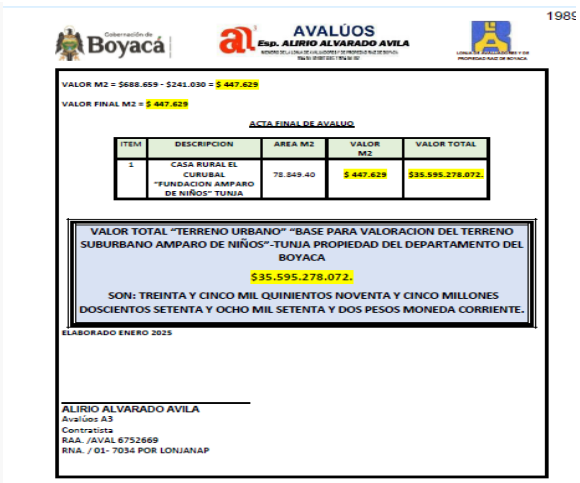
1989
Gobernación de Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
VALOR M2 = $688.659 - $241.030 = $ 447.629
VALOR FINAL M2 = $ 447.629
ACTA FINAL DE AVALUO
ITEM
DESCRIPCION
AREA M2
VALOR M2
VALOR TOTAL
1
CASA RURAL EL CURUBAL "FUNDACION AMPARO DE NIÑOS" TUNJA
78.849.40
$ 447.629
$35.595.278.072.
VALOR TOTAL "TERRENO URBANO" "BASE PARA VALORACION DEL TERRENO SUBURBANO AMPARO DE NIÑOS"-TUNJA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL BOYACA
$35.595.278.072.
SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
ELABORADO ENERO 2025
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP



AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE, DENOMINADO EL CURUBAL "TERRENO URBANO" PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
17-1-2025


201
Gobernación de Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
VALOR DE UN METRO CUADRADO $688.659
CASTIGO 20% = $137.732
Valor final M2 =$550.927
ACTA FINAL DE AVALUO
ITEM
DESCRIPCION
AREA M2
VALOR M2
VALOR TOTAL
1
EL CURUBAL TERRENO URBANO-TUNJA
20.800
$550.927
$11.459.281.600.
VALOR TOTAL DEL TERRENO EL CURUBAL TERRENO URBANO-TUNJA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL BOYACA
$11.459.281.600.
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
ELABORADO ENERO 2025
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP

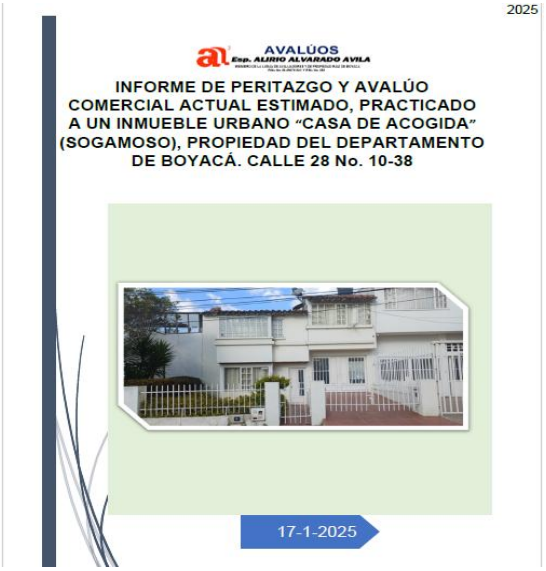

2025
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO "CASA DE ACOGIDA" (SOGAMOSO), PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CALLE 28 No. 10-38
17-1-2025

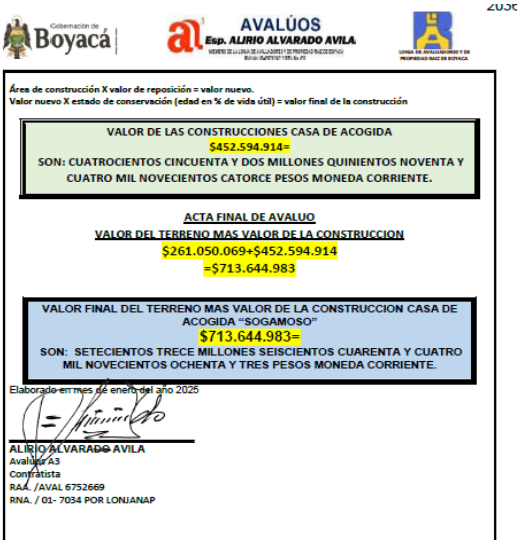
Gobernación de Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
Área de construcción X valor de reposición = valor nuevo.
Valor nuevo X estado de conservación (edad en % de vida útil) = valor final de la construcción
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES CASA DE ACOGIDA
$452.594.914=
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTA FINAL DE AVALUO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
$261.050.069+$452.594.914
=$713.644.983
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA "SOGAMOSO"
$713.644.983=
SON: SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en mes de enero del año 2025
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP



AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "RAMON IGNACIO AVELLA" SEDE CENTRAL (AQUITANIA), PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CALLE 6 No. 8-07/41.
17-1-2025

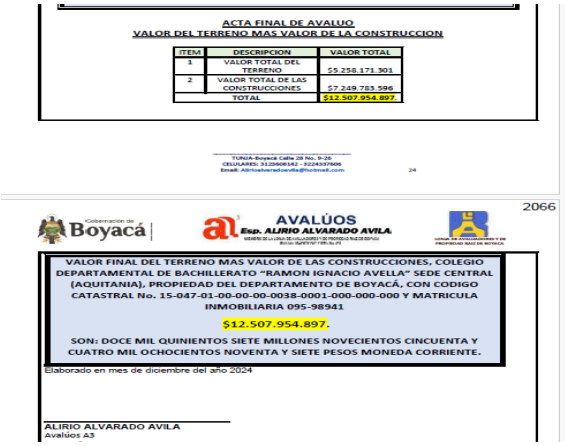
ACTA FINAL DE AVALUO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
ITEM
DESCRIPCION
VALOR TOTAL
1
VALOR TOTAL DEL TERRENO
$5.258.171.301
2
VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES
$7.249.783.596
TOTAL
$12.507.954.897
Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
2066
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "RAMON IGNACIO AVELLA" SEDE CENTRAL (AQUITANIA), PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CON CODIGO CATASTRAL No. 15-047-01-00-00-00-0038-0001-000-000-000 Y MATRICULA INMOBILIARIA 095-98941
$12.507.954.897.
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en mes de diciembre del año 2024
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3



AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "RAMON IGNACIO AVELLA" SEDE TECNICA (AQUITANIA), PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CARRERA 8 No. 9-11/31/75
17-1-2025

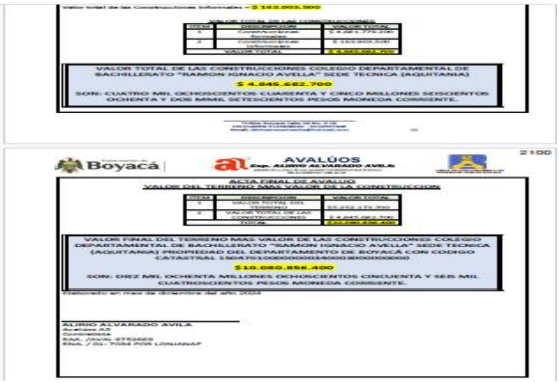
VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "RAMON IGNACIO AVELLA" SEDE TECNICA (AQUITANIA)
$ 4.846.682.700
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
2100
ACTA FINAL DE AVALUO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "RAMON IGNACIO AVELLA" SEDE TECNICA (AQUITANIA) PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CON CODIGO CATASTRAL
$10.080.856.400
SON: DIEZ MIL OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
ALIRIO ALVARADO AVILA


AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO "EDIFICIO SECRETARIA DE EDUCACION", ACTA DE CESION DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, MAYO 10 DE 1996. EPH PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
17-1-2025

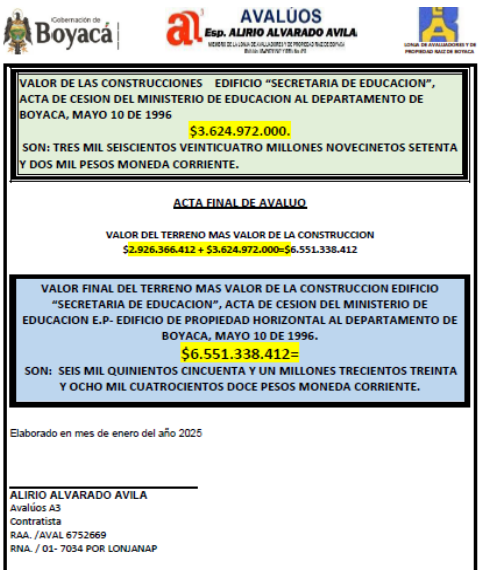
Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES EDIFICIO "SECRETARIA DE EDUCACION", ACTA DE CESION DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, MAYO 10 DE 1996
$3.624.972.000.
SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECINETOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTA FINAL DE AVALUO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
$2.926.366.412 + $3.624.972.000=$6.551.338.412
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO "SECRETARIA DE EDUCACION", ACTA DE CESION DEL MINISTERIO DE EDUCACION E.P- EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, MAYO 10 DE 1996.
$6.551.338.412=
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en mes de enero del año 2025
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avalúos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP


AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, "EDIFICIO PALACIO DE LA TORRE (NUEVO)"
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
17-1-2025



VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES EDIFICIO PALACIO DE LA TORRE (NUEVO) UBICADO EN LA CALLE 20 No. 9-62.
$6.828.912.085=
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTA FINAL DE AVALÚO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION$ 6.854.666.490 +
$6.833.912.085=$13.688.578.575


Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION, EDIFICIO PALACIO DE LA TORRE (NUEVO), UBICADO EN LA CALLE 20 No. 9-62, MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-102531, CODIGO CATASTRAL No. 15-001-01-01-0010-0013-000
$13.688.578.575=
SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE.
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avaluos A3
Contratista
RNA: AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP


AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, "LOCAL COMERCIAL ALMACEN SAMACA" - CARRERA 10 No. 19 -21-25, DE LA CIUDAD DE TUNJA, PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
17-1-2025


Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
$15.022.222 X 49.11 M2=$737.741.322
Este inmueble ha sido repotencializado o sometido a renovaciones o mejora significativas, actualizando sus instalaciones para mejorar su funcionalidad, estética y valor. Esto genera que el inmueble permanezca en buen estado de conservación, motivo por el cual a la fecha de inspección de este inmueble NO se aplica porcentaje de depreciación.
VALOR TOTAL DEL LOCAL COMERCIAL "ALMACEN SAMACA" UBICADO EN LA CARRERA 10 No 19-21-25
$737.741.322=
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en mes de enero del año 2025.
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avaluos A3
Contratista
RNA: AVAL / 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP


AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, "CASA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACA" - CARRERA 10 No. 19 -17, DE LA CIUDAD DE TUNJA, PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
17-1-2025

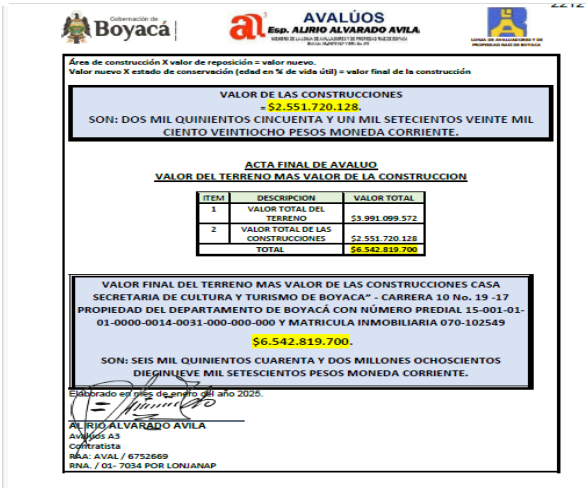
Boyacá
AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
Área de construcción X valor de reposición = valor nuevo.
Valor nuevo X estado de conservación (edad en % de vida útil) = valor final de la construcción
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES
- $2.551.720.128.
SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTA FINAL DE AVALUO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
ITEM | DESCRIPCION | VALOR TOTAL
1 | VALOR TOTAL DEL TERRENO | $3.991.099.572
2 | VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES | $2.551.720.128
TOTAL | $6.542.819.700
VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES CASA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACA" - CARRERA 10 No. 19 -17 PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CON NÚMERO PREDIAL 15-001-01-01-0000-0014-0031-000-000-000 Y MATRICULA INMOBILIARIA 070-102549
$6.542.819.700.
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en mes de enero del año 2025.
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avaluos A3
Contratista
RNA: AVAL / 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP

2215

AVALÚOS Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA

INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, "CASA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACA" - CARRERA 10 No. 19 -17, DE LA CIUDAD DE TUNJA, PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.



17-1-2025

2228

Gobernación de Boyacá | AVALÚOS Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA

Área de construcción X valor de reposición = valor nuevo.
Valor nuevo X estado de conservación (edad en % de vida útil) = valor final de la construcción

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES
= $2.551.720.128.
SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.

ACTA FINAL DE AVALUO
VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL DEL TERRENO	$3.991.099.572
2	VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES	$2.551.720.128
	TOTAL	$6.542.819.700

VALOR FINAL DEL TERRENO MAS VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES CASA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACA" - CARRERA 10 No. 19 -17 PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CON NÚMERO PREDIAL 15-001-01-01-0000-0014-0031-000-000-000 Y MATRICULA INMOBILIARIA 070-102549

$6.542.819.700.

SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.


Elaborado en mes de enero del año 2025.

ALIRIO ALVARADO AVILA
Avaluos A3
Contratista
RAA: AVAL / 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP

2231

AVALÚOS Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA

INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, "LOCAL COMERCIAL "BOUTIQUE NEON", PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.



17-1-2025

2234

Gobernación de Boyacá | AVALÚOS Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA

ACTA DE AVALÚO

ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN 37.19 M2	VALOR REPOSICIÓN M2 $14.088.889	VALOR NUEVO $514.526.226	EDAD AÑOS 70	ESTADO DE CONSERVACION BUENO CLASE 1 0%	VIDA UTIL EDAD 100 AÑOS	VIDA REMANENTE 30 AÑOS

$14.088.889 X 37. 19 M2=$523.965.781=

Este inmueble ha sido repotencializado o sometido a renovaciones o mejora significativas, actualizando sus instalaciones para mejorar su funcionalidad, estética y valor. Esto genera que el inmueble permanezca en buen estado de conservación, motivo por el cual a la fecha de inspección de este inmueble NO se aplica porcentaje de depreciación.

MEMORIA DE CALCULO
CONTRUCCION

EDAD EN AÑOS	100
EDAD EN % DE VIDA UTIL	70%
VIDA REMANENTE	30

VALOR TOTAL DEL LOCAL COMERCIAL "BOUTIQUE NEON" UBICADO EN LA CALLE 19 No. 10-20
$523.965.781=
SON: QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE.

Elaborado en mes de enero del año 2025.

ALIRIO ALVARADO AVILA
Avaluos A3
Contratista
RAA: AVAL / 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP

AVALÚOS Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA

INFORME DE PERITAZGO Y AVALÚO COMERCIAL ACTUAL ESTIMADO, PRACTICADO A UN INMUEBLE URBANO, LOCAL COMERCIAL HEMOCENTRO - CALLE 19 No. 10 -22-26, DE LA CIUDAD DE TUNJA, PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.



17-1-2025

Gobernación de Boyacá | AVALÚOS Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA

ACTA DE AVALÚO

ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN 36.00 M2	VALOR REPOSICIÓN M2 $14.088.889	VALOR NUEVO $507.200.004	EDAD AÑOS 70	ESTADO DE CONSERVACION BUENO CLASE 1 0%	VIDA UTIL EDAD 100 AÑOS	VIDA REMANENTE 30 AÑOS

$14.088.889 X 36.00 M2=$507.200.004

Este inmueble ha sido repotencializado o sometido a renovaciones o mejora significativas, actualizando sus instalaciones para mejorar su funcionalidad, estética y valor. Esto genera que el inmueble permanezca en buen estado de conservación, motivo por el cual a la fecha de inspección de este inmueble NO se aplica porcentaje de depreciación.

MEMORIA DE CALCULO
CONTRUCCION


EDAD EN AÑOS	100
EDAD EN % DE VIDA UTIL	70%
VIDA REMANENTE	30

VALOR TOTAL DEL LOCAL COMERCIAL "HEMOCENTRO" UBICADO EN LA CALLE 19 No. 10-22-26
$507.200.004
SON: QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE.


Elaborado en mes de enero año 2025.

ALIRIO ALVARADO AVILA
Avaluos A3
Contratista
RAA. /AVAL 6752669
RNA. / 01- 7034 POR LONJANAP




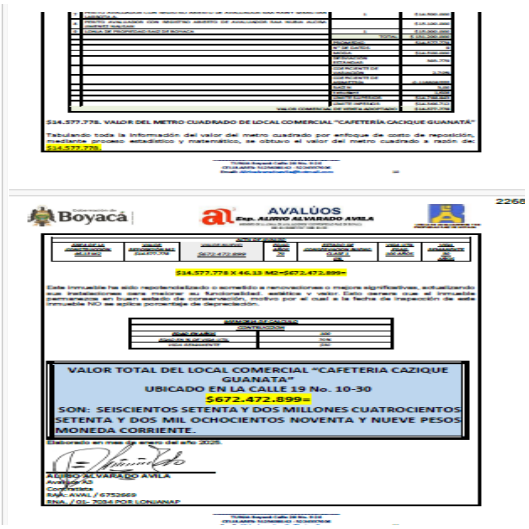



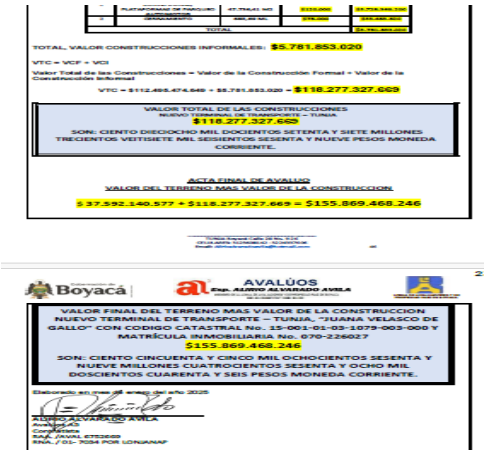



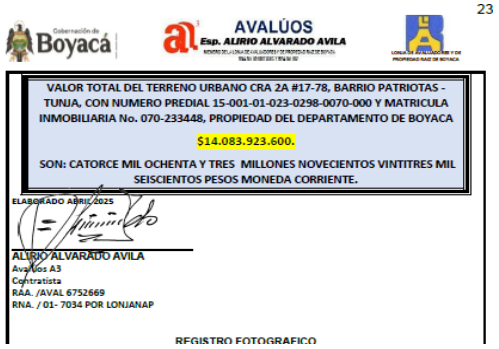

Contrato de prestaciones de servicios profesionales No. SMC-GB-005-2023, por valor de $18.600.000, objeto: Contratar el avalúo comercial de bienes inmuebles de

interés del Departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja. Contratista: Alirio Alvarado Ávila.

Ilustración 24

LONJA DE AVALUADORES Y DE PROPIEDAD RAIZ DE BOYACA

AVALÚOS Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA

LONJA DE AVALUADORES Y DE PROPIEDAD RAIZ DE SANTANDER

Fecha:	02 de marzo 2023.	
Acta de Inicio	03 de marzo 2023.	
Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SMC-GB-005-2023.	
Objeto:	CONTRATAR EL AVALUÓ COMERCIAL DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS DELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN LA CIUDAD DE TUNJA.	
Contratista	Nombre: ALIRIO ALVARADO AVILA	
	NIT. 6752669 -5	
	Teléfono: 3123608142	Email: alirioalvaradoavila@hotmail.com
CDP	865 del 02 de febrero del 2023	
Proyecto:	N.A.	N.A.
Valor:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($18.600.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE IVA Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.	
Forma de Pago:	El valor del presente contrato se cancelará al contratista de la siguiente manera: Se realizará mediante un único pagado equivalente al 100% de valor contratado y ejecutado en su totalidad previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato, anexando las correspondientes actas, informes y evidencias y presentando el certificado de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales (en caso de ser persona jurídica) y demás documentos exigidos para el respectivo pago por parte de la central de cuentas de la Secretaría de Hacienda. Si con la cuenta no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del contratista, por lo cual no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, esta deberá ser radicada en central de cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al artículo 19 de la ley 1150 de julio de 2007. (DERECHO AL TURNO). PARAGRAFO I: Si el Contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago. PARÁGRAFO II: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaría de Contratación y deberán ser visados por la supervisión del contrato.	
Plazo:	El término de ejecución del contrato será de UN (1) MES contado a partir de la suscripción delacta de inicio.	

Escritura No. 2142 con fecha 22 de septiembre de 2023, valor del contrato por $6.585.855, por la compra de los siguientes locales:

Ilustración 25

legis República de Colombia

FOLIO	INMUEBLE	VALOR
070-213729	BLOQUE C 1° PISO LOCAL 2C	$ 801.111.645
070-213730	BLOQUE C 1 PISO LOCAL 3C	$ 995.675.223
070-213731	BLOQUE C 2 PISO LOCAL 4C	$ 2.016.643.396
070-213740	BLOQUE C 3 PISO LOCAL 12C	$ 974.604.960
070-213732	BLOQUE C 2 PISO LOCAL 13C	$ 19.381.076
070-199815	BLOQUE G LOCAL 3	$ 749.632.412
070-213741	BLOQUE 1 LOCAL 1I	$ 1.017.144.218
070-213680	BLOQUE A 1 PISO CAJERO 1A	$ 11.662.070


Con el siguiente resultado en los avalúos de los Locales localizados

Ilustración 26









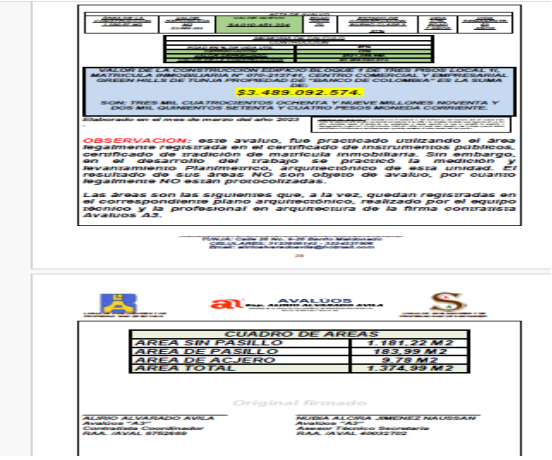




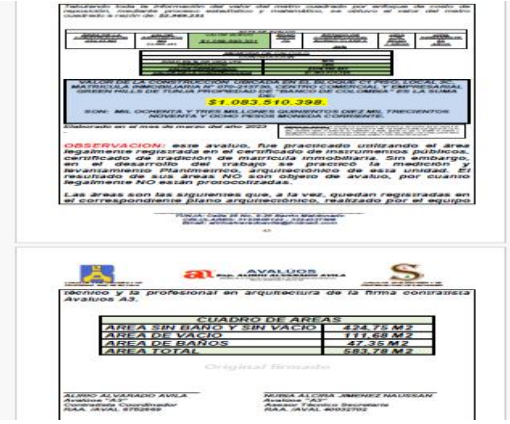




AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
BLOQUE C1 - PISO 1, LOCAL 2C "EDIFICIO C ESTETICA 1PISO"
DIRECCIÓN: AVENIDA UNIVERSITARIA N°75-00
MARZO – 2023
AVALUOS





AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
BLOQUE C3, PISO 3
LOCAL 12 C "ESQUINA INTERIOR FACHADA CURVA"
DIRECCIÓN: AVENIDA UNIVERSITARIA N°75-00
MARZO – 2023
AVALUOS



$977.136.071.
OBSERVACION: este avaluo, fue practicado utilizando el área legalmente registrada en el certificado de instrumentos públicos, certificado de tradición de matrícula inmobiliaria. Sin embargo, en el desarrollo del trabajo se practicó la medición y levantamiento Planimetrico, arquitectónico de esta unidad. El resultado de sus áreas NO son objeto de avaluo, por cuanto legalmente NO están protocolizadas.
Las áreas son las siguientes que, a la vez, quedan registradas en el correspondiente plano arquitectónico,



AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
técnico y la profesional en arquitectura de la firma contratista Avaluos A3.
CUADRO DE AREAS
AREA TOTAL 610,70 M2
Original firmado
ALIRIO ALVARADO AVILA
Avaluos "A3"
Contratista Coordinador
RAA. /AVAL 9752469
NUBIA ALCIRA JIMENEZ NAUSSAN
Avaluos "A3"
Asesor Técnico Secretaria
RAA. /AVAL 46032702

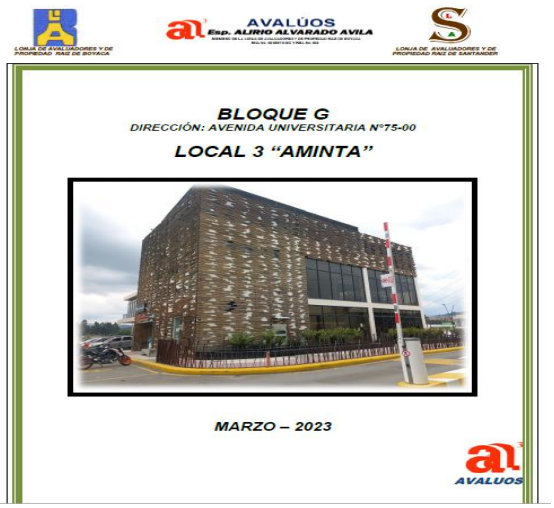

AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
BLOQUE G
DIRECCIÓN: AVENIDA UNIVERSITARIA N°75-00
LOCAL 3 "AMINTA"
MARZO – 2023
AVALUOS


AVALÚOS
Esp. ALIRIO ALVARADO AVILA
ACTA DE AVALUO
MEMORIA DE CALCULO CONTRUCCION
DEPRECIACION 40%
VALOR DEPRECIADO $559.680.705
VALOR DE LA CONSTRUCCION $839.521.058
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN EL BLOQUE G, LOCAL 3, MATRICULA INMOBILIARIA N° 070-199815, CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL GREEN HILLS DE TUNJA PROPIEDAD DE "BANCO DE COLOMBIA" ES LA SUMA DE:
$839.521.058.
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.
Elaborado en el mes de marzo del año 2023
OBSERVACION: este avaluo, fue practicado utilizando el área legalmente registrada en el certificado de instrumentos públicos, certificado de tradición de matrícula inmobiliaria. Sin embargo, en el desarrollo del trabajo se practicó la medición y levantamiento Planimetrico, arquitectónico de esta unidad. El resultado de sus áreas NO son objeto de avaluo, por cuanto legalmente NO están protocolizadas.
Las áreas son las siguientes que, a la vez, quedan registradas en el correspondiente plano arquitectónico, realizado por el equipo técnico y la profesional en arquitectura de la firma contratista Avaluos A3.

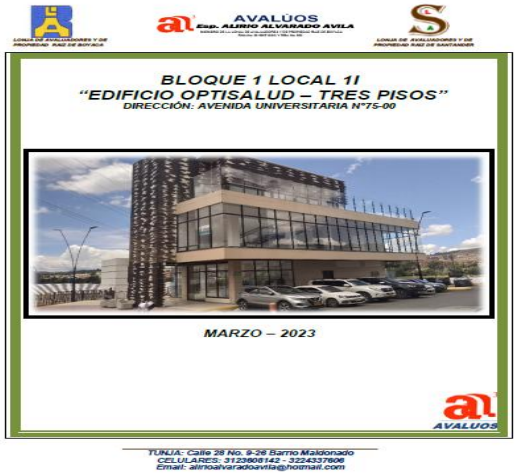

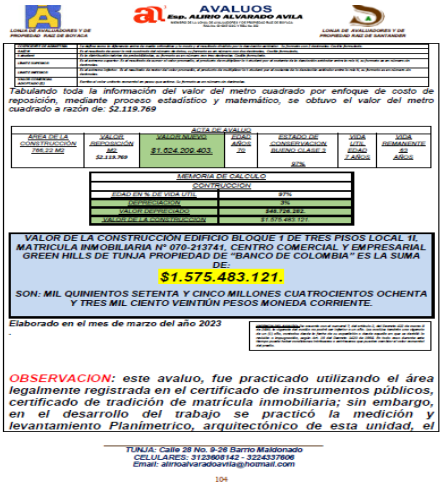

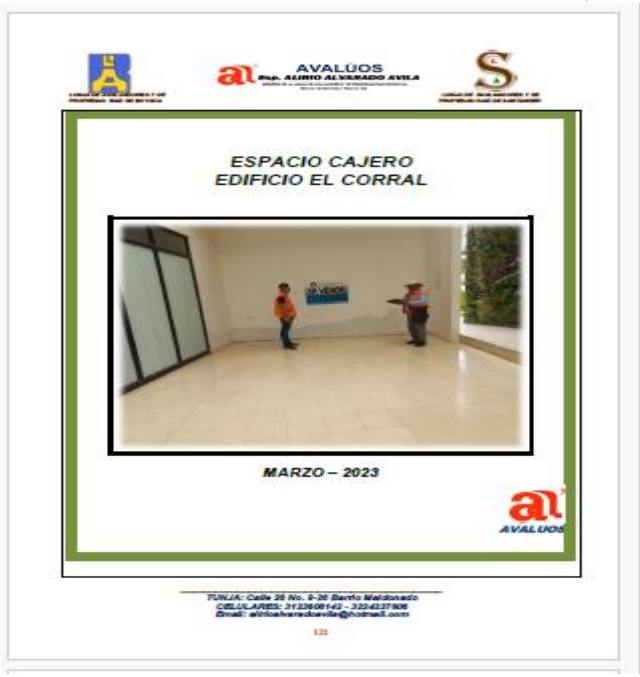

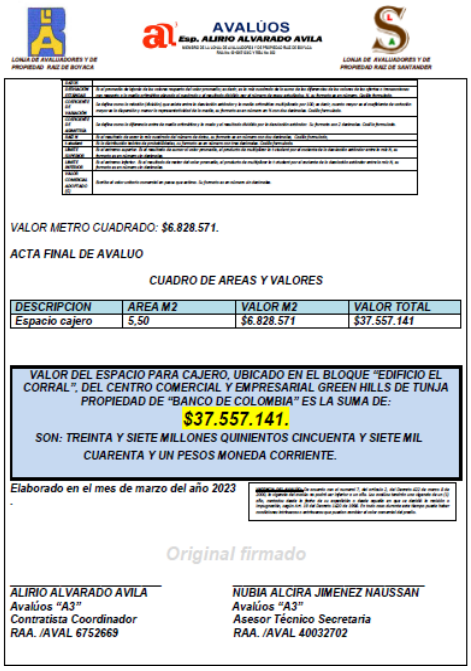

Por otra parte, aparece el informe de avalúo comercial actual estimado, practicado a un inmueble (Local comercial No. 3 – Bloque G, Segundo Piso) ubicado en el Centro Empresarial Green Hillis de la ciudad de Tunja – Boyacá Av. Universitaria No. 75 A -00 Local 3 – Bloque G – 2do piso, con fecha junio de 2025, no se vislumbra documento alguno donde autorizan la elaboración de este avalúo.

Ilustración 27

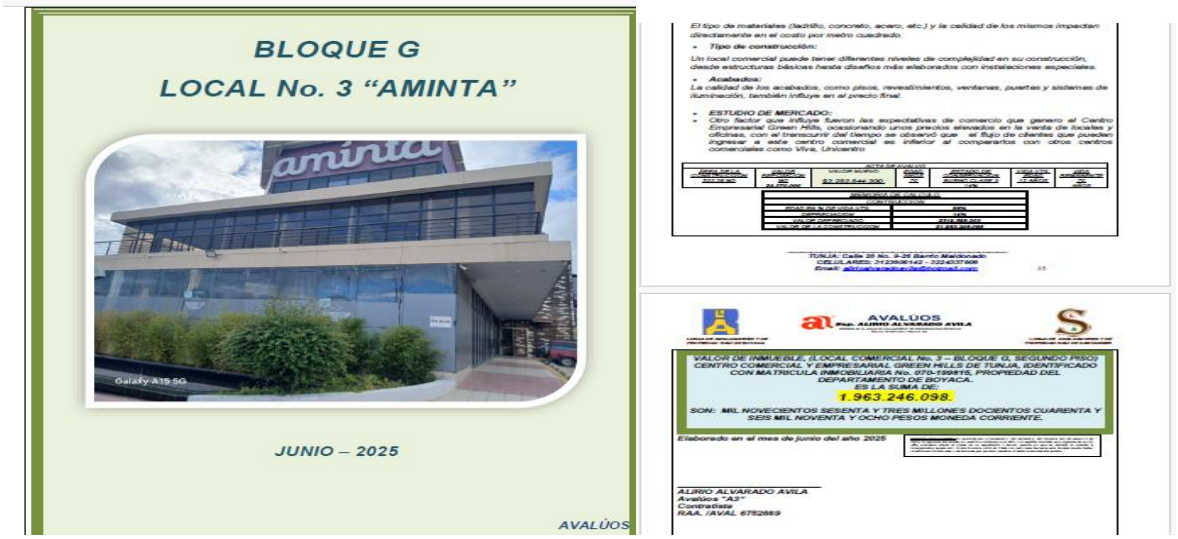


Tabla 41 LOCALES CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS - TUNJA

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO (ESCRITURA 2142 DE 22-09-2023)	VLR_AVALUO_COMERCIAL	VLR_CATASTRAL	VLR_AVALUO_COMERCIAL-MARZO 2023	VLR_AVALUO_COMERCIAL-JUNIO 2025	INCONSISTENCIA	OBSERVACIÓN
070-199815	Local 3 Bloque G Piso 2 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00. Escritura Publica No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a Tunja	749,632,412	1,963,246,098	1,065,553,000	839,521,058	1,963,246,098	1,213,613,686	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $749.632.412 valor comercial $749.632.412 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 010 a: Departamento de Boyacá anotación 011 A: GREE HILLS TUNJA, recibo de impuesto predial hasta el año 2025, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local $839.521.058 SIN FIRMAS. El valor catastral es superior al valor del avalúo. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $749.632.412 valor comercial $749.632.412 no explotado, Ficha técnica con fecha 02/10/2025 valor construcción $749.632.412 valor comercial $749.632.412 no explotado, certificado de tradición de fecha 11/08/2025 anotación 010 a: Departamento de Boyacá anotación 011 A: GREE HILLS TUNJA. RELACION DE INMUEBLES CON ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 2025 REALIZADA POR LA SEÑORA WILMA LUCERO ACOSTA CAÑAS, aparece avalúo por la suma de $1.963.246.098 APARECE REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Avalúo con fecha junio de 2025 aparece valor inmueble Local Comercial No. 3 Bloque G por la suma de $1.963.246.098.

070-213680	Local Cajero 1A Bloque A Piso 1 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00. Escritura Publica No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a de Tunja.	11,662,070	11,662,070	11,220,000	62,413,139		50,751,069	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $11.662.070 valor comercial $11.662.070 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 014 a: Departamento de Boyacá, anotación 015 a: GREE HILLS Reforma reglamento propiedad horizontal... anotación 16 de: GREE HILLS Reforma reglamento propiedad horizontal, recibo de impuesto predial hasta año 2024, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local 37.557.141 SIN FIRMAS. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $11.662.070 no explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 anotación 014 a: Departamento de Boyacá, anotación 015 a: GREE HILLS Reforma reglamento propiedad horizontal... anotación 16 de: GREE HILLS Reforma reglamento propiedad horizontal. Ficha técnica de fecha 09/06/2025 valor construcción $11.662.070 valor comercial $11.662.070 no explotado, Impuesto predial vigente hasta 2025.
070-213729	Local 2C Bloque C Piso 1 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00. Escritura Publica No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a Tunja	801,111,645	801,111,645	712,773,000	902,696,700		101,585,055	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $801.111.645 valor comercial $801.111.645 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS, anotación 015 A: GREE HILLS, recibo de pago impuesto predial hasta el año 2024, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local $902.696.700 SIN FIRMAS. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $801.111.645 valor comercial $801.111.645 no explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025. Ficha técnica de fecha 06/06/2025 valor construcción $801.111.645 valor comercial $801.111.645 no explotado, recibo de pago impuesto predial hasta el año 2025.
070-213730	Local 3C Bloque C Piso 1 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00. Escritura Pública No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a Tunja	995,675,223	995,675,223	947,212,000	1,083,510,398		87,835,175	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $995.675.223 valor comercial $995.675.223 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA, recibo de impuesto predial hasta el año 2025, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local $1.083.510.398 SIN FIRMAS. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $995.675.223 valor comercial $995.675.223 no explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA anotación 15 de: GREE HILLS TUNJA. Ficha técnica de fecha 06/06/2025 valor construcción $995.675.223 valor comercial $995.675.223 no explotado.
070-213731	Local 4C Bloque C Piso 2 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00. Escritura Pública No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a Tunja	2,016,643,396	2,016,643,396	2,945,003,000	3,489,092,574		1,472,449,178	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $2.016.643.396 valor comercial $2.016.643.396 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA, recibo de impuesto predial hasta el año 2025, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local $3.489.092.574 SIN FIRMAS. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $2.016.643.396 valor comercial $2.016.643.396 no explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA anotación 015 De: GREE HILLS TUNJA. Ficha técnica de fecha 06/06/2025 valor construcción $2.016.643.396 valor comercial $2.016.643.396 no explotado

070-213732	Local 13C Bloque C Piso 2 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00. Escritura Pública No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a Tunja	19,381,076	19,381,076	19,129,000	37,557,141		18,176,065	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $19.381.076 valor comercial $19.381.076 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA, recibo de impuesto predial hasta el año 2025, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local $62.413.139 CON FIRMAS. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $19.381.076 valor comercial $19.381.076 no explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA, anotación 15 de: GREE HILLS TUNJA. Ficha técnica de fecha 09/06/2025 valor construcción $19.381.076 valor comercial $19.381.076 no explotado
070-213740	Local 12C Bloque C Piso 3 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00. Escritura Pública No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a Tunja	974,604,960	974,604,960	1,346,966,000	977,136,071		2,531,111	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $974.604.960 valor comercial $974.604.960 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 010 a: Departamento de Boyacá anotación 011 A: GREE HILLS TUNJA, recibo de impuesto predial hasta el año 2025, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local $977.136.071 SIN FIRMAS. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $974.604.960 valor comercial $974.604.960 no explotado, certificado de tradición con fecha 09/01/2025 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA anotación 015 de: GREE HILLS TUNJA. Ficha técnica de fecha 09/06/2025 valor construcción $974.604.960 valor comercial $974.604.960 no explotado
070-213741	Local 1I Bloque 1 Pisos 1, 2 y 3 GREEN HILLS Avenida Universitaria No. 75-00 Matricula 070-213741. Escritura Publica No 2142 del 22 de septiembre de 2023 Notaria 4a Tunja	1,017,144,218	1,017,144,218	1,620,667,000	1,575,483,121		558,338,903	Ficha técnica de fecha 03/11/2023 valor construcción $1.017.144.218 valor comercial $1.017.144.218 no explotado, certificado de tradición de fecha 16/04/2024 anotación 013 a: Departamento de Boyacá anotación 014 A: GREE HILLS TUNJA, recibo de impuesto predial hasta el año 2025, NO SE VISLUMBRA ESTUDIO DE TÍTULOS, avalúo de fecha marzo de 2023 valor local $1.575.483.121 SIN FIRMAS. Ficha técnica con fecha 21/05/2024 valor construcción $1.017.144.218 valor comercial $1.017.144.218 no explotado. Ficha técnica de fecha 09/06/2025 valor construcción $1.017.144.218 valor comercial $1.017.144.218 no explotado, certificado de tradición de fecha 05/02/2026 anotación 010 a: Departamento de Boyacá anotación 011 A: GREE HILLS TUNJA

FUENTE: DOCUMENTOS SECOP II – SECRETARIA CONTRATACION GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Los siguientes bienes pertenecientes a la cuenta 16 Propiedad, Planta y Equipo no fueron reportados en los estados financieros a 31 de diciembre de 2025, ni fueron reportados en la cuenta 15 Inventarios, tal como se establece en la siguiente tabla.

Tabla 42 BIENES DE PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO GOBERNACION DE BOYACÁ

No.	PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIÓN
1	56086	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXJSKH46575 MODELO 2026 MOTOR OO1098338 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760164 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, modelo 2026, motor 001098338 CHASIS NKJ851FXJSKH46575- . Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186976 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
2	56086	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXJSKH46575 MODELO 2026 MOTOR OO1098338 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760164 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, modelo 2026, motor 001098338 CHASIS NKJ851FXJSKH46575- . Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186976 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.

3	56085	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXCSAKH46576 MODELO 2026 MOTOR OO1098332 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760162 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, modelo 2026, motor 001098332 CHASIS NKJ851FXCSAKH46576- . Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186975 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
4	56093	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXASKH47313 MODELO 2026 MOTOR 001095681 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760574 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, modelo 2026, motor 001095681 CHASIS NKJ851FXASKH47313 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186983 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
5	56088	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXHS MODELKH46293 2026 MOTOR 001094007 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC759517 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXHS MODELO 2026 MOTOR 001094007 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186978 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
6	56096	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXLSKH46592 MODELO 2026 MOTOR 001098334 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760161 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXLSKH46592 MODELO 2026 MOTOR 001098334 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186986 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
7	56091	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXLSKH46296 MODELO 2026 MOTOR 001093668 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC759520 valor avaluó NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXLSKH46296 MODELO 2026 MOTOR 001093668 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186987 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
8	56095	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXESKH47315 MODELO 2026 MOTOR 00109910 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760569 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXESKH47315 MODELO 2026 MOTOR 00109910 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186985 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
9	56089	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXESKH46999 MODELO 2026 MOTOR 001098336 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760567 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXESKH46999 MODELO 2026 MOTOR 001098336 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186979 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
10	56087	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXCSKH46996 MODELO 2026 MOTOR 001095669 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760566 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXCSKH46996 MODELO 2026 MOTOR 001095669 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186977 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
11	56092	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXVSKH47000 MODELO 2026 MOTOR 001093669 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760565 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXVSKH47000 MODELO 2026 MOTOR 001093669 -. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186982 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
12	56097	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXVSKH46589 MODELO 2026 MOTOR 001098331 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760165 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXVSKH46589 MODELO 2026 MOTOR 001098331- . Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186981 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348 .
13	56094	RETROCARGADOR VOLVOCASE851FX SOBRE NEUMATICOS SERIAL: NKJ851FXPSKH47317 MODELO 2026 MOTOR 0011001327 COLOR NARANJA	687,384,520.00	No REGISTRO MC760571 valor avalúo NA. Descripción: REETROCARGADOR, CHASIS: NKJ851FXPSKH47317 MODELO 2026 MOTOR 0011001327- . Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186984 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $687,384,520 valor depreciado $11,647,348.
14	56108	TRACTO CAMION MARCA SCANIA LINEA G500A6X4 MODELO 2026 MOTOR DC13174L018495506 CHASIS 9BSG6X400T41083	1,084,894,248.00	PLACA QLP 995 valor avalúo NA. Descripción: TRACTOCAMION, MOTOR DC13174L018495506 CHASIS 9BSG6X400T41083- . Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186579 fecha de ingreso 31/12/2025, valor costo $1,084,894,248 valor depreciado $21,999,244.
15	56109	VEHICULO SEMIREMOLQUE BISTON TRUCKS CHASIS 9F9CHJ3RMSP185001	407,827,875.00	PLACA S79947 valor avalúo NA. Descripción: SEMIREMOLQUE, CHASIS 9F9CHJ3RMSP185001- . Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186580 fecha de ingreso 19/12/2025, valor costo $407,827,875 valor depreciado $8,269,843.
16	56107	CAMION CAMABAJA CHASIS+PLATAFORMA MARCA CHEVROLET LINEA NPR MODELO 2025 MOTOR 4JZI-281V59 CHASIS JAANPR88HD700525 CILINDRAJE 2999	392,708,488.00	PLACA QKM 995 valor avalúo NA. Descripción: GRUA PLANCHON, MOTOR 4JZI-281V59 CHASIS JAANPR88HD700525. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 184578 fecha de ingreso 19/12/2025, valor costo $392,708,488 valor depreciado $7,963,255. .
17	56110	Vehículo camión CAMION FURGON CARRO TALLER MARCA CHEVROLET LINEA QR MODELO 2025, MOTOR 4HK1-0ZM556 CHASIS JAAN1R90KS7100372 CILINDRAJE 5193 COLOR BLANCO NIEBLA, SERVICIO OFICIAL PLACA QLP998CAMION FURGON CARRO TALLER MARCA CHEVROLET LINEA QR MODELO 2025, MOTOR 4HK1-0ZM556 CHASIS JAAN1R90KS7100372 CILINDRAJE 5193 COLOR BLANCO NIEBLA, SERVICIO OFICIAL PLACA QLP998	402,693,954.00	PLACA QLP 998 valor avalúo NA. Descripción: GRUA PLANCHON, MOTOR 4JZI-281V59 CHASIS JAANPR88HD700525. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 184577 fecha de ingreso 19/12/2025, valor costo $402,693,954 valor depreciado $8,165,738.
18	56116	VEHICULO VOLQUETAVOLQUETA SENCILLA VOLCO DE 8M3 MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 CILINDRAJE7790CC COLOR BLANCO NIEBLE SERVICIO OFICIAL MOTOR 6HK1-AA8481, PLACA QLQ008 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA SOAT Y TRANSPORTE	611,597,769.00	PLACA QLQ 008 valor avalúo NA. Descripción: VOLQUETA, MOTOR 6HK1-AA8481 CHASIS JALFVR34LT7000074. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186746 fecha de ingreso 30/01/2026, valor costo $611,597,769 valor depreciado $5,436,424.
19	56114	VEHICULO VOLQUETAVOLQUETA SENCILLA VOLCO DE 8M3 MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 CILINDRAJE7790CC COLOR BLANCO NIEBLE SERVICIO OFICIAL MOTOR 6HK1-AA6735. NUMERO CHASIS JALFVR34LT7000075 PLACA QLQ006 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA SOAT Y TRANSPORTE	611,597,769.00	PLACA QLQ 006 valor avalúo NA. Descripción: VOLQUETA, MOTOR 6HK1-AA6735. NUMERO CHASIS JALFVR34LT7000075. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186747 fecha de ingreso 30/01/2026, valor costo $611,597,769 valor depreciado $5,436,424.

20	56111	VEHICULO VOLQUETAVOLQUETA SENCILLA VOLCO DE 8M3 MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 CILINDRAJE7790CC COLOR BLANCO NIEBLE, CHASISJALFVR34LT7000049 SERVICIO OFICIAL MOTOR 6HK1-AA6735, PLACA QLQ004 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA SOAT Y TRANSPORTE	611,597,769.00	PLACA QLQ 004 valor avalúo NA. Descripción: VOLQUETA, CHASIS JALFVR34LT7000049, MOTOR 6HK1-AA6735. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186741 fecha de ingreso 30/01/2026, valor costo $611,597,769 valor depreciado $5,436,424.
21	56112	VEHICULO VOLQUETAVOLQUETA SENCILLA VOLCO DE 8M3 MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 CILINDRAJE7790CC COLOR BLANCO NIEBLE SERVICIO OFICIAL MOTOR 6HK1-AA6957, PLACA QLQ003 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA SOAT Y TRANSPORTE	611,597,769.00	PLACA QLQ 003 valor avalúo NA. Descripción: VOLQUETA, CHASIS JALFVR34LT7000054, MOTOR 6HK1-AA6957. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186742} fecha de ingreso 30/01/2026, valor costo $611,597,769 valor depreciado $5,436,424.
22	56113	VEHICULO VOLQUETAVOLQUETA SENCILLA VOLCO DE 8M3 MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 CILINDRAJE7790CC COLOR BLANCO NIEBLE SERVICIO OFICIAL MOTOR 6HK1-AA6962, PLACA QLQ002 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA SOAT Y TRANSPORTE	611,597,769.00	PLACA QLQ 002 valor avalúo NA. Descripción: VOLQUETA, CHASIS JALFVR34LT7000053, MOTOR 6HK1-AA6962. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186743 fecha de ingreso 30/01/2026, valor costo $611,597,769 valor depreciado $5,436,424.
23	56117	VEHICULO VOLQUETAVOLQUETA SENCILLA VOLCO DE 8M3 MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 CILINDRAJE7790CC COLOR BLANCO NIEBLE SERVICIO OFICIAL MOTOR 6HK1-AA7008, PLACA QLQ001 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA SOAT Y TRANSPORTE	611,597,769.00	PLACA QLQ 001 valor avalúo NA. Descripción: VOLQUETA, CHASIS JALFVR34LT7000058, MOTOR 6HK1-AA7008. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186744 fecha de ingreso 30/01/2026, valor costo $611,597,769 valor depreciado $5,436,424.
24	56121	EXCAVADORA HITACHI Numero de motor 889774 NUMERO DE CHASIS HCMDCK90P00308893 COLOR NARANJA CILINDRAJE 5193	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC756954 valor avalúo NA. Descripción: EXCAVADORA, MODELO:2025 - Numero de motor 889774 NUMERO DE CHASIS HCMDCK90P00308893. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186968 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,131,877,485 valor depreciado $22,008,728.
25	56124	EXCAVADORAEXCAVADORA HITACHI ZX210LC-5B SOBRE ORUGA - SERIAL: HCMDCK90E00308906 - AÑO FABRICACION 2025 - ANO MODELO: 2026 MOTOR 890162 - MARCA MOTOR: ISUZU COLOR NARANJA.	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC756964 valor avalúo NA. Descripción: EXCAVADORA, MODELO:2025 - SERIAL: HCMDCK90P00308957 - MOTOR 893166. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186967 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,131,877,485 valor depreciado $22,008,728.
26	56101	MOTONIVELADORA CASE 845C-C SOBRE NEUMATICOS SERIAL: HBZN845CHSAF10965 AÑO FABRICACION 2025, AÑO MODELO 2026, MOTOR 002268874 COLOR NARANJA	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC760429 valor avalúo NA. Descripción: MOTONIVELADORA, MODELO:2025 -SSERIAL: HBZN845CHSAF10965 MOTOR 002268874. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186969 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,624,787,343 valor depreciado $18,354,079.
27	56102	MOTONIVELADORA CASE 845C-C SOBRE NEUMATICOS SERIAL: HBZN845CHSAF10958 AÑO FABRICACION 2025, AÑO MODELO 2026, MOTOR 002268873 COLOR NARANJA	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC760425 valor avalúo NA. Descripción: MOTONIVELADORA, MODELO:2026 -SERIAL: HBZN845CHSAF10958 AÑO MOTOR 002268873. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186970 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,624,787,343 valor depreciado $18,354,079.
28	56106	MOTONIVELADORA CASE 845C-C SOBRE NEUMATICOS SERIAL: HBZN845CHSAF10913 AÑO FABRICACION 2025, AÑO MODELO 2026, MOTOR 002253039 COLOR NARANJA	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC760425 valor avalúo NA. Descripción: MOTONIVELADORA, MODELO:2026 -SERIAL: HBZN845CHSAF10913 MOTOR 002253039. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186971 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,624,787,343 valor depreciado $18,354,079.
29	56104	MOTONIVELADORA CASE 845C-C SOBRE NEUMATICOS SERIAL: HBZN845CHSAF10922 AÑO FABRICACION 2025, AÑO MODELO 2026, MOTOR 0022581786 COLOR NARANJA	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC758986 valor avalúo NA. Descripción: MOTONIVELADORA, MODELO:2026 -SERIAL: HBZN845CHSAF10922, MOTOR 0022581786. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186972 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,624,787,343 valor depreciado $18,354,079.
30	56105	MOTONIVELADORA CASE 845C-C SOBRE NEUMATICOS SERIAL: HBZN845CHSAF10949 AÑO FABRICACION 2025, AÑO MODELO 2026, MOTOR 002266898 COLOR NARANJA	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC760427 valor avalúo NA. Descripción: MOTONIVELADORA, MODELO:2026 -SERIAL: HBZN845CHSAF10949 MOTOR 002266898. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186973 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,624,787,343 valor depreciado $18,354,079.
31	56105	MOTONIVELADORA CASE 845C-C SOBRE NEUMATICOS SERIAL: HBZN845CHSAF10960 AÑO FABRICACION 2025, AÑO MODELO 2026, MOTOR 002266878 COLOR NARANJA	1,131,877,485.00	REGISTRO NO MC760428 valor avalúo NA. Descripción: MOTONIVELADORA, MODELO:2026 -SERIAL: HBZN845CHSAF10960 MOTOR 002266878. Ficha técnica elementos devolutivos id ingreso 186974 fecha de ingreso 31/12/25, valor costo $1,624,787,343 valor depreciado $18,354,079.
		TOTAL	**23,948,729,819.00**	

Fuente: DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Información con inconsistencias que no refleja la realidad económica y social de la Gobernación de Boyacá, lo anterior podría incrementar el riesgo de detrimento patrimonial en la suma de **$130.713.500**. puesto que no se ha cumplido con el propósito de actualizar los bienes de la cuenta16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

en la base de datos que maneja la Gobernación de Boyacá a pesar de estar contemplado esta

CRITERIO: Mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. El Marco conceptual constituye la base para el desarrollo normativo, instrumental y doctrinal del regulador y, por ende, tiene valor normativo superior a la regulación que de él se deriva, por lo tanto, los terrenos sobre los que se construyen los bienes de uso público se reconocerán por separado, así las cosas, la Entidad no ha logrado identificar los terrenos que hacen parte de los Bienes de uso público.

Numeral 4.1 de la Resolución N°525 de 2016 por la cual se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso contable y sistema documental contable. Resolución N°620 de 2015 mediante la cual se incorporó el Catálogo General de Cuentas utilizado por las Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación. Inobservancia de la Resolución 494 de 2017. Resolución 620 de 2008 del IGAC y Decreto 1420 de 1998, los avalúos se deben realizar bajo las normas NIIF y otras leyes aplicables. Ley 80 de 1993 en especial el art. 23 y siguientes y sus Decretos reglamentarios.

Aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso no se encuentran integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad. Inobservancia de la Resolución 494 de 2017.


CAUSA: Situación que presenta debilidades en la determinación de la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar a la información financiera.

EFECTO: Presentación de la información en el Estado de Situación Financiera con inconsistencias en su clasificación de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.

Una vez analizada y verificada la información allegada por la Gobernación de Boyacá y la respuesta por parte de la Secretaria General, de la Cuenta 16 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** relacionada con los avalúos de 25 que en

últimas corresponde a 29 bienes inmuebles de propiedad del Departamento de Boyacá, se confirma que estos avalúos no se encuentran incorporados en las carpetas de cada bien, tampoco se encuentran en los Estados Financieros de la Entidad, donde se establece que el tiempo de duración en realizar los avalúos es inferior con el tiempo que transcurre para el proceso de verificación y trámite de la ficha técnica e incorporación en los estados financieros, estando ubicados la mayoría de bienes en la ciudad de Tunja.

Ilustración 22

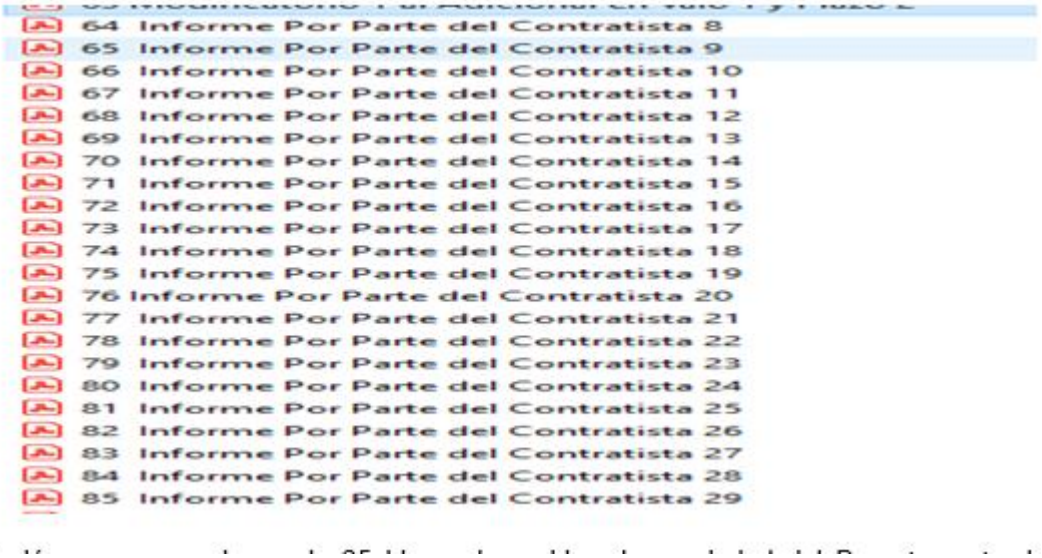

De otra parte, se establece que este contrato tiene Acta de recibo final a satisfacción con fecha 28 de julio de 2025, firmada por: ELSA MARINA GUTIERREZ LÓPEZ, y en el trabajo de campo de la Auditoria no se evidencio ninguna actuación realizada por la Entidad para actualizar los estados financieros, sólo hasta ahora en la respuesta mencionan la creación de un Comité de Gestión y Desempeño con reunión ordinaria de mesa técnica inventarios con fecha 25 de mayo de 2026, que no mencionaron en trabajo de campo y que aún no adjunta lo mencionado; por lo que se mantiene y se sugiere se tengan en cuenta las inconsistencias; así las cosas, la observación se configura como **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 8 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

Cuenta 17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 9. CUENTA 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES PRESENTA INCONSISTENCIAS EN SUBESTIMACIONES.

CONDICIÓN: Revisado el balance junto con los soportes suministrados por el sujeto de control, se evidencia que en cuenta **17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES** y de acuerdo con la muestra analizada, se presentan **SUBESTIMACIONES** por valor de $15.561.888.706, entre las principales.

El grupo Auditor en el análisis realizado a la subcuenta 1710 **Bienes de Uso Público en Servicio** detectaron dentro de la trazabilidad de la información denominada REPORTE CONTABLE RED CARRETERA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ versus la información reportada en el Estado de Situación Financiera**,** por lo que se debe terne en cuenta la columna observación y las diferencias presentadas, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 43 SEGUIMIENTOS BIENES DE USO PÚBLICO

Código Vía	Costo Histórico 2025	Costo Histórico 2024	Diferencia 2025-2024	VALOR MEJORAS VIGENCIA 2025	OBSERVACIÓN
60BY25	2,334,639,440.00	0.00	2,334,639,440.00		No se encuentra el código vial en reporte contable de 2024.
6102A	45,328,222,166.80	0.00	45,328,222,166.80	28,010,202,510.44	No se encuentra el código vial en reporte contable de 2024, pedir escritura del terreno, se realizó mejora en la vigencia 2025 por $28.010.202.510.44 en razón a que no se evidencia este bien en el año 2024.
55BY01-2	4,704,000,000.00	0.00	4,704,000,000.00		No se encuentra el código vial en reporte contable de 2024, pedir escritura del terreno
61BY10-1	4,239,885,110.00	0.00	4,239,885,110.00		No se encuentra el código vial en reporte contable de 2024, pedir escritura del terreno
D1564629	2,156,000,000.00	0.00	2,156,000,000.00		No se encuentra el código vial en reporte contable de 2024, pedir escritura del terreno
TOTAL INCONSISTENCIA POR VALOR TERRENO			58,762,746,716.80	28,010,202,510.44	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria Infraestructura Gobernación de Boyacá.

La inconsistencia se presenta en el mejoramiento de las vías, tal como se determina en la siguiente tabla.

Tabla 44 MEJORAS RED CARRETERAS

CÓDIGO VÍA	NOMBRE DEL MEJORAMIENTO	VALOR DEL MEJORAMIENTO	VALOR DE CONTRATO EN ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR LIQUIDACIÓN - VALOR MEJORAMIENTO	INCONSISTENCIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN O RECIBO FINAL	OBSERVACIÓN
D1558005	ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA LA VICTORIA - QUIPAMA SOBRE QUEBRADA LA MUCHILERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,443,114,223	1,464,670,016	21,555,793	21,555,793	2543 de fecha 03/06/2023	El valor que presenta en el acta de liquidación no concuerda con el valor presentado en el reporte de mejoramientos año 2025

D1558005	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE	101,020,597	102,527,755	1,507,158	1,507,158	RF 08 agosto 2025	El valor que presenta en el acta de recibo final no concuerda con el valor presentado en el reporte de mejoramientos año 2025
D1557201	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA	214,167,524	1,522,157,240	1,307,989,716	1,307,989,716	002 fecha 04/01/2023	El acta de liquidación tiene número 002 fecha 04/01/2023 no se especifica el municipio del contrato. Se encuentra una diferencia del valor del mejoramiento con lo que aparece en el acta de liquidación.
52688	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA. (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE PAUNA)	148,714,762	1,552,157,240	1,403,442,478	1,403,442,478	002 fecha 04/01/2023	
60BY09	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA. (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI)	343,246,458	1,522,157,240	1,178,910,782	1,178,910,782	002 fecha 04/01/2023	
D1558005	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA. (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA)	33,791,891	1,522,157,240	1,488,365,349	1,488,365,349	002 fecha 04/01/2023	
60BY08	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA. (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y MUZO)	660,920,674	1,522,157,240	861,236,566	861,236,566	002 fecha 04/01/2023	
60BY06	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA. (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO)	100,766,809	1,522,157,240	1,421,390,431	1,421,390,431	002 fecha 04/01/2023	
D1557201	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA". ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	12,086,642	85,903,638	73,816,996	73,816,996	2422 de 2023 fecha 25/05/2023	El acta de liquidación tiene número 2422 de 2023 donde no se especifica el municipio del contrato, Se encuentra una diferencia del valor del mejoramiento con lo que aparece en el acta de liquidación.
52688	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE	8,392,785	85,903,638	77,510,853	77,510,853	2422 de 2023 fecha 25/05/2023	

	LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA". ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE PAUNA						
60BY09	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA". ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI	19,371,270	85,903,638	66,532,368	66,532,368	2422 de 2023 fecha 25/05/2023	
D1558005	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA". (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA).	1,907,061	85,903,638	83,996,578	83,996,578	2422 de 2023 fecha 25/05/2023	
60BY08	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA". (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y MUZO).	37,299,360	85,903,638	48,604,279	48,604,279	2422 de 2023 fecha 25/05/2023	
60BY06	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA". (ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO).	5,686,821	85,903,638	80,216,818	80,216,818	2423 de 2023 fecha 25/05/2023	
	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACÁ Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CHITARAQUE PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE PARA EL AÑO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	96,848,505			96,848,505	Fecha registrada 6/03/2025	Se realizo revisión del formato 202507 donde se observó que en el reporte de mejoramiento entregado no se agregó el convenio con la asociación de juntas comunales de Chitaraque con un valor de 96.848.505 y su fecha de registrada es 06/03/2025
55BY08	MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CÓDIGO 55BY09 EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE LA BALSA – PANTANO DE VARGAS Y EL CORREDOR CON CÓDIGO 55BY08 EN EL TRAMO DENOMINADO PANTANO DE VARGAS - TERMALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	1,390,977,904			1,390,977,904	Fecha registrada 21/03/2025	Se realizo revisión del formato 202507 donde se observó que en el reporte de mejoramiento entregado no se agregó el mantenimiento del corredor vial, tramo puente la balsa-pantano de Vargas y del Pantano de Vargas - Termales con un código vial 55BY08 con un valor de 1.390.977.904 fecha registrada 21/03/2025
	TOTAL INONCISTENCIA				9,602,902,574		

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria Infraestructura Gobernación de Boyacá.

Según las notas a los a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025, establecen que la red de carretera del Departamento de Boyacá comprende la red vial secundaria que une a las cabeceras municipales entre sí, o que conecta una de ellas con una vía principal en el Departamento; así mismo se incluyen las vías primarias o terciarias sobre las cuales el Departamento de Boyacá tiene control, lo que puede ocurrir mediante convenio con la Nación o Municipio. La variación corresponde a las mejoras en la malla vial y adecuación de vías sobre las cuales el Departamento de Boyacá tiene control.

Por lo anterior, no se ha realizado un avance significativo en la identificación catastral, jurídica y geográfica, así como en el reconocimiento contable, de los terrenos sobre los que se construyen los bienes de uso público los cuales se reconocerán por separado. Aunado a esto la Entidad en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025 **no se incluye la subcuenta contable 170516 Terrenos**, por tanto, no se da cumplimiento al manual de política contable expedido por la Gobernación de Boyacá, esta es una de las inconsistencias señaladas en el plan de mejoramiento de la vigencia 2024.

El grupo Auditor en el análisis realizado a la subcuenta 1715 **Bienes Históricos y Culturales** detectaron dentro de la trazabilidad a la información suministrada por las Secretarias involucradas en estos procesos, con las inconsistencias señaladas en la siguiente tabla:

Monumentos.

Tabla 45 MONUMENTOS

MAT_anterior	DESCRIPCION_INMUEBLE	VLR_COSTO	VLR_AVALUO_ COMERCIAL	VALOR AVALÚO FEEBRERO DE 2025	INCONSISTENCIA	OBSERVACIONES
070-39019-C1	Monumento Histórico "Claustro San Agustín" Carrera 8 No. 15 - 08/28 Municipio de Villa de Leyva. Escritura Pública No.298 de diciembre 08 de 1946 Notaría Única de Villa de Leyva. Acta de Cesión del Ministerio de Educación Nacional de mayo 10 de 1996.	333,720,000.00	333,720,000.00	4.101.532.747.40	3,659,653,747.40	Ficha técnica de fecha 06/10/2020 valor terreno $270.010.000 valor construcción $441.879.000 valor comercial $711.889.000, en servicio funciona el Instituto de Investigación de recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, recibo de impuesto a 2023 pero no está cancelado, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 a: Departamento de Boyacá, estudio de títulos de fecha 24/08/2021 recomendaciones: Abstener de enajenar o destinar el inmueble distinta a la prestación de servicio público de educación, mantenerlo dentro de los estados financieros del depto. Se recomienda realizar nuevo avalúo. Avalúo de febrero de 2018 valor terreno $270.010.000 construcción antigua $333.720.000, construcción reciente $108.159.000 valor

						construcción $441.879.000 valor total $711.889.000. Certificado de tradición con fecha 09/01/2025 a: Departamento de Boyacá|, Ficha técnica de fecha 02/10/2025 valor terreno $11.077.334.718 valor construcción $4.101.532.747.40 valor comercial $15.178.867.465.40, en servicio funciona el Instituto de Investigación de recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, certificado de tradición de fecha 22/10/2025 anotación No 5 a: Departamento de Boyacá, avalúo de febrero de 2025 valor terreno $11.077.334.718 valor construcción $4.101.532.747.40 valor total $15.178.867.465.40.
070-92193	Monumento Histórico "Casa Eduardo Santos" Carrera 8 No.20 - 84/88/92/96 Municipio de Tunja. Escritura Pública No. 1223 de septiembre 05 de 1964 Notaría Primera de Tunja.	17,216,000.00	17,216,000.00	4.300.580.156	4,283,364,156.00	Ficha técnica de fecha 13/10/2020, valor terreno $1.036.401.000 valor construcción $17.216.000, valor comercial $1.053.617.000 no explotados, monumento que está siendo restaurado por el Ministerio de Cultura, impuesto predial hasta el año 2023, certifica estudio de título sin fecha recomendación debe permanecer en los estados financieros del depto. debe conservar su destinación especifica de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Cultura, que fue declarado monumento nacional, se debe poner en funcionamiento, certificado de tradición de fecha 10/05/2023 en anotación 3 de: departamento administrativo de seguridad DAS seccional Boyacá de: departamento de Boyacá, avalúo de fecha febrero de 2018 Valor terreno $1.036.401.000 valor monumento $17.216.000 valor total $1.053.617.000. Escritura Pública No.1151 de junio 11 de 2004 Notaria Segunda de Tunja. NOTA: FALTA NUEVO AVALÚO POR LAS MEJORAS REALIZADAS. Acta parcial No. 15 de fecha 30/12/2020 por valor acumulado de $4.271.957.638 equivalente al 99.73% de ejecución. Acta de liquidación bilateral del contrato de obra 3548-2018 Suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Consorcio MO SANTOS 2018 con un valor total pagado de $4.778.365.880 y contrato de interventoría No. 3247-18 por valor de $406.387.370. Escritura Pública No.1151 de junio 11 de 2004 Notaria Segunda de Tunja. Ficha técnica de fecha 30/09/2025, valor terreno $1.036.401.000 valor construcción $4,300,580,156, valor comercial $5,336,981,156 en administración, monumento entregado en administración a la secretaria de cultura y patrimonio, certificado de tradición de fecha 15/08/2024 en anotación 3 de: departamento administrativo de seguridad DAS seccional Boyacá de: departamento de Boyacá
TOTAL INCONSISTENCIA					$ 7,943,017,903	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Secretaria General Gobernación de Boyacá.

CRITERIO: Mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la

Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. El Marco conceptual constituye la base para el desarrollo normativo, instrumental y doctrinal del regulador y, por ende, tiene valor normativo superior a la regulación que de él se deriva, por lo tanto, los terrenos sobre los que se construyen los bienes de uso público se reconocerán por separado, así las cosas, la Entidad no ha logrado identificar los terrenos que hacen parte de los Bienes de uso público.

Numeral 4.1 de la Resolución N°525 de 2016 por la cual se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso contable y sistema documental contable. Resolución N°620 de 2015 mediante la cual se incorporó el Catálogo General de Cuentas utilizado por las Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación. Inobservancia de la Resolución 494 de 2017. Resolución 620 de 2008 del IGAC y Decreto 1420 de 1998, los avalúos se deben realizar bajo las normas NIIF y otras leyes aplicables y son de estricto cumplimiento.

Aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso no se encuentran integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad. Inobservancia de la Resolución 494 de 2017.

CAUSA: Situación que presenta debilidades en la determinación de la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar a la información financiera.

EFECTO: Presentación de la información en el Estado de Situación Financiera con inconsistencias en su clasificación de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.

Información con inconsistencias que no refleja la realidad económica y social de la Gobernación de Boyacá, lo anterior podría incrementar el riesgo de detrimento patrimonial.

Una vez analizada y verificada la respuesta a esta observación por la Gobernación de Boyacá, estas no son amplias ni suficientes; respecto a la información del monumento histórico “Casa Eduardo Santos” informa que estos fueron registrados en el módulo PCTG, con fecha 30 de septiembre de 2025 y mencionan lo siguiente:

Ilustración 28

Respecto de la observación dentro del informe preliminar, me permito informar que la incorporación en el sistema de información financiera módulo PCTG- modulo inmuebles, fueron registradas el 30 de septiembre de 2025, con el comprobante de entrada de bienes inmuebles No 1; el cual se refleja:

- Valor de terreno por valor de $ 1.036.401.000
- Adiciones y mejoras por el valor de $4.283.364.156 (valor reflejado en el comprobante de entrada de bienes inmuebles)
- Valor del costo del monumento $ 17.216.000 (ver documentos anexos)

TOTAL, REGISTRO: $5.336.981.156

En la carpeta correspondiente a este bien no refleja lo informado, tampoco aparece el valor mencionado en los estados financieros, la ficha técnica no se encuentra ajustada a lo mencionado por la Entidad, tampoco se adjunta la respuesta estos documentos, por lo tanto, se confirma en todas sus partes la observación, aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso no se encuentran integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad. Por lo anterior, se configura la Observación como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 9** para que sea incluido en el plan de mejoramiento, este hallazgo es repetitivo.

Cuenta 19 Otros Activos

HALLAZGO DE AUDITORIA No.10. CUENTA 19 OTROS ACTIVOS PRESENTA INCONSISTENCIA EN SUBESTIMACIÓN.

CONDICIÓN: En la cuenta **OTROS ACTIVOS** del estado financiero a 31 de diciembre de 2025 realizada la trazabilidad junto con los soportes suministrados por las dependencias involucradas en este proceso financiero a 31 de diciembre de 2025 presenta SOBRESTIMACIÓN por valor de **$6.229.600.000,** entre las inconsistencias principales por lo que es necesario tener en cuenta la columna Observación junto con las diferencias presentadas**,** tal como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 46 OTROS ACTIVOS

SEGUIMIENTO, AMORTIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS					
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 2025					
ITEM	NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL	FECHA	CONTRATO	VALOR ANTICIPO	OBSERVACIÓN
1	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	4/28/2016	CONVENIO NO.2833/15	1,212,073,741	Terminado en plataforma - sin soportes de liquidación
2	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	12/11/2015	CONVENIO NO.151/15	997,063,207	Terminado en plataforma - sin soportes de liquidación
3	ESE CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO	29/09/2023	CONVENIO 2940/23	4,094,903,335	Liquidado 20/10/2025
4	CONSORCIO PAAT 2016	18/10/2019	CONTRATO No. 1898/16	453,715,994	liquidado 30/06/2023
5	TIERRASUA S.A.S.	23/11/2021	CONVENIO 2803/21	749,999,471	Se ordeno liquidación 2 de septiembre de 2022
6	CONSORCIO PLAZA PAIPA	6/09/2022	CONTRATO 3216/21	1,195,687,824	Terminado 21-04-2025
7	CONSORCIO EDILAB UPTC	14/10/2022	CONVENIO 1797/22	3,486,943,702	Terminado en plataforma - sin acta de liquidación

8	CONSORCIO SINIM PACHAVITA	11/03/2024	CONTRATO 3565/2023	2,224,510,959	Terminado en plataforma - sin soportes de liquidación
9	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	11/08/2023	CONVENIO 2576/23	4,500,000,000	Terminado 28-05-2025
10	MUNICIPIO DE TUNJA	11/10/2024	CONVENIO 2580/24	1,800,000,000	Terminado 24-04-2026
11	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	28/10/2024	CONVENIO 4003/24	1,802,059,889	Liquidado 6-05-2026
12	MUNICIPIO DE TUNJA	30/12/2024	convenio 1121/2024	1,153,688,964	Terminado en plataforma - sin soportes de liquidación
13	|	7/30/2025	CONVENIO 2160/25	1,620,621,239	Terminado 27/11/2025
14	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA	10/11/2025	CONVENIO CO1.PCCNTR 2863-2025	6,229,600,000	Liquidado desde 31/12/2025
15	EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P	11/10/2025	CONVENIO 002/25	1,000,000,000	Terminado en plataforma - sin soportes de liquidación
16	MUNICIPIO DE TOCA	27/11/2025	CONVENIO 3797 DE 2025	1,439,771,254	Terminado 30/12/2025
17	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1/12/2025	CONVENIO No 0820 DE 2025	8,927,010,000	Terminado en plataforma - sin soportes de liquidación
18	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	26/12/2025	CONTRATO 3788/25	4,052,098,918	Terminado en plataforma - sin soportes de liquidación
	TOTAL			46,939,748,497	
	saldo según balance a 31/12/2025			214,339,377,820.29	
	según soportes -contratos liquidados			46,939,748,497.36	**INCONCISTENCIAS**
	Saldo			167,399,629,322.93	

Fuente: Estados Financieros – Documentos Gobernación de Boyacá.

El grupo Auditor en el análisis realizado a la subcuenta 1906 **Avances y Anticipos** detectaron dentro de la trazabilidad a la información suministrada por las Dependencias involucradas en estos procesos, que generan en resultados que debe ser depurados puesto que son saldos que vienen desde el año 2005 hasta el año 2020 en un total de 294 contratos y/o convenios, que por su antigüedad muchos de ellos ya fueron liquidados y su anticipo ya fue entregado y ejecutado, por lo que no deben aparecer en los Estados Financieros.

De lo expuesto anteriormente, se presenta la relación de los anticipos de más de cinco años a los cuales se les debe hacer depuración, seguimiento y ejercer un control a fin de minimizar los riesgos que pueda ocasionar en los registros de los Estados Financieros de la Gobernación de Boyacá, tal como se señala en la siguiente tabla:

Tabla 47

CUENTA 1906 AVANCES Y ANTICIPOS CUENTA CONTABLE 1906010101		
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 2025		
No. DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	**AÑO DE LOS CONTRATOS**	**VALOR ANTICIPO**
2	2005	23,299,286.50
16	2007	32,070,620.00
4	2008	7,633,500.00
5	2009	327,430,500.00
45	2010	9,311,218,660.77
65	2011	11,662,704,507.33
24	2012	3,168,281,983.62
34	2013	2,067,141,502.39
6	2014	336,621,693.08
22	2015	13,802,389,965.48
12	2016	8,743,560,676.90
14	2017	21,461,172,059.63
21	2018	5,571,203,978.81

16	2019	2,737,658,674.63
8	2020	1,786,837,934.71
294	**TOTAL SALDO SEGÚN SOPORTE A 31/12/2025**	**81,039,225,543.85**

Fuente: Estados Financieros – Documentos Gobernación de Boyacá.

CRITERIO: Incumplimiento a la Resolución 533 de 2015, aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso no se encuentran integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad. Inobservancia de la Resolución 494 de 2017.

CAUSA: Falta de efectividad en la gestión de la información de la situación financiera de la Gobernación de Boyacá, por parte de los funcionarios encargados en la realización de este proceso y sus controles.

EFECTO: Reporte de la información financiera que no refleja la realidad económica y social de la Gobernación de Boyacá, lo que ocasiona riesgo de detrimento patrimonial por la inadecuada clasificación de la información, e inadecuada planeación de la gestión administrativa y financiera como resultado de una información con inconsistencias.

Analizada y verificada la respuesta a esta observación se considera que no es amplia, ni suficiente ni se adjuntan soportes que logren desvirtuar lo mencionado, no se puede tener acceso al link y en trabajo de campo no fue suministrado ningún avance al respecto, por lo tanto se debe realizar la depuración de la cuenta **19 OTROS ACTIVOS,** subcuenta 1906 **Avances y Anticipos** saldos que vienen desde el año 2005 hasta el año 2020, en un total de 294 contratos y/o convenios, que por su antigüedad muchos de ellos ya fueron liquidados y su anticipo ya fue entregado y ejecutado, por lo que no deben aparecer en los Estados Financieros. Por expuesto, se configura la Observación como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 10** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11. CUENTA 23 PRESTAMOS POR PAGAR PRESENTAN INCONCISTENCIAS

CONDICIÓN: En la cuenta **Préstamos por pagar** de la situación financiera a 31 de diciembre de 2025 de **$ 176.637.387.041,** en los soportes allegados al grupo auditor presentan un saldo de $172.578.017.795.74, presentando diferencia por valor de **$4.059.369.245,** valor que se presenta con los formatos presentados en la plataforma SIA CONTRALORIAS, tal como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 48 PRÉSTAMOS POR PAGAR

CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE DE 2025	SALDO DICIEMBRE 2025 SEGUN SOPORTE	DIFERENCIA	SALDO SEGÚN FORMATO F18A_CGB	DESEMBOLSO AÑO 2024 SEGÚN FORMATO F18A_CGB	DIFERENCIA
PRÉSTAMOS POR PAGAR	**176,637,387,041**	**172,578,017,795.74**	**4,059,369,244.84**	**172,578,017,796**	**172,578,017,796**	**4,059,369,245**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	**176,637,387,041**					
Préstamos banca comercial	126,545,163,665					
Préstamos banca de fomento	46,616,588,072					
Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	3,475,635,304					

Fuente: SIA CONTRALORIAS y Secretarias de Hacienda y Contratación Gobernación de Boyacá – SIA Misional

La Gobernación de Boyacá tiene empréstitos con las siguientes entidades Financiera; Banco Agrario de Colombia, Banco BBVA, Banco de Occidente, Bancolombia S.A., FINDETER S.A. e IDEBOY, con un saldo por desembolsar por valor de $88.355.732.777 correspondientes a los Bancos Occidente y Bancolombia S.A., tal como se establece en la siguiente tabla.

Tabla 49 SALDO CAPITAL - SALDO POR DESEMBOLSAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD FINANCIERA	COD_CONT_EMPRESTITO	INICIAC.	IDENT.	SALDO CAPITAL 31/12/2025	SALDO POR DESEMBOLSAR
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	611516139	12/2/2015	4001	0.00	
	Total 611516139			8,058,982,101.00	0.00
Total BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				**8,058,982,101.00**	**0.00**
BANCO BBVA	611516599	10/24/2017	4822	1,394,905,984.86	
Total BANCO BBVA				**11,706,520,462.65**	**0.00**
BANCO DE OCCIDENTE	611516709	12/22/2017	6714	576,063,612.00	
Total BANCO DE OCCIDENTE				**15,677,115,721.77**	**50,997,778,763.00**
BANCOLOMBIA S.A.	611517292	3/11/2019	1937	276,085,923.00	
Total BANCOLOMBIA S.A.				**88,255,600,096.54**	**37,357,954,014.00**
FINDETER S.A.	601500238	5/13/2022	7001	4,030,801,957.00	
Total FINDETER S.A.				**45,499,999,998.00**	**0.00**
IDEBOY	608505838	2/6/2019	298	140,473,023.00	
Total IDEBOY				**3,379,799,415.78**	**0.00**
TOTAL				**172,578,017,795.74**	**88,355,732,777.00**

FUENTE: Secretaria de Hacienda Gobernación de Boyacá.

La Información allegada al grupo auditor se en la tabla anterior, el saldo por desembolsar es por la suma de $**88,355,732,777** y en la siguiente tabla el saldo por comprometer asciende a la suma de $258.456.216.285, saldos que no son

coincidentes la diferencia corresponde a la suma de $170.100.483.508.07, tal como se observa.

Tabla 50 SEGUIMIENTO DEUDA PÚBLICA DESEMBOLSOS - SALDO POR COMPROMETER

ENTIDAD FINANCIERA	MONTO DEL EMPRESTITO	FECHA DEL EMPRESTITO	No DEL DESEMBOLSO	FECHA DEL DESEMBOLSO	SALDO POR COMPROMETER
BANCOLOMBIA S.A.	230,000,000,000	Septiembre 06 de 2024 Ordenanza No. 026 de 2024	2665	10/22/2025	162,903,478,066
BANCOLOMBIA S.A.			2468	8/29/2025	
FINDETER S.A	49,000,000,000	Diciembre 21 de 2020 Ordenanza No. 027 de 2020	7001	1/28/2021	49,000,000,000
			7002	1/28/2021	
			7003	1/28/2021	
			7004	1/28/2021	
			7005	1/28/2021	
BANCO DE OCCIDENTE	12,984,440,000	Julio 19 de 2019 Ordenanza No. 022 de 2019	1812	12/24/2019	12,975,500,000
IDEBOY	33,840,059,662	Septiembre 19 de 2018 Ordenanza No. 030 de 2018	298	2/6/2019	33,577,238,219
IDEBOY			2981	4/29/2019	
IDEBOY			2982	7/17/2019	
IDEBOY			2983	7/26/2019	
IDEBOY			2984	9/19/2019	
IDEBOY			2985	1/27/2020	
IDEBOY			2986	3/16/2020	
IDEBOY			2987	6/4/2020	
IDEBOY			2988	6/16/2020	
IDEBOY			2989	6/26/2020	
IDEBOY			29810	7/14/2020	
IDEBOY			29811	9/10/2020	
IDEBOY			29812	10/15/2020	
IDEBOY			29813	10/27/2020	
IDEBOY			29814	12/15/2020	
IDEBOY			29815	12/23/2020	
IDEBOY			29816	2/8/2021	
IDEBOY			29817	4/22/2021	
IDEBOY			29818	7/22/2021	
IDEBOY			29819	9/24/2021	
IDEBOY			29820	11/29/2021	
IDEBOY			29821	6/29/2022	
BANCO DE OCCIDENTE			824	8/2/2019	
BANCO DE OCCIDENTE			1133	9/18/2019	
BANCO DE OCCIDENTE			1474	11/1/2019	
BANCO DE OCCIDENTE			1581	11/20/2019	
BANCO DE OCCIDENTE			1616	11/26/2019	
BANCO DE OCCIDENTE			1714	12/16/2019	
BANCO DE OCCIDENTE			1797	12/24/2019	
BANCO DE OCCIDENTE			2186	3/13/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			2257	3/20/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			2391	5/21/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			2669	6/30/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			3058	10/29/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			3067	10/29/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			4707	12/3/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			5225	12/23/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			5373	12/30/2020	
BANCO DE OCCIDENTE			7767	5/14/2021	
BANCO DE OCCIDENTE			8278	6/17/2021	
BANCO DE OCCIDENTE			1652	10/25/2021	
BANCOLOMBIA S.A.			1937	3/11/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			2185	4/30/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			2365	5/30/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			2559	7/5/2019	

BANCOLOMBIA S.A.			2656	7/22/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			2919	9/12/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			3248	11/22/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			3304	12/10/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			3332	12/16/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			3372	12/23/2019	
BANCOLOMBIA S.A.			3568	2/18/2020	
BANCOLOMBIA S.A.			3793	6/12/2020	
BANCOLOMBIA S.A.			3858	7/1/2020	
BANCOLOMBIA S.A.			4218	12/7/2020	
BANCOLOMBIA S.A.			4378	12/7/2020	
BANCOLOMBIA S.A.			4425	12/23/2020	
BANCOLOMBIA S.A.			4464	1/14/2021	
BANCOLOMBIA S.A.			4700	3/17/2021	
BANCOLOMBIA S.A.			4900	5/5/2021	
BANCOLOMBIA S.A.			5298	8/12/2021	
BANCOLOMBIA S.A.			5356	8/13/2021	
TOTAL	**325,824,499,662**				**258,456,216,285**

FUENTE: Secretaria de Hacienda Gobernación de Boyacá.

El saldo por comprometer de $258.456.216.285, difiere del saldo por ejecutar del empréstito puesto que este es por valor de $114.240.899.437, que contiene la siguiente tabla y que es producto de la información suministrada por la Secretaria de Hacienda del Departamento de Boyacá a 31 de diciembre de 2025.

Tabla 51 SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Entidad Financiera	Descripción del Crédito	No. del Contrato para Inversión del Crédito	Valor del Contrato	Adición del Contrato	Valor Ejecutado del Empréstito	Saldo por Ejecutar del Empréstito
BANCOLOMBIA	Los Recursos Económicos producto de la Autorización otorgada por la Ordenanza No. 026 de 2024, serán destinados a la Financiación del Plan Departamental de Desarrollo "Nuestro Gran Plan Es Boyacá 2024 - 2027, en el Sector Infraestructura	0820/25	22,042,000,000		8,927,010,000	13,114,990,000
BANCOLOMBIA		2833/2025	12,355,041,952	-	3,706,512,586	8,648,529,366
		2971/2025	7.864,852,937	-	-	864,852,937
		83575569	53,640,557,596		26,505,344,524	27,135,213,072
		83576408.0/25	13,426,380,092		13,426,046,041	334,051
		3261/25	7,500,000,000	-	5,770,998,240	1,729,001,760
		83575570	5,152,700,000		-	5,152,700,000
		3817/25	8,118,542,150	-	3,587,411,862	4,531,130,289
		3819/25	6,665,490,169	-	2,938,071,725	3,727,418,444
		CO1.PCCNTR.8562188/3828	3,708,379,999	-	-	3,708,379,999
		3829/25	3,742,221,871	-	-	3,742,221,871
		CO1.PCCNTR.8563884/3831	5,689,532,537	-	-	5,689,532,537
		CO1.PCCNTR.8607154/3881	149,862,052	-	74,931,026	74,931,026
		CO1.PCCNTR.8604973/3882	398,407,673	-	199,203,837	199,203,837
		CO1.PCCNTR.8605843/3883	249,680,074	-	-	249,680,074
		CO1.PCCNTR.8605936/3887	199,376,651	-	99,688,325	99,688,325
		CO1.PCCNTR.8606978/3888	448,710,570	-	-	448,710,570
		CO1.PCCNTR.8607149/3890	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8608865/3901	398,407,673	-	199,203,837	199,203,837
		CO1.PCCNTR.8610303/3902	549,314,425	-	-	549,314,425
		CO1.PCCNTR.8605804/3880	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8607159/3894	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8606971/3891	89,897,642	-	-	89,897,642
		CO1.PCCNTR.8609367/3905	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8609026/3903	398,407,673	-	199,203,837	199,203,837
		CO1.PCCNTR.8609912/3904	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8609397/3906	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8607156/3916	149,862,052	267,702,330	-	149,862,052

		CO1.PCCNTR.8607527/3914	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.8604982/3913	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8611017/3922	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8609478/3920	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.8610087/3921	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.8608077/3919	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.8608359/3918	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.8611276/3924	398,407,673	-	199,203,837	199,203,837
		CO1.PCCNTR.8611813/3925	624,990,622	-	-	624,990,622
		CO1.PCCNTR.8612417/3927	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8612049/3926	74,651,332	-	37,325,666	37,325,666
		CO1.PCCNTR.8609384/3929	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8610328/3930	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8609608/3928	69,972,458	-	-	69,972,458
		CO1.PCCNTR.8610339/3931	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8610293/3933	599,615,295	-	299,807,648	299,807,648
		CO1.PCCNTR.8610877/3935	398,407,673	-	199,203,837	199,203,837
		CO1.PCCNTR.8611115/3934	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.8611316/3936	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8608089/3900	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.8608643/3896	448,710,570	-	224,355,285	224,355,285
		CO1.PCCNTR.8616209/3948	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8616209/3946	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8618636/3947	49,258,708	-	-	49,258,708
		891800498/3949	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8606974/3897	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8607163/3899	448,710,570	-	-	448,710,570
		CO1.PCCNTR.8606977/3895	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8606973/3917	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.8611244/3923	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8628644/3960	149,862,053	-	-	149,862,053
		CO1.PCCNTR.8605530/3892	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8635833/3980	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8638205/3987	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8628855/3959	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8638010/3974	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8636075/3975	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8637908/3978	1,099,655,481	-	549,827,741	549,827,741
		CO1.PCCNTR.8636044/3983	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8642029/3984	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.8638185/3985	261,517,365	-	-	261,517,365
		CO1.PCCNTR.8638005/3988	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8638011/3986	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.8638034/3993	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8628463/3961	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.8632557/3973	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8652605/4006	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8651664/4003	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8651659/4005	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8652611/4004	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8654611/4002	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8661599/4014	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8661490/4015	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8661801/4016	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8654244/4017	99,559,604	-	-	99,559,604

		CO1.PCCNTR.8635621/3977	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.8659920/4010	199,376,650	-	-	199,376,650
		CO1.PCCNTR.8659554/4011	149,862,052	-	-	149,862,052
		CO1.PCCNTR.8659993/4012	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.8660729/4018	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8664751/4019	149,862,052	-	-	149,862,052
		CO1.PCCNTR.8628138/4009	499,013,323	-	-	499,013,323
		CO1.PCCNTR.8673646/4029	99,559,604	-	-	99 ,559,604
		CO1.PCCNTR.8671521/4025	49,258,708	-	24,629,354	24,629,354
		CO1.PCCNTR.8673108/4036	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8677421/4039	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8677421/4037	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8676115/4040	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8673661/4030	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8675345/4033	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.8675241/4041	214,968,876	-	-	214,968,876
		CO1.PCCNTR.8679683/4047	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8675330/4034	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8679674/4045	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.8689101/4054	499,013,323	-	-	499,013,323
		CO1.PCCNTR.8691369/4060	499,013,323	-	-	499,013,323
		CO1.PCCNTR.8705925/4077	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8671719/4026	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8695641/4070	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8692252/4062	299,978,029	-	-	299,978,029
		CO1.PCCNTR.8691885/4063	49,258,708	-	24,629,354	24,629,354
		CO1.PCCNTR.8691895/4065	249,680,074	-	124,840,037	124,840,037
		CO1.PCCNTR.8706452/4079	50,739,511	-	-	50,739,511
		CO1.PCCNTR.8675984/4046	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8689136/4059	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8692406/4061	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.8687867/4053	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.8715939/4089	149,862,052	-	-	149,862,052
		CO1.PCCNTR.8712513/4090	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.8691789/4064	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9203937/2143	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9203871/2144	149,862,052	-	74,931,026	74,931,026
		CO1.PCCNTR.9205956/2145	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9205756/2146	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9205986/2147	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9205990/2148	374,729,243	-	187,364,621	187,364,621
		CO1.PCCNTR.9220595/2149	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9205849/2150	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802

		CO1.PCCNTR.9217211/2151	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.9217313/2152	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9217324/2153	799,557,931	-	399,778,965	399,778,965
		CO1.PCCNTR.9217378/2154	398,407,673	-	-	398,407,673
		CO1.PCCNTR.9217349/2155	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9217941/2156	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9218094/2157	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.9217797/2158	299,978,029	-	-	299,978,029
		CO1.PCCNTR.9218375/2159	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9235278/2160	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9218651/2161	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9218687/2162	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9218793/2163	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9218899/2164	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9219423/2165	124,952,662	-	-	124,952,662
		CO1.PCCNTR.9219637/2166	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9235733/2167	199,376,651	-	99,688,325	99,688,325
		CO1.PCCNTR.9203941/2223	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9246518/2230	74,651,332	-	37,325,666	37,325,666
		CO1.PCCNTR 9245527/2232	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9247610/2277	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9255375/2279	74,651,332	-	37,325,666	37,325,666
		CO1.PCCNTR.9260644/2280	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9266821/2319	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9265145/2297	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.9269783/2300	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.9270590/2301	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9264072/2302	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9273314/2303	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9269614/2305	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9268156/2304	49,258,708	-	24,629,354	24,629,354
		CO1.PCCNTR.9273150/2306	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9282118/2315	349,822,351	-	174,911,175	174,911,175
		CO1.PCCNTR.9282012/2313	99,559,604	-	49,779,802	49,779,802
		CO1.PCCNTR.9249780/2278	49,258,708	-	-	49,258,708
		CO1.PCCNTR.9261895/2281	99,559,604	-	-	99,559,604
		CO1.PCCNTR.9268156/2334	398,407,673	-	199,203,837	199,203,837
		CO1.PCCNTR.9290582/2341	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9289203/2345	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9290582/2350	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR.9306241/2356	74,651,332	-	-	74,651,332
		CO1.PCCNTR-9197870/2231	199,376,651	-	-	199,376,651
		CO1.PCCNTR.9308800/2360	74,651,332	-	-	74,651,332

		0820/25	11,021,000,000		-	11,021,000,000
FINDETER S.A.	La destinación de los Recursos Producto de la Autorización de la Ordenanza No. 027 de 2020 para el financiamiento de la Línea Estratégica y Humana y de Capacidades del Plan Departamental de Desarrollo, Componente Salud y Bienestar.	2780/21	4,376,715,945	-	3,939,044,351	437,671,595
FINDETER S.A.		3088/21	4,305,011,349	-	3,874,510,214	430,501,135
FINDETER S.A.		3000/22	1,428,890,940	1,483,299,631	1,428,890,940	-
FINDETER S.A.		3001/22	1,552,859,506	1,845,957,101	1,552,859,506	-
FINDETER S.A.		3214/22	1,995,179,723	-	1,995,179,723	-
FINDETER S.A.		3214/22	1,925,647,010	-	1,925,647,010	-
FINDETER S.A.		3000/22	2,150,836,410	1,483,299,631	1,789,863,675	360,972,735
FINDETER S.A.		3001/22	2,336,789,259	1,845,957,101	1,944,824,383	391,964,877
FINDETER S.A.		3214/22	2,992,769,584	-	2,992,769,584	-
FINDETER S.A.		3214/22	2,888,470,516	-	1,908,263,833	980,206,684
FINDETER S.A.		2751/23	17,046,829,758	-	17,046,829,758	-
FINDETER S.A.		2949/23	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-
BANCO DE OCCIDENTE	La destinación de los Recursos Producto de la Autorización de la Ordenanza No. 022 de 2019 son para la Inversión del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Transporte Escoñar para Municipios NO Certificados del Departamento de Boyacá	3556/19	12,975,500,000	-	12,975,500,000	-
INFIBOY	La destinación de los Recursos Producto de la Autorización de la Ordenanza No. 030 de 2018 son para la Inversión de Proyectos enfocados para Ejes Viales ($7.697´301.574,76) y Equipamientos Culturales, Recreativos, Deportivos e Institucionales ($26.142´758.086,80)	2758-01/2015	1,152,599,217	1,152,599,217	1,132,220,499	20,378,718
BANCOLOMBIA S.A.						
INFIBOY				53,196,887		
BANCOLOMBIA S.A.		2811-01/2015	53,196,887		-	53,196,887
BANCOLOMBIA S.A.				2,265,320,350		
BANCOLOMBIA S.A.		2381-2/2015	2,265,320,350		2,265,301,235	**19,115**
INFIBOY				-		
BANCOLOMBIA S.A.		263/19	828,056,724		828,051,986	**4,737**
INFIBOY				80,828,812		
BANCO DE OCCIDENTE		2410-3/15	80,828,812		80,828,812	-
BANCOLOMBIA S.A.				-		
BANCO DE OCCIDENTE		355/19	967,622,186		966,816,002	**806,184**
INFIBOY				-		
BANCO DE OCCIDENTE		744/19	200,000,146		180,000,131	**20,000,015**
BANCO DE OCCIDENTE				-		
BANCOLOMBIA S.A.		755/19	298,265,358		283,031,577	**15,233,781**
BANCO DE OCCIDENTE				-		
BANCOLOMBIA S.A.		758/19	904,996,377		904,984,143	**12,234**
BANCO DE OCCIDENTE				474,450,199		
BANCOLOMBIA S.A.						
BANCOLOMBIA S.A.		2063/19	4,459,681,162		4,459,681,162	-
BANCO DE OCCIDENTE				1,401,857,074		
INFIBOY		2081/19	3,100,279,511		3,097,225,545	3,053,966
BANCOLOMBIA S.A.				25,549,799		
BANCO DE OCCIDENTE						
BANCO DE OCCIDENTE		2084/19	240,160,000		240,160,000	-
INFIBOY				39,721,362,453		
BANCO DE OCCIDENTE						
INFIBOY		2085/19	291,744,864		291,744,864	-
BANCOLOMBIA S.A.				39,721,362,453		
INFIBOY						
INFIBOY		2085/19	13,415,971		13,415,971	-
BANCO DE OCCIDENTE				1,426,544,692		
BANCOLOMBIA S.A.						
INFIBOY		2102/19	4,213,418,140		4,213,418,140	-
INFIBOY				1,426,544,692		
BANCO DE OCCIDENTE						
BANCO DE OCCIDENTE		2102/19	248,637,371		248,637,371	-
INFIBOY				98,129,995		
INFIBOY						
BANCO DE OCCIDENTE		2152/19	217,019,565		217,019,565	-
BANCOLOMBIA S.A.						

BANCOLOMBIA S.A.						
BANCOLOMBIA S.A.		2313/19	810,705,581	-	810,611,334	94,247
BANCO DE OCCIDENTE						
INFIBOY				240,736,343		
INFIBOY		1635/18-01	240,736,343		240,736,343	-
BANCO DE OCCIDENTE						
BANCOLOMBIA S.A.				-		
IDEBOY		2318/19	602,371,527		602,357,032	14,495
BANCOLOMBIA S.A.						
IDEBOY				-		
BANCOLOMBIA S.A.		1641/18	3,439,090,614		3,439,090,614	-
BANCO DE OCCIDENTE						
BANCO DE OCCIDENTE				272,591,036		
IDEBOY		2541/19	660,600,355		660,600,355	-
BANCOLOMBIA S.A.						
BANCOLOMBIA S.A.		3471/19	7,745,500,557	3,084,112,150	7,745,500,557	-
IDEBOY						
BANCO DE OCCIDENTE						
IDEBOY				215,887,850		
IDEBOY		3552/19	542,990,600		542,990,600	-
			276,229,471,108	98,587,289,796	161,988,571,671	114,240,899,437

FUENTE: Secretaria de Hacienda Gobernación de Boyacá.

Con relación a la contratación realizada producto de estos empréstitos se realizó la trazabilidad con la información que presentan en el formato 18B_ AGR de la plataforma SIA CONTRALORÍAS, para lo cual se debe tener en cuenta la columna observaciones, tal como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 52 SEGUIMIENTO CONTRATACION CON RECURSOS DE EMPRÉSTITOS

No. del Contrato para Inversión del Crédito	Valor del Contrato	Objeto del Contrato	Carpeta Digitalizada del Contrato	Adición del Contrato	Estado del Contrato Liquidado - NO Liquidado	Observaciones
0820/25	22,042,000,000	REG BPPID 2024 00415 0444 A2 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS AMBIENTALES SOCIALES PREDIALES Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VADO HONDO LABRANZAGRANDE YOPAL	No tiene carpeta digitalizada			No se presenta carpeta digitalizada
2833/2025	12,355,041,952	DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DAÑO Y/O COLAPSO DE PUENTES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LA AFECTACIÓN CAUSADA POR EFECTO DE LA OLA INVERNAL DECLARADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 0522 DE 24 D	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8542594&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
2971/2025	864,852,937	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DAÑO Y/O COLAPSO DE PUENTES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LA AF	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8577458&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
83575569	53,640,557,596	REG BPPID 2024 00415 0408 - A2 SUMINISTRO Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION VIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS Y TRANSPORTE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, CON ENDOSO A F	No tiene carpeta digitalizada			No se presenta carpeta digitalizada
83576408.0/25	13,426,380,092	REG BPPID 2024 00415 0408 - A2 SUMINISTRO Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION VIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS Y TRANSPORTE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	No tiene carpeta digitalizada			No se presenta carpeta digitalizada

3261/25	7,500,000,000	REG BPPID 202500000032664 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8816707&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
83575570	5,152,700,000	REG BPPID 2024 00415 0408 - A2 SUMINISTRO Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION VIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS Y TRANSPORTE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, CON ENDOSO A F	No tiene carpeta digitalizada	-		No se presenta carpeta digitalizada
3817/25	8,118,542,150	REG BPPID 2025 000000 39385 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE TUNJA YTIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://www.boyaca.gov.co/convenio-interadministrativo-no-3817-de-2025-celebrado-entre-el-departamento-de-boyaca-el-municipio-de-tunja-y-tierrasua-s-a-s	-	NO LIQUIDADO	si
3819/25	6,665,490,169	REGISTRO BPPID: 202500000035339 A1 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://www.boyaca.gov.co/convenio-interadministrativo-no-3819-de-2025-celebrado-entre-el-departamento-de-boyaca-el-municipio-de-sogamoso-y-tierrasua-s-a-s	-	NO LIQUIDADO	si
CO1.PCCNTR.8562188/3828	3,708,379,999	REG BPPID 202500000039077 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9080802&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3829/25	3,742,221,871	REGISTRO BPPID: 2025 000000 336 20 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://www.boyaca.gov.co/convenio-interadministrativo-no-3829-de-2025-celebrado-entre-el-epartamento-de-boyaca-el-municipio-de-chiquinquira-y-tierrasua-s-a-s	-	NO LIQUIDADO	si
CO1.PCCNTR.8563884/3831	5,689,532,537	2025 000000 41024 REG BPPID AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8816707&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8607154/3881	149,862,052	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRIMERA Y SEGUNDA CHORRERA SECTOR MILAGRO Y PLAYITA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUND	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147897&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8604973/3882	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIO´N DE BOYACA´ Y JUNTA DE ACCIO´N COMUNAL DE LA VEREDA MODECA DEL MUNICIPIO DE CORRALES PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VI´AS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA´.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147811&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8605843/3883	249,680,074	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DEJUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147839&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8605936/3887	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CIELO ROTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147279&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8606978/3888	448,710,570	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TOGUI PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148585&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8607149/3890	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148211&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.8608 865/3901	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CHAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149383&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8610 303/3902	549,314,425	REG BPPID 202500000026609 A1 ACONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MUZO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149399&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8605 804//3880	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIO´N DE BOYACA´ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARCURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VI´AS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA´.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147826&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8607 159//3894	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 ACONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ESTEBAN DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148331&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8606 971/3891	89,897,642	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SACHICA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPART	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148623&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8609 367/3905	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150403&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8609 026/3903	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150028&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8609 912/3904	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GACAL SECTOR PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO D	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150326&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8609 397/3906	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHURUVITA SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150317&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8607 156/3916	149,862,052	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NEVAL Y CRUCES DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148143&isFromPublicArea=True&isModal=False	267,702,330	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8607 527/3914	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR LAJAS VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147842&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8604 982/3913	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA? Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CANOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147495&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8611 017/3922	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ALMENDRO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149490&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8609 478/3920	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149692&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

		SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.				
CO1.PCCNTR.8610087/3921	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149908&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8608077/3919	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE JOYAGUA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPART	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148736&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8608359/3918	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RINCHOQUE DELMUNICIPIO DE TURMEQUE PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148961&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8611276/3924	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO D	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149934&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8611813/3925	624,990,622	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DEGUAYATÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149943&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8612417/3927	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PANCUPA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149960&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8612049/3926	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SABANETAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAME	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9154487&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8609384/3929	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAME	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150410&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8610328/3930	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR EL VENADO DE LA VEREDA TIBAQUIRA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECU	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150323&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8609608/3928	69,972,458	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIATOCA DEL MUNICIPIO DE CHIVATA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149970&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8610339/3931	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150335&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8610293/3933	599,615,295	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150609&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8610877/3935	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150369&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.8611115/3934	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENT	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150612&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8611316/3936	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TEGUANEQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150614&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8608089/3900	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149122&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8608643/3896	448,710,570	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DECHIQUINQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9150372&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8616209/3948	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. CO1.PCCNTR.8616209 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARZAL DEL MUNICIPIO DE TENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAM	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9163320&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8616209/3946	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VALLE GRANDE ARRIBA-RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE TENZA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9166771&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8618636/3947	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APOSENTOS MUNICIPIO DE TENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE B	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9166876&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
891800498/3949	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9167058&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8606974/3897	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRIMERA CHORRERA SECTOR SANTA HELENA BARRANCA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148650&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8607163/3899	448,710,570	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PESCA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148605&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8606977/3895	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BARRERAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148659&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8606973/3917	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9148550&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8611244/3923	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9149495&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.8628 644/3960	149,862,053	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA DEPARTAMENTO DE BOYACA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9179511&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8605 530/3892	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RINCON DE ESPAÑOLES DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9147559&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8635 833/3980	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9190807&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8638 205/3987	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ALIZAL DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9191743&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8628 855/3959	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DIAZ SECTOR RONDON DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA, DEPARTAMENTO BOYACÁ, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9179806&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8638 010/3974	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHIMICHITA MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9191587&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8636 075/3975	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO ABAJO INSPECCION DE POLICIA DE PATIECITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9191236&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8637 908/3978	1,099,655,481	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9191885&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8636 044/3983	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIE DE PEÑA DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9191144&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8642 029/3984	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓ COMUNAL DE LA VEREDA PILAR Y CEIBITA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9199218&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8638 185/3985	261,517,365	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE EL POZO PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9194688&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8638 005/3988	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9191341&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8638 011/3986	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JOTAS DE BERBERO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE B	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9191976&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.8638034/3993	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUPAVITA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9194183&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8628463/3961	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CUBARA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9179517&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8632557/3973	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9166886&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8652605/4006	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CIENEGA BALVANERA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE B	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9212823&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8651664/4003	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARPEYA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPART	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9210094&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8651659/4005	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA MESA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9207055&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8652611/4004	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ESPARTAL PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9212860&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8654611/4002	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORALINA DE MONIQUIRA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN E	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9213302&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8661599/4014	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA Y CASABLANCA DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9225394&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8661490/4015	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHURUVITA DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL D	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224895&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8661801/4016	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL SECTOR PLAN DE LA ESCUELA INSPECCION DE COSCUEZ DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9225234&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8654244/4017	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TURMAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9213060&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8635621/3977	199,376,651	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS MEDIOS Y SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9189485&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8659920/4010	199,376,650	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE AYALAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9210829&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.8659554/4011	149,862,052	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE HIPAQUIRA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9211025&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8659993/4012	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CUCHARERO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9211028&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8660729/4018	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SEGUNDA CHORRERA SECTOR RIO MOLINERO AZUFRE DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224807&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8664751/4019	149,862,052	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BANCOS DE ARADA, DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9230591&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8628138/4009	499,013,323	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MONGUI PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9178984&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8673646/4029	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MESETA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9242425&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8671521/4025	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE ALBAÑIL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9234187&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8673108/4036	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9242529&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8677421/4039	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑA SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE TINJACA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9249323&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8677421/4037	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOBA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9248895&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8676115/4040	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE TINJACA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9246764&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8673661/4030	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RUCHA DEL MUNICIPIO DE TENZA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243275&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8675345/4033	398,407,673	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS, DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243716&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8675241/4041	214,968,876	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE RUNTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243094&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

		TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.				
CO1.PCCNTR.8679683/4047	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9249703&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8675330/4034	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SICHA DEL MUNICIPO DE CHINAVITA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243399&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8679674/4045	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SAN JACINTO Y CHAPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUND	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243906&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8689101/4054	499,013,323	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE COMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS YSECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9232042&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8691369/4060	499,013,323	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9253389&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8705925/4077	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TOPAGA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9292703&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8671719/4026	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TENZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9234392&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8695641/4070	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CIENEGA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9278296&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8692252/4062	299,978,029	REG BPPID 202500000026609 A1CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9249430&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8691885/4063	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALABAZAL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9253915&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8691895/4065	249,680,074	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9249091&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8706452/4079	50,739,511	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9287837&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8675984/4046	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BATTA DEL MUNICIPO DE SOGAMOSO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9287837&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.8689136/4059	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9234820&isFromPublicArea=True&isModal=Fals	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8692406/4061	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE URAGON DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL D	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9232302&isFromPublicArea=True&isModal=Fals e	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8687867/4053	49,258,708	REG BPPID 202500000026609 A1 ONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN E	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9234813&isFromPublicArea=True&isModal=Fals e	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8715939/4089	149,862,052	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSÉ BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305936&isFromPublicArea=True&isModal=Fals e	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8712513/4090	74,651,332	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9300063&isFromPublicArea=True&isModal=Fals e	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.8691789/4064	99,559,604	REG BPPID 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAM	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9246768&isFromPublicArea=True&isModal=Fals e	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9203937/2143	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHUCIO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS ERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9835194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9203871/2144	149,862,052	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUCHIRALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9835428&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9205956/2145	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TUNJUELO DEL MUNICIPIO DE MONGUA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9836931&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9205756/2146	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE HATO VIEJO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENT	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9837102&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9205986/2147	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHARANGA DE MUNICIPIO DE PAJARITO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9837024&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9205990/2148	374,729,243	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPART	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9837027&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9220595/2149	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9853526&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9205849/2150	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACA PARA APOYO AL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9837030&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

		MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAME				
CO1.PCCNTR.9217211/2151	49,258,708	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABAL SECTOR QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL D	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9849805&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9217313/2152	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RESGUARDO MUNICIPIO DE TENZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN E	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9849552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9217324/2153	799,557,931	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CCONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE JENESANO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9849564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9217378/2154	398,407,673	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SORACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9849701&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9217349/2155	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE PAYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9849673&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9217941/2156	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAYABAL INSPECCIÓN DE POLICIA DE MORCOTE MUNICIPIO DE PAYA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9850097&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9218094/2157	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN E	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9850365&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9217797/2158	299,978,029	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAM	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9850393&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9218375/2159	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE MEDIOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPART	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9850839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9235278/2160	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CHORRERA BAJO SECTOR CORE DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SEC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9867265&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9218651/2161	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TOCABITA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS E	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9850863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9218687/2162	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA VENTA SECTOR TENERIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍASTERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9851129&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9218793/2163	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE BELÉN PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9851259&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.9218 899/2164	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CALDERA DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9851457&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9219 423/2165	124,952,662	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ROQUE DEL MUNICIPÍO DE SAN JOSE DE PARE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9851579&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9219 637/2166	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PASTOREROS MUNICIPIO DE PAIPA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9851783&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9235 733/2167	199,376,651	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CANTINO DEL MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9867492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9203 941/2223	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9835508&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9246 518/2230	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9861675&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR 9245527/2232	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL TINTAL DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9834366&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9247 610/2277	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MERCHAN DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9861773&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9255 375/2279	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANECA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE L	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9859330&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9260 644/2280	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ZING DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9859537&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9266 821/2319	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE SABOYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9858889&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9265 145/2297	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE MORCA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9859123&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9269 783/2300	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9873812&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9270 590/2301	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9873661&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

CO1.PCCNTR.9264072/2302	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9862063&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9273314/2303	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9873847&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9269614/2305	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9873569&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9268156/2304	49,258,708	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9873632&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9273150/2306	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9873914&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9282118/2315	349,822,351	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9898661&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9282012/2313	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE HORIZONTES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO EN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9911535&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9249780/2278	49,258,708	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9862027&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9261895/2281	99,559,604	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9861571&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9268156/2334	398,407,673	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICPIO DE PAUNA CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9926150&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9290582/2341	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, CUYO OBJETO ES CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9898040&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9289203/2345	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS MESITAS DEL GUAVIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENT	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9909169&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9290582/2350	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, CUYO OBJETO ES CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BO	ANULADO	-	ANULADO	No se presenta carpeta digitalizada y el contrato se encuentra anulado
CO1.PCCNTR.9306241/2356	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELEN DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO	ANULADO	-	ANULADO	No se presenta carpeta digitalizada y el contrato se encuentra anulado
CO1.PCCNTR-9197870/2231	199,376,651	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE B	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9830082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
CO1.PCCNTR.9308800/2360	74,651,332	REGISTRO BPPID: 202500000026609 A1 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE I NVITA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DE	ANULADO	-	ANULADO	No se presenta carpeta digitalizada y el contrato se encuentra anulado

0820/25	11,021,000,000	REG BPPID 2024004150444_ AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS AMBIENTALES SOCIALES PREDIALES Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VADO HONDO LABRANZAGRANDE YOPAL	No tiene carpeta digitalizada			No se presenta carpeta digitalizada
2780/21	4,376,715,945	No. DE REGISTRO BPPID: 2021 00415 0155 SOLICITAR: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2270952&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3088/21	4,305,011,349	REG BPPID 2021 00415 0210AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: " CONSTRUCCION DE SALAS DE PARTOS Y CIRUGIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382107&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3000/22	1,428,890,940	VF ORD 15/22 REG BPPID 2022 00415 0102 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA ESE PARA LA EJECUCION DEL PROY CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE CONSULTA EXTERN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3282266&isFromPublicArea=True&isModal=False	*1,483,299,631*	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3001/22	1,552,859,506	VF ORD 15/22 REG BPPID 2022 00415 0101 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA ESE PARA LA EJECUCION DEL PROY CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE URGENCIAS DEL HOSPITAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3272181&isFromPublicArea=True&isModal=False	*1,845,957,101*	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3214/22	1,995,179,723	VF Ord 21/22 REG BPPID 2019 00415 0307 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PARA LA REMODELACION AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO PARA LA OPERACION	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3428341&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3214/22	1,925,647,010	VF Ord 21/22 REG BPPID 2019 00415 0336 A2 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PARA LA REMODELACION AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO PARA LA OPERACION DE LA IN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3428341&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3000/22	2,150,836,410	VF ORD 15/22 REG BPPID 2022 00415 0102 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA ESE PARA LA EJECUCION DEL PROY CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE CONSULTA EXTERNA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3282266&isFromPublicArea=True&isModal=False	*1,483,299,631*	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3001/22	2,336,789,259	VF ORD 15/22 REG BPPID 2022 00415 0101 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA ESE PARA LA EJECUCION DEL PROY CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE URGENCIAS DEL HOSPITAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3272181&isFromPublicArea=True&isModal=False	*1,845,957,101*	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3214/22	2,992,769,584	VF Ord 21/22 REG BPPID 2019 00415 0307 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PARA LA REMODELACION AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO PARA LA OPERACION	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3428341&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
3214/22	2,888,470,516	VF Ord 21/22 REG BPPID 2019 00415 0336 A2 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PARA LA REMODELACION AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO PARA LA OPERACION DE LA IN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3428341&isFromPublicArea=True&isModal=False	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
2751/23	17,046,829,758	REG BPPID: 2023 00415 0103 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTR	*https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4639784&isFromPublicArea=True&isModal=False*	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link
2949/23	6,000,000,000	REDUCIDO SEGUN MODIFICATORIO 1 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 REG BPPID. 2023 00415 0139 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE EST	*https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4665135&isFromPublicArea=True&isModal=False*	-	NO LIQUIDADO	No se puede ingresar al link

3556/19	12,975,500,000	REGISTRO B.P.P.I.D: 2019 00415 0233 DE 03 DE JULIO DE 2019. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. " FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458852&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4EyDP6xvzPtPlnwb2O8M4LtXQ4BuBtPFYzC5chuNTopBSc-3txcmfcrDDzL_ZsBSgeqXSgkgx-ggwp5VFQ0uQW2rNP3KTNjBvCCG2uttcd7eyO5jiD9uGpADaMt89lKubEu0qSHthaEEOtOG2jUidf_iVkDQK20lITn1F21f1vJE8Y_2TMJS4lmFWNsksx2MyK-Ucb1Zq9SxFwO7CEiCfq-jejIQMjtC0Qi8ElcMCgL_vaS9ZiVJ8soL4tFrXPL-5hV2VZk1QxAzEjtN8p7Qm_hqcGFFNeKYHZTlbOy14McfufMTvskbMtOKyNwJKS-pAsvbF7Q-3H7UpSE3zjjbaQByTZSNBmIlY4JpteHT4Y9U0SEhSgcO7BfmaCvR_ERcuNePT7TcSHuSUrPKLiidhPfsRrMLNgPq3mCqyFxZLQLkuGQwNYNb5FSvWfVBTzgyNcDF3BXs_xD783yvLIe3ljxoMX_5W_EANpKZ2HhqGvJgGsEVFF2Reg4PjGIIFrybSXc6gkAloCUC8yvGF6nL1glxt7OFffcsuHWIb9wEleAZRSEn2rXqv7QtpSrEpXcKL789lrumWsIGYUi0aqkkJY2OicsPZhx37XbdmlkjTQkzXDldCoMSCpW3J-7VNVJH-6V7ojsiT3hNFDA3KHtVxNrCjJlxpAedll0r8L1LzZU70yGe-tGw_POYUDnZTpaa6aA6qssaDw4P3e9v23VT-eKyMDMO66v32-DrC2qWEgWlcCmj2wuHmUpjhPJ_z47RtV9Yn4I69z8f8KBozc8pXI5iG0vQvWw6OVSdErXKg8ABt50hZ5Z3aXNwA2eVq34Wtx7pFZiXKHod9FNI5m70cYzPMCDqDTiEraADaWR1IGeinPU4tsqPZu6UGzW9i_P3vwRyhjRM8rky7qRNvdK9aRMd14IRWxfARaVtWyBcAzeneu_rtNdNWS1CCrV6k4Nh4pUIJ4vvx1-idL08iw3z2utSo-Zsd9bt8M5mZPxzwlKLegLlk4uv9oV4kUuZgmweK3fWWttcE4hyrZMRLUlafrrsrVW9eMFiqz29JFSEdSTMHiJA1FRjYuu8nnYfhv8dfOE5goJnoxaJHUsQs6y-uqPX53IR45Ug6VysXygkWXKNJRw	-	LIQUIDADO	si
2758-01/2015	1,152,599,217	REG BPPID 2015 00415 0017 ADICIONAL 01 AL CONTRATO 2758 DE 2015 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-144971&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5r0yfmbSuervFk6tivkLmxDSb9VK1dN7Ew9o3160gWsdTnp3veC_x86aNG16mT8mxKTAe6sfYcK3LRnH2IlwzsQkOKmr5tWQY1eodDE0oa8ag3ekAecdvHCtkhNEB97p6bmt6c-PX9XPGJnsKonL--7zGNXFgk0pfBYlI2383Rko8GrhAXLEvm6diyDKKuRckuilt8qut-gTP-mC4WP13GAtfGAcLGP7vKU7DVEmPFxe9NoLyTVYZbmkHZDRdQdc42PVFRHT1KhQo2VSYumz_A-xiM3xQf2CjuZ3lvIAhtlt_fXoCbSFuA6Ff5sk-L7Y3XViNR5LQxGePsWd7oLGdb2RPDfaEicsnf20DmQfusfyqPBQYvikSJlc5ppC92K7YyqKek09j1O6M3s-UtEOf-ed_CY_F1t5NWdwvbdSisluSdqWTTi-KgsFbQI6e8VH4krN-KsRnMAdpvdKouMWdN8lRmf2Li1VxeWGhVamjfoMHaYUd83pL1qItQmhwgxoKInHyzfNNEMqeMirVPfktXaQhj8fK4BtYc6jEhq00B1oi-Tb9gbxhfu_HSVTGoMMysleHqkEgLeeleNiL9IndRPy3yvAmTbEQtTr-3WGsqjiAq-GcDdzlvDqZjSmP_iBv42oXy4MDtJXFty9-bzBNkWGZp3Oc X99YYTCOlnRfXNmZ3_YuytOKvE5VkVBb3fRzOsKu1fuBxmcBk7c3N25GyzJACfxwTTWUaTwUYtdCG2SzP60Sky8PdlCrbCntrjpZyj0NlzodpN6FScBSywH8T5CnHSXyvkeWAWywaNgyTeIRMKv5_jLDje2sq06-VxXLLBzFbBhO0tXN0SWh9_JqiQQn2_CvJPpQbkWWPGojF3OevImwxF0iQRZbec0R21S0F9uCpyrDsLi1WHE9yP1EO3hlz3AKNBa5G5giJh1iZGyCiVFwBtL6Kjk3x-L22H6WyCZ0T1Zg-JxEC1Fw1NDMYLemgyeFLA26VcgVVtab2Y1oJKn-Ygcn1zFChikGKlY_Oho5YGEqklUm8SGaCafjC43BjzG8X_IjXHHWdGqxfTlxHbQgFlGOKDye6HqY9sKndq	1,152,599,217	NO LIQUIDADO	si
2811-01/2015	53,196,887	REG BPPID 2015 00415 0017 ADICIONAL 01 AL CONTRATO 2811 DE 2015 INTERVENTORIA TECNICA ADTVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4361730&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4-eBTvqKFCCp2JlRFlsyaonDpRXg9xkUzjNzD1hGHvjhAcuyssWOllg3vhpb145P2iAOJx_bR1WfFZnhbig9zUbUFpGYh_mDr4oPutLAXO6qjP4dOibFWTdVdffsSbDITTy7nbIRkbGBmAFuU_KbpTUXZ6wq_v83pAeS2X0hSAeILOHiHRjOwxM91ge4PVlGa73lUnCC1K39pj-x1T5hTltws58UyM1u0z1kcp7KRwfXXMeYNI4Dok6jbgZKYUpwCWzB5yS3T4LOJ_1FEqzwwIXjcNTdopEhJTEXU4NPMQmCxI-bx6BuWzqHbafsmfln2pO5pFK8aiy3zjScgqyBq0X_HpuxUJSoX9nvhRr4_zxBpb0PPpXG9PmOaGPujG-cGDix8jUWjkUSTuuN7k2ipkecgPSXLCtHh7XOjSs3ncTuN69c5jn_c2uUR3IU6UQCEF7ekCuBi56WXDP7Xa182-V4PzeTCCGYhlJVCb4RcRcNCqKNzw5UFu6s3-luLQdut7oj_rK-be5YDhvJxSlB5QPS60DmAXydvjbghwbU3FWL6sIWS_lE4dyoRevJtx4pE2uLcppN4GtWbesMNQDnaJiuNGQt_VOZnDEQYwSFGicge7Me4LEKV8atKl3GSc9fSeTx92Gq8lTjqWTjKMTJEFlO9cLqG0D3vRWW5JIF-X7qGl_Gao3XFjZqVTXP2Ln9wTg3CQD_zUVy9jAHPF2c9qHgRt1wq_BfIUMRsuKd9OysXHLkdxrB4eb0pYUIEz11lfCZF31X-Vt9hxwEyWgc_1LsuhMLkxOyJ8ogWGHWGQMALod-fm10aemvyYAUwCiEQbV0ZLofZRAZ7fOFNwZlz3vDeiffN5HEuIn620C-wV9mMp6yfzK41LQUJZP6f3kMD5HANI4gg_wmRmgV81ypgGSohdzYonH2ZfVY2tuikXhX4k6VHT7ysOwytDQJkTt_U7olfMGiSk2m2Z7Tl5sqrJ3bvwrb_ORCnbEUjv4kGZlqYGVexF4lRI8slzAOSNwWn1boWkEeDl5WvcE7sZFJE-HRAZnqtUlnCSQtFcDr_t3pzPweery03gbqVYm__p7S0S77VMSP75SLueqIQTSFN07bDpBFUY1eSyEgJmUmA_vh_OVWk

2381-2/2015	2,265,320,350	ADICIONAL 02 A CONTRATO 2381 DE 2015 REG BPPID 2015000050002 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA TOGUI DEPTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-144915&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4Lern_5AB8i06IMj5KOLkPOIX09I-VRvrR1qOhfFmmjltm15phWPpUVjwZYGyQXoXSAitdKT5GMoSB8hbxQahhl47NE8XzDtlfVfPwMWUrsuFzo0h1355WkiMRQYJGTFxgpvNJq2SJpoCAo6XxH8onx-KVI27SlCBIcyT1Zd0JoF3oRNs5eMvRpj5H_VEh04k2EJUGV21DM9KMtlrJklY92U1i9F8Kd1jTXifQQ2xxoXkdFsQLg9yFtZbd92O16ro3CaSBf9sN1iiq2ZOU2-9B4_J12AL-tCedE7oDvm2GZVdtl3PK3NUfElzydqcrOm_azojQmpfLwUTpU5DAkI-BPe1xgoqnpy5Yez-FbgFp40-PlZlC0W_96pE9zR_IuVrjyeA2r74ZSlUdf6TSt5ib8e44klaAlXOTBmWoyKv9AErGo-gF09C9tjp-Aa17lEV9bzy2tsUaFfsnfGVrKz3Z_N1ZvlappiMJgpi_fOA5OihWvvzNYNkUAhy4JZWjGuI6pDnWxxjEscB17BZCtPZukG99haf7lt2P9_gDMgHy5as8mLpr8HZyANXeSArC1fMOqbS35EWzBu3K-6JSNkCoC4MTO0QnL9hZ9LADM2ZjkYLC3xTS-zvziRc0zMT2MwP4XeNNI5hoPtLaT7d1Xuxu_8nYU1IuhIDd8MWfPLhcGmwobPj9buNQjn-0rZgpHTPvWxjy9cv91VCYIolwYCnZ6CpP6UKmbn5Tko45IaLg_QoTrH0wy4SREPCaMa2IhiVMcEUE1Ch37ojzA2LtjXL43SLBVkSzn1Gilam1hS3kMGApKGECK7DGVT1ljRhFYJj90yd5REjFyjjrs43cR3X2mgFKcK-0jBPpsvs_ZyCwnB4z4hi-gpIA9nEQOnHPsEEHDBxST2iQqKhXZHJ2qmDq1rhzIEHezuzrNQHgz-R9O4lQzTvwsBihz-B0OOhsVSQ6N-E6DfOgjPqjMsPlki6SChvu9qg-pPU0-pHclMjLCGFzbHf44iH0fferRhCilSiT5PmVkgTATJjLT2tIHKd2ceRRXhE-JUKwj98N_BqKKzY9HowsI4tvVJ7k0Mi772Qg	2,265,320,350	LIQUIDADO	si
263/19	828,056,724	ACTUALIZACION DEL CDP 5808 DE 2018 REG BPPID 2018 15000 0120 DE 23 08 2018 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE FLORESTA PARA LA CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION EN LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE FLORESTA AL MUNICIPIO DE BUSBANZ	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8868803&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5uFLjh7vLY75lFKKGeMUGmzYMB9CbYaP6Wr9oFoMy3JiFTIZ27vgv-pkqSHx-i0r-DPuGjwUhEt61-65VdDjAZDvcDRnRIJZW_VwzD0H23JTEd_BpigkiKJUt14FRsrcUVBv25gNM1OfC-6CEZ8cxLS4JkiiES6RniNWmQcdopaQ9c-6hXgkVWuaKqaGrmn0O7e3yz-tXKKE8Rq-6wo1qlw95koQ9edUFq5rPjzjlsi9iBW0OBGypihsDsiTaRh7ZQb_5yw1jUSJW2hgX4Sq2nmBF0RdxQ3oteuLv1LS_TckMgHMHzGSMSoshkOu7gHVoMrMzTgrwQgs01BqynvG9ujLHNVYpEahqITgdODyh_OTC31HnQl0v3n3U43IjlOhzKMxifAlonkC-sFjKMMDwQW5vUOli8oG9ftXERDFB1IT5XkjW3Sr6fm2pbAV4XaPwfqSkMUsRJeEYMu6l5vmiXugci0uuCzPjhEeFqk9g_6p5LboP0f7que22do7c6UieavJgAUt0pF1ddRK3uZPNtTbgguJiDWFhp2GH4yo-Dx8SQbI7vkLJrg0QGzEAdZc126ktT1veNsGfC5-PRLzgkn3yJS1Eqc4U8Y6ywCA56OkSQAW8CtFv7Tz8o2r6Yuz4ZehRmpFdzWQQVIW9hOs6WPbUPOHCzi8vbJ_8dd9RQxGSMrL2z5mfqAdKfeCEtk_VHcuLccR1Aqpo0Wa9pbDuzLmP8oyY2gNxCfC1Ih7WhmNEg1wZ7kdKzRqYPaguHgDu4lIJ34QVAfcP3MnvICtdhS-tyPpDLlh16YZ0lzSxypG10ETYDXOYJ72uvjiPi-6TXMtak8bRSqaWbI9-t7Sg38K8luTiddWyE6JEm9Tyy1_5Xd0EAzfOBq67P_Dglou-YHy2-i_1sbYmfBFmOyrbVMBI0zu8fQlzRh7qhRLAeTaT6w9a_FL6kUt26z5UoTP3EAk-dXhKJwJgF33nNExLcg80vbQU6b5JOilp66STAMeSJCe0Nh_jbdJLActavj50N7rl5i6kp2Jrw1JHEFfEw_1mLfqOTjiBLTXAY6Mqvuz_8F6dbK877rIXpP_PSdX-1Vpmf2Mc1NvqkSQ-FiPTaEiVGE9j4b7wuZ-d_6_vF91VKQ	-	LIQUIDADO	si
2410-3/15	80,828,812	ACTUALIZACION DEL CDP 5804 DE 2018 ADICIONAL 3 AL CONTRATO 2410 DE 2015 REG BPPID 2015000050002 INTERVENTORIA TECNICA ADTVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA TOGUI DEPTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4117640&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4ABdJqBh721I_T_KVBgSTc6H8FN0jFEPNuUBc65OAOtprob8I_5Dflg8Cq7bnJWEqEbC_ip51_rXa2024Xu44QWV-5zyhrhoe596B2mEhbmfIkT8mmUXc7yYUv-MpdtqSH-dK1FlswiWJjI276_Gn-3DhQiW6OVVGr_gdJe-DdFqUlWEn8eAYMfTe2FAymEYBDbIOWmGMperpfM0xc0l45bEiI4PX5ku9PnAezp60_59qyjVPySZUU0j_X2EnfDd6H_fJmngScDANcUfTJTFAFzv7nUd8Yn3IO85J9nrzi0Y0LEoGuLJsJww2OQsyHQRabJJgU0oy-g-pqdSfixZg1SqLEPzBHb8HwNz5K047J9VNC-LqZf1i4F5NLD4Hs7DX6XDLwvIBF12YKBeP-MgLvMI5AvkKtP6f4k0Grr81A2cGx8_Ef8nZ5UQ578M-lbzpS3Ras-4xtaPA15XPKmB2hq4miL6aCstI9sbHtACT9sAlYOa1WAFqPtrqFcOizixXX73zYADgRkW8_3R1eD4BiVeEco5uLRy1v0claGMWsspeKblneYcfmi4yYydxZstQ9Uf-FSHH-euwZQRH2kgdJhzQhpuaipyQoeaeOU_Vgv9aQsNbysi75o3ExEvTEcZ6JpDdPtpe4ChPIPxyZVUDAbq3OTLwvP_shi_-uABI6EcGkgYyOj19agnY_pd2UgOV1zp9HBbImRjbJh42AryXSkvLwvjt-VrupxaICbtv5-jRKsNP-F14ONTNRivOsFJbSXL-PBeo2LH_mB3WxAsEAn6j6lxWm5o2btBhiswt0zjslZKmyYiWNMuxFENWHW16RHs61AN7SpKsUwahijG4crxiKtUBg1YsgWAZbbZOncgyXuS6BMC0XHvg4r1853ztyYxQnlvMGRcBrwOP8Kvxd22nymtqT5wz4N_NyOWafgubEnFOp9qvTAtO2VeIT8LjR_zB6LMwYvI33GJY3gmXcIeMMxUq_zoGmYG4tvtdJer4-VtlSbaAhby9TE5SBPrdkmV74NdCtCaglOqFDYzfCyHmnkwOuZOXMWTCpUzLZFCzs4pDdCfogAXfxQbVH-17WMlPXyeamdG4qDF65-Hwd_Lk7bw	80,828,812	LIQUIDADO	si

355/19	967,622,186	REG BPPID 2018 15000 0134 DE 23 08 2018 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERNAS E INTERNAS DEL COLISEO DEPORTIVO Y EVENTOS MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BO	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8876651&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6-nkgI591oqBqxD28jKenuiuW2sImH5YOGN_J88HAD4alcX_0ZFVCYUW6U_R9BfiG3btQIdTm34exqksjIwymrUWsL6Qf_xRHmLQAiWd7Uqn08gWzf-RbPay2EmWhERc1wyiZvxgJmXL-u1Pu9VNavpKoD1M2Prz7SgYFTfee4y82-yK5dxOhBHaqWHhe2q0r-OngGc6O_qzMeZLyziR8iMryPnXfK-8H06A2sAR130SdGDddZSirhPfXKHKIWESDGXJfhi7EPgoPtXA7Zxp6uvgBqsPovG7KQtg7DZi9x0mtvsRrB9sE8yzH6OKDy1kOhqQLMwNCxhe1FYXnGQRvUPHxOtMoFZ17BFNff-B4wqxY_rXk3MeB7PaxTB-D-GEjQocKRpAoFkHu8gMw2kBJmvGg7JLIFHqf4zeX48RhuOxpPlyma9eleAXpcksAajb-nyJjYoUMsjCdpp6atnu3pjFNBnMXIwiy_gZIHXbD2Sw3BqQfgi_xHjtfTvQHPsUT3Fg96fbYMtHpWdDh_og2XUVzMtL1p9TGLmbzVv_kl8MVka8zgeiHr-hL2IAtVLrkNIM8tMkdw-7yFOqOQJJyl-qb3VdeVsjPPMsZ5d92Pw7EbxG5IsdG_hKx6Z236CU-BlnvS1Y6IgcoOmOjKl2pvcl5wYebeuuc1pEXKOgv0Wk2Se_ptWMA_jyRwtAqJs3n42nuRrBXx6g7a02FBunxte0_Ay8mGV8n2OLCDtmgldRvDlHapbB8Fpoc_7_dgweDU0XU4cRSohVut7_KMMY3P1dATOmee5yO-VAfSuOZ-neKGrnPX6gKN2X-K3jwTuGxSl-YWEz7mdknPp6mV6qzdMKcyt2gdPa8f3i32tGyAFUDYNllyD_jwRJM4H8bKaZyItO739iCG_LhGxucD8rg2HsihC7xdCDVEg7V5busQ1DAk53TkxN6gFgzxJeNGCrgw8caQ9JWwKj2Ovp0PwH_xGS9OScww3lY8d6gD8E-DXVGqWMsRohecvjCWhXO1ajw7-_v6UWL80xao1osN83KHXAUMHKleHjfcyd9r-cnEMDmwqRPKt2J2K6OCCfrcf-wy4oli1Cl5Rhwr0lmWDQGVkxlD8NPx-lvj7Ep8PB9F5KHVt94	-	LIQUIDADO	si
744/19	200,000,146	REG BPPID 2018 15000 0135 DE 27 08 2018 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE SORACA PARA LA CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CUBIERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO DE SOROCA BOYACÁ	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8920947&g-recaptcha-response=0cAFcWeA69F0CYLO6x85knFe8bx5ymuk8OmMVw7_p0HMI_FX9x6uk13BlwIbaLHP-NXo5u5w50PDb3kgldRW6sRBpBCUxELwuVRJsIN9ym3vdP3L_uny58WHwHmVl_7rENKz5Tj7nfgvahNxrYbXlVJETFWJIWBKHKFVsP1vK6EHc_a1M2PQwR2MnD9KAWOzSSliIEJx6FjKAgO4u1G4zNRVcPlOmNy2r3NP6egDqahvP-GsiBQ8QOrOaaGnEu-nUgsr7uWkikQBG_wJVmlZqGP5hMDVkaovUcsjzvDv_3Akn_t4DNnnVHPz-uVwl3IBt50EQGLm7zQJTyjWytYUbmk9PYMnV_bgnDZc5UzQgjQr6GkJwY8ZI485K0XazYNVafnlvY-qGt-Nnld-5hTdjij2khk-VG9FSDkL_tLY0TrZEU2pJv5Ae4KH7q1djH_EeGaF3yUMCzW_SXH62DUoWuA5xGpl1zS6-TuPyeal-84CUbVV65IkkNmxO7aaul173Gv99tSJCQz2J0A-TS0JCoJ-QZA3E1sW9DRfZ46DmHY926h2M8TB3vS0rN52GxKM-TfsJ7x8uq6qG7lFMg5UXd30uK4_FJe18ZT1vkWFcgxprnvS0RB2Bg7GyjlK_xR0JhNvp0i9gkiy3hCDKzyt4f4REp2jXwGG0M753LC746jAwJy1x9D9l8UrlVSDVe-Z8ENYFegSAyhXyDqoy8qXZZa5DWnz2wjSmsyIdI4ee9vmmizvwCzjP8TXhmPUvWgf1TVjKdrjF6ZqMAXYuvBlreGAallkKn_fQ8LdefTSldhAwIiKBOTdFRySTonZsb8wOn5E4ZQsPE4sBWZwqGMQztHgFcdLHtsTPj2IU2RW6j1QNEY4uGsQSLBHyJAG-Uc7I1CI_QeUyCUJ42Ux8Yv8Vqb2AmkVNnSqwSOgXq5zf_qgMjMMDcI6sXAyFNNesQXTj5QVOvapM8m0N5q6zcfx4ROkO_AxzZnm_v0g3MDX6g0qmI8YbN7vup7EfGrtFOeIwL6dclNYQUZG2gfqz0yr3lMrevvNICrDJ0J1swYu_cSOgVSu5djnE6jJlprUOj4bFGYl8mTqMIcxrs2MMIgMiWDeO8iPslYibjEw	-	LIQUIDADO	si
755/19	298,265,358	REG BPPID 2018 15000 0130 DE 23 08 2018 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MONGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERNAS E INTERNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE EVENTOS MONGUA BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8921119&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7QPRfggbOfgNg2nByp5M8dwjm9Cs8W5JrvIXHlLbFjDv7bybpljdqH8sj9omq_hNtzN9mdi6GhGyz4c8e0ImmmYnjM7P24mv8d03AnbtJ9JOFklw2ANrLzfQo5L7P2K3Py5xSUbd4kRKpio5crKejgKhpknGJxWSyUVjTWPKgk-NgDgTh4HGZV_9NRY_zF4y17kCG2UePd6FUuR8OuhhiR14YPkvXJr5FfiHOlmCgITcYNvuJ0y3AKhXi4QAWjOKnbyF240_5rqNMDTjSbGdce5DE3tqjfnsFxzzmnX-IL_xxMGANAv2a-V-O9BLYviW4RhXxNsHf-LNCZINJq-UuRf5Q-JfVbU227gZKQfHT9srHZZLFPYYahuNjjGUk42G1dZP9JMFT68z7wollgqxIMfowPMBf1evkgyOILZyOLuTZl5gpW0VuN_1laF0oA5SvUeSHYGKUn4lDaND4-lMbBnctMsJ_YneWNu870GxPM_6aYuZwOvPPaC1izrKWloVyFg2Vr7Y_MS5oY9A4ZFOPsCWkJH_7DQeddL9m6_S5fBmuOEamoW1TwssPkhut3X77dW9Cp6Lj_pYyO8Tsk98dr1JR7D6eZUz-DeEYmUzIa797fYqT7k1_WMU7bsm4p1IFg3TyYLwNlKViBhXDg_ExmV8qOLlO1AaxSpRlpQoaXvk4XpPHFCmv5gkAJf_GfObzVw1N2FEjY3XjWtxCmvzrFieJ3J7F2F_m1Rd19z1RL3HRBO_MvkdNOfobURWGCVsZgV8N5Yv2Yr2mK-e7XYPuDFlbyWMLF_8_5CUmZcaGbrJ70biDYceBp9fyVOfWXl1WMcYiSfrltHEZYgETALODcvqiXZrM0PtWuLHh0YX9izD-3l9rtE8TSH4z6_lmJKLCUH3MJJNkc5EqXaQMPxFE9h24s1Q8TqTMpFEbWlxZZLiSEyyYNBdWrbrb1Gygpk_laqn41GDQNXgRUdHYDz5dUYHsU9zzIm3txyDUCxB8tIod7x3EoOJCY78lTR2_QwSty-oCseUw6pBHAo5T8il1ZfA5OkJ5HT9i2GcycG6VeBbg_Di9y-spks4YeyJf9Fl55WtJ1XbQnIde_6RWf11TZGxwQ	-	LIQUIDADO	si

758/19	904,996,377	REG BPPID 2018 15000 0128 DE 23 08 2018 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE FLORESTA PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION COLISEO MUNICIPIO DE FLORESTA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8922443&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5XrYTFLqgi81TPEqz9TywGwpWnYvrj5AlgYxCt0V1_Xax9mlKkjotwFsm_WxGKxAajM7hFwHTZDPTveOI7hQ1PAxuS4OnKNcsAgMF9CjSZnqOhsXudco0OCMYBMn2w7uenJTb96U2Ob4C9c7HmdpCdQ_LyJjo5Dsi8lm8qeFV9hDAdvqT2UJgo8XVgFTLiYyOM_qq4mm3Gvvz1s4eoPTHKS5E1HGugS5_GpLYmcnm6XTVVlHElaW3P1YvcrdBdJVC9X7Hix0ly6BaHXk5uPcWE3-j-e9VBRzqGp50s1BcqKHj8Plcqek2XhUWt0JYl5hueEt-Cgcg1wM5VurUIESOiRqbM-DKBn13uLFnfYGcsXDxlupVXj0ez_bmsqVQ11KONjcM9xBlHcahQCVZ8wC146bfclITh6_DnEPcL3xtJ8flb6Ob_frsCAGVIX0iHp6kcUW11dP2B_XTXSntE1wT6DZPdutyjF7WBvEvTDWk1Q1WvGV1Vh0977QZUrxdWutTm9iJYXIHrVQtd_W2O6Sq4c4pDc6LpO_6VDx-ATZCauEgKkWQLKWSNFlB1B7L6v2A_9u13zBRs9XgsHsmlYTubd2eMtKgp9L2NQIpwuzPhZb69zI7c1CTK9JCg14qcaBkDzJecpHM8t3F_zEtWoWFFPZZ3yPhK8CfAYbGu9xTv0R7z_rGV_ZelyN9FlvB1gSE6XnyPzQ66iIz2G6bsw-W643mYDwu4Ck2rzpsgpF987FlQsQb3dQFQ91Q2shDDeY0qcbTRnn2KsfOB4OEzscQlGN7PEK7R9kxkO2hsDPjjUdkSsLkerThGGcQtvfYHws0B4Zz0VcNyf8HieQ58Baj76Qi6HsnNVdbrDhj2wxj63wn-Did7N8KRNxO8X8AJMFree8PMKoZpB8hhQI4NWNBqHeFERMGSafvfBUMWL5ou8cec0DYcVoRumnFIDTegxin5GKTtr9h7PXi-AcRpEtj-jQosVHEXIU2I2qZGQm0GD5fgX7FGwwH-DURSpaTZ6geJmVNH35e4YpWB8Gog92v7L61Td_MdS2N1DBdewP2_RnYMNHeKGcqofbZYP_ckUrAonYoYhBFGs-SP8YOyhVjNSV-FEg	-	LIQUIDADO	si
2063/19	4,459,681,162	REG BPPID 2018 15000 0122 DE 23 08 2018 ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO JORGE VELOZA MUNICIPIO DE TUNJA DEPTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-7620&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7-VPzRaDU_irvuMJNEU_SXj1p5LcDTSt7PBDEl6LwmE_zTQl58J-_6SWdakn_2bLseUAoNRbuLfINcRhHcL2rY9mkXbTnNovlhLQFLEbM3-8lUo04xH5dtuaGngZZj2BG8XscItOb12il90vv9X1Qcct-Izc33cZ2NxbMIDv56BCgHBW2m72Z7Ee2n45Viz1AL6-7_FKr-Z4gs19J5_n3sY4tojLzvT8Wx1rhMpmfEWgZ5sTUDPbmSs3prnkqizbKgrlkts4X8uoTH5wc7lEvMXootigYadAOoRmpGBNyNPiKkn7yOE-a1-8UvudS3O7X_wlgRT3Y34GxurVjcM8t8BtbkH6lgINAg2WH8JB_ytKUDJiYxtnpzVufCtxralkZVlNoqIndTMQ7BUonzgmY7_H-7WqaR844rF8--nSNuD04Fmw5hkk9YM1j0KDZkBuo3Uo1LMGFcsN94xAYRwLRj49-JYy3VDeBFd4W2ppzl2hxvPy0Aekw_xrUmkwEP4nCl7G5zcgz0L0YCLhN6raZWlaxJUmpXjyZghQmNO1MvZOUi0BbZi3tA4uZdBiO9gPG0b7KfS8VXDYdK2qIV4jo0xQKFLNu3ZudFLFr6zoXeVVPz4KB2vsXfWJ5CYAekyzU9Casj8Vkh2WpyXpzsN6iAKWJswKeXvEzTtBRQ41JFlSh58kHHLDrDHaWcbE5A8ewRudRB825b796vDgAbH6H06BhaXicpypr6uHXcXrPUpF8v3qGQ5CMzlVPlrJlT_RdoE9e52RUTjhGVCRK3PXHRx3j2kD3DBEMWhhSKl-u13mxxv9LhLb7UgvoeEcGJKBwnD_NGAFyLx1Hh8ThXpZMaSK9iJgtmDsdlnTbWVtyMERLBR56LdF3YvngUKtxYwRm8t7dGWoNJWZ1JCc1LZs8GZMXywCABPMICcTSk0zk0OCvkmdIhNfW4nAIbUjWr3R4NtdW8aMuV1o7ovLfnAv8SB9TMerxwwUBYHEsgbMHNAGbSxVxP__3yULDEHLev87ODc2sFFQmszDLKlJzxPPEgQtvtpioYRnZ2AOpm-SbtkDCwDIOJkUcvskbmHg3KWsGThHQ_4uLs4HA_1IIggtntmPHJ-wO1-RiB6XB3klgRVGJUJZA	474,450,199	LIQUIDADO	si
2081/19	3,100,279,511	REG BPPID 2018 15000 0121 DE 23 08 2018 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA DEL HOSPITAL REGIONAL A LA QUEBRADA LA AROMA MUNICIPIO DE DUITAMA DEPTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8112&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6gykJyE-hxE1sn2hRcDoQb3krTQVF0VQXB6yMzQZzgGg1wHZ2QHd2zX8FQ5-scnRR6ws1dHgPo9P6bRQ1_7DickOGdscpLzIMTlxQBziocSzbQ4_rm7R4_kPxiiZ27-rA4TH4W53xy05PIKDK5M3KzaVXSTt6TWjoYtjlXZ4plRLLo5I1X1WGTRBWtoMWhuaeJ71pxPeioU3XxXuJUHnmCXr2pcp6dbPE--v80JS9nabWRGOL7MU4-oYZYGnCYB75JijeZFXLB7uu32jOdTuwfZoUQ3O7gYfkAKYKuKk_dwrUzlcwSmDBb09iXmfuWLhGEW84sQpvHIRX6rOL_1_gx055UPLw7Obpjk6s2HXsbBVNCcvf6WcQLmS7loCnV4X4YUd0Y_pnNMzJ_tn3L5ebNhyPYjL5pZDoByn7u-fmKRDK9J2nL-FnVcc-bgQY1NkG8PZ1dpDVEkz7XBeu99g4U3GnJhPNIqexHYZQoJZms5DoY8MM2lv5Z6KQOV6RBp-Ja3jyZKwh_1gEUeoW8TKk9icIvMeYj61ymFjVxYJkduJUxQ8in4O2Rwm3USy5Jd4KtIo2uMv01YC5blOwDj3Lx1uT_4_AZhFeJNaFo0AwJTGC6vZ1CVVfin-FNzQZhdj9KTZrGtX7W6h49bLmnH9WfpNkSnWEe1zYVq0dMnA2H2W36Js83ZbgiiFLqwZva0l4FlGEBvHAcddEgZ6l_8RnUVpabhdP7MGeaSZRJEm1n5a8RU8Qoxj4ecwTHCgoGgf6dCZ3d45beZWDDy4IELuTsc6p-2Efrf4rzYfKI0B2vY41R632eHe5JaxRhU_3V5dsYWfTgCD5wjwdnlML2pw8eXo0E7u8BxF0tm-M0lEWSwdmYyxXDtWmu027TVoeNihZlLKx0U4fEODdNLvTs3Jq1L-Ng3OqnBPoyvR7zcgZBZDlcDSFkZf-zEjvJKy455ldotMtCcXoUKs-7GZP2Pwz6d5vVEc7FNsUElsR8VQnbFsnr7oF4-KGp7xF8pQm-YSQTI5z_dWVdfIEV6pZ3sGL3hioc-c5BRba8wUkbElC26aUX7A	1,401,857,074	LIQUIDADO	si

2084/19	240,160,000	REG BPPID 2018 15000 0122 DE 23 08 2018 CM 04/19 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AUDITORIO JORGE VELOZA MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAM	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9031283&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6p0kA7pftAF7cT8KzdhdJSHDhZGmf2Mf6JD1KnTtANvkRlCltSE365FugONJlAjaD0vvLBpwpcYXhe-Clpaqb6ilv9dL0Y-EOR6csvetCO90nAlPR-lAguzZJDG5vXO46nu6rCvQ_ghjLGzEc0gf-fE253Btv4itB1gtB7Nr78O390JJYKGnS6Q7MyvY3gmhvWiN8YhPDGRPz2-BZATCkbrR8j45MRLsZ-28yciNEOZ0rPIqp0nUv6v3Mq022uZDjzbr_UjJ4Sx6WFuazcHEtQp5tRf3rPnVO-kOHjxzER_QGCfbFYKTws2q2WxmmXPHrF4FcX8Z_JviBT_RF4w3KWT4JXCWgkLaV6AutLcF_O4aC5JKKhfxnBp0CrgYNdNES0leifx8nZcD6tjAkCVnAJ5olDGQ-Rlz3khhtnY-3Sf562dZelfx5SlQgm8o60e_ys_MBf5lz5qfFem1O_KPKUT9v7Vz2XztTsauDcxitv9bci8ndruFhkKEhEBaTtKHX8eLoQg7yAmR8BSQYeYShQnzWzFm91vsLMnbkc4VIT2uiadlS5seQYMTsSmkho_BZNsVO0XHvXECcpMQgKwsB7IpiattML5JavcrIT0gDRSgVDIZwyBJMNwBoG4zfRO-BNkl0Cdqn1DpBhTFCIF23jOoceyNpVnwIDbOgHy9ZZULxDm7VkKZMlbT3jyuLKmJRvs53eDhjYO1TnakyD_19XclEskYNCiaMRa05_RGA64DMn3Wtk7QFkigrHA7JXMg5qKVG4IB-Rf2J2x33gq4Q7VbPJ0pMI7ZqQebb3qNp77XsAqZx_sPOn2qHAqwyk2Rt9s8UHe1ml2SYSAZT8CpKaqW4KPTbU-iZtCKQeoJgqtKy5zMQMzdSDrmwcgOmCNBFgZgsdAfaogczsHqkdpP9lID9nVZcZRU6RIbd1ziJuJTh8PEO7wsm2Wn16L6wezq2c-LcWQtxawDN_RSz5WZwyOqNo9CxQ0E34lxy9_A5kS4mKSGYvNf7gthV-7CO9cVrB8btV0iUuecRr3_KbHukSVA18gtfTfO6ApL7kMmHnCSFVuJFXEhbuZ_w5llHKXClcoqDeBHUad-UqMZoizJgvJPCdA	25,549,799	LIQUIDADO	si
2085/19	291,744,864	BPPID 2018 15000 0125 0118 0126 0127 0129 0131 0132 0133 DE 23 08 2018 CM 02/19 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9031155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6NDaU2nPqzACEsLUpLohWUP2QXDBhdTTBN1Ie-naFZUqvyWFwzCarPK2lulxUi9mqadNYhHLRcV4sc_-hVOuoo8ANPRMZfAb_uUGqQ-QvWGvJB_cSi_obrcTKvIBmV7k0tJlKb978INlr9rX5wEE1n4vlhRDu2UT037oAkdG7tSZijX1jtL2ld9THiwxOtNYfQPoE18EbuKld7L8uBMVr6RrHHUK_swsk8TBhUhy_UtH0REb5zWp51hD7b8p9lAr3WTlbrh6imLT1gBTykTbkoX46ojyPS8O9M9rAZatHBnoC4-WeA1-GqCnlw-bnHndPTmtRYC2N___sM-fhmxBZ3FbeZseNCO3h0Lz4SU-Tj2myy6xZPBl1j7jw-ynjmowniCwk6cr-kLeeDKqWW33VSB2TKZxVyk1Pkb52DEMHuiTCI2WOz0NTMAqWn7X0gTFyO1J5gNF_fGVzCw_ltsNl9ENxXf2ForVtSahL4QxB-Imn2qaETYnPCukS7cD_GDg0XjH52FdtKc26DVLfHp2WooksGQ1laIBjBJhfPjbPF6-eEgr-lF-HcVZ2utpQNQXFI7OOW2jDrGOxeV2As6esEeO2aDdgBy7DXQXpHGXquUfPrXSOz2SzWHdolJX4LMMhm1SMTOVQPRlI62YXlHEoVm6VXwi7qjpJWwrecdcZyo2iZ82oXbHJgPIB137-Yc6mfA52GmCpNhftA0A9CiLxYAS0rgkzqxbwFCDJwbmF_99yadlpm5Z5TvXtz4HNEYjCOFM5lF2T7Fn9xskSOpZ0RMvcmxfZEuxzmTyarwZP0eP9pXoM--EuAyQOJKhd1D8kmyyXf0KU_TdQM8_Sc0Ls_WAyc6rUYv5lg4N19_xaEOL9ntF-BqLFjC-u_Mr8i3VT-tQ4pu7dickux5OqUP9hg2dYThN-gzxkGnC8Wid-ooxt_1zJDJ-Ub6MVktHWaMNSFW823md9lM19VlwDd95nfNITEz0UILPAZaDrNosTRf9e-eW-BpCP1qHouOMC3u1JMZogP4WuxE5XlnLvxao7TKjEoIAlyYVgtdPSpY7BJGpTpKcPba93MynMOqy4BjvtJwXkTcYHY58J-jt5Bq4LCIyyBisl5mKY2s8Xjrf7WnzMTGuuE	39,721,362,453	NO LIQUIDADO	si
2085/19	13,415,971	BPPID 2018 15000 0125 0118 0126 0127 0129 0131 0132 0133 DE 23 08 2018 CM 02/19 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9031155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6NDaU2nPqzACEsLUpLohWUP2QXDBhdTTBN1Ie-naFZUqvyWFwzCarPK2lulxUi9mqadNYhHLRcV4sc_-hVOuoo8ANPRMZfAb_uUGqQ-QvWGvJB_cSi_obrcTKvIBmV7k0tJlKb978INlr9rX5wEE1n4vlhRDu2UT037oAkdG7tSZijX1jtL2ld9THiwxOtNYfQPoE18EbuKld7L8uBMVr6RrHHUK_swsk8TBhUhy_UtH0REb5zWp51hD7b8p9lAr3WTlbrh6imLT1gBTykTbkoX46ojyPS8O9M9rAZatHBnoC4-WeA1-GqCnlw-bnHndPTmtRYC2N___sM-fhmxBZ3FbeZseNCO3h0Lz4SU-Tj2myy6xZPBl1j7jw-ynjmowniCwk6cr-kLeeDKqWW33VSB2TKZxVyk1Pkb52DEMHuiTCI2WOz0NTMAqWn7X0gTFyO1J5gNF_fGVzCw_ltsNl9ENxXf2ForVtSahL4QxB-Imn2qaETYnPCukS7cD_GDg0XjH52FdtKc26DVLfHp2WooksGQ1laIBjBJhfPjbPF6-eEgr-lF-HcVZ2utpQNQXFI7OOW2jDrGOxeV2As6esEeO2aDdgBy7DXQXpHGXquUfPrXSOz2SzWHdolJX4LMMhm1SMTOVQPRlI62YXlHEoVm6VXwi7qjpJWwrecdcZyo2iZ82oXbHJgPIB137-Yc6mfA52GmCpNhftA0A9CiLxYAS0rgkzqxbwFCDJwbmF_99yadlpm5Z5TvXtz4HNEYjCOFM5lF2T7Fn9xskSOpZ0RMvcmxfZEuxzmTyarwZP0eP9pXoM--EuAyQOJKhd1D8kmyyXf0KU_TdQM8_Sc0Ls_WAyc6rUYv5lg4N19_xaEOL9ntF-BqLFjC-u_Mr8i3VT-tQ4pu7dickux5OqUP9hg2dYThN-gzxkGnC8Wid-ooxt_1zJDJ-Ub6MVktHWaMNSFW823md9lM19VlwDd95nfNITEz0UILPAZaDrNosTRf9e-eW-BpCP1qHouOMC3u1JMZogP4WuxE5XlnLvxao7TKjEoIAlyYVgtdPSpY7BJGpTpKcPba93MynMOqy4BjvtJwXkTcYHY58J-jt5Bq4LCIyyBisl5mKY2s8Xjrf7WnzMTGuuE	39,721,362,453	NO LIQUIDADO	si

2102/19	4,213,418,140	REG BPIN 2018 15000 0125 0118 0126 0127 0129 0131 0132 Y 0133 LP-GB-02/19 TERMINACION MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POLIDEPORTIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTAZA BERBEO TIBASOSA SAN LUIS DE GACENO MONGUI CHITA CHIVATA Y CONSTRUCCI	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-7835&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4YPRz1Jr4_Nw12YPUxElzAeohq1JwLgdwaALJ-pygMxCQhsIUlmV6NuspQiC5nEP7CvbPBI8ZiEbTLAfYPE9hA71zkVsd6EhARKEd6o92fZPHQq3xZxXytgZWBaLp6UXFc4322mvdbWHhtmhpAzfilX3CQNzlXQ5bfsz_BsMCPYgF9oaZmsovv_8qZLMdzWUKkP41Kc_Z3E1g6nShORsUALR0QdHBGW_5pDYuITQnLdVn8xwgJq3i0QrVqVoFmqaWR5XSrdO5RMsszChhQFg_2SzrXQWpiC0BPNsDNaGPpigj_ombI7dE0xgWDef87WKALucGajOxH_hCYmHVNrHBvV9jFO3SAGLZIzfxRU0VU4wNC4VfnH9u-T8njWiJUnTyAMcTnXCjMSteLqMh7p40YtFQEzdS1wCbdkJgtoanK9mk_HI4vpn4NgJYYSuVFMUXIozmf3DAPOGR9jsBYMZ54I-oFBToC70svpsZ8l83mFvwZaeJ30C2ndOsCuAVCwqZLAv-sCh22d59pQS_w8b8RQo6AQ7lJx-X0owexz2ldte8X9qKnFUsQXArU_33YcnpwO5qN_H0gvldnmS2pLmmpOua7D4XrfZQAGjJXPyByoKLW3MfPXZcvZ-yTkCb4WLqKvOjWLKKwNclUd-t23sGWpQDfZm6_jnqQlf9XCvpr1145EloCFEAWdXzCqYQIWcQGuj-u2aPLGMmkFJ905m3g0ZZGiaF3vjY8O4_eYQ9MsGDgN6dBPzlQaAmoCwILlavBBhl226PPE9Of8O5Osgom-4lMaB7xUx2HKrtL_QtU1oQEjK52DkA2a0QmiyNwx7ECsdGA_mGpPYwQ5WpskUmRuvVHISj7nuFE_EJG0EvFbB01SJxmPMk_Bhb1WXRi9HErNfJb3bsQij3z9gk1Qlbt8-wTzgx03Lo7dzxWLOxU9G_WWX0fn12ec2YH46AFpR9q2Z6TGOfTiy18W_HyJcdpxQdPWjvYplk1nrdkn7cuOTDmunNZoq5SJZ1DwlXbBJ3nTfb-Z_ev9Uu7GxOKYxHKCS25VR_1I8aWrQZSDVKWlTKup7YOuQ7rxTFyctyo_ONNqDDPpzCQhSnodC50tOPofbcl-w	1,426,544,692	LIQUIDADO	si
2102/19	248,637,371	REG BPIN 2018 15000 0125 0118 0126 0127 0129 0131 0132 Y 0133 LP-GB-02/19 TERMINACION MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POLIDEPORTIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTAZA BERBEO TIBASOSA SAN LUIS DE GACENO MONGUI CHITA CHIVATA Y CONSTRUCCI	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-7835&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4YPRz1Jr4_Nw12YPUxElzAeohq1JwLgdwaALJ-pygMxCQhsIUlmV6NuspQiC5nEP7CvbPBI8ZiEbTLAfYPE9hA71zkVsd6EhARKEd6o92fZPHQq3xZxXytgZWBaLp6UXFc4322mvdbWHhtmhpAzfilX3CQNzlXQ5bfsz_BsMCPYgF9oaZmsovv_8qZLMdzWUKkP41Kc_Z3E1g6nShORsUALR0QdHBGW_5pDYuITQnLdVn8xwgJq3i0QrVqVoFmqaWR5XSrdO5RMsszChhQFg_2SzrXQWpiC0BPNsDNaGPpigj_ombI7dE0xgWDef87WKALucGajOxH_hCYmHVNrHBvV9jFO3SAGLZIzfxRU0VU4wNC4VfnH9u-T8njWiJUnTyAMcTnXCjMSteLqMh7p40YtFQEzdS1wCbdkJgtoanK9mk_HI4vpn4NgJYYSuVFMUXIozmf3DAPOGR9jsBYMZ54I-oFBToC70svpsZ8l83mFvwZaeJ30C2ndOsCuAVCwqZLAv-sCh22d59pQS_w8b8RQo6AQ7lJx-X0owexz2ldte8X9qKnFUsQXArU_33YcnpwO5qN_H0gvldnmS2pLmmpOua7D4XrfZQAGjJXPyByoKLW3MfPXZcvZ-yTkCb4WLqKvOjWLKKwNclUd-t23sGWpQDfZm6_jnqQlf9XCvpr1145EloCFEAWdXzCqYQIWcQGuj-u2aPLGMmkFJ905m3g0ZZGiaF3vjY8O4_eYQ9MsGDgN6dBPzlQaAmoCwILlavBBhl226PPE9Of8O5Osgom-4lMaB7xUx2HKrtL_QtU1oQEjK52DkA2a0QmiyNwx7ECsdGA_mGpPYwQ5WpskUmRuvVHISj7nuFE_EJG0EvFbB01SJxmPMk_Bhb1WXRi9HErNfJb3bsQij3z9gk1Qlbt8-wTzgx03Lo7dzxWLOxU9G_WWX0fn12ec2YH46AFpR9q2Z6TGOfTiy18W_HyJcdpxQdPWjvYplk1nrdkn7cuOTDmunNZoq5SJZ1DwlXbBJ3nTfb-Z_ev9Uu7GxOKYxHKCS25VR_1I8aWrQZSDVKWlTKup7YOuQ7rxTFyctyo_ONNqDDPpzCQhSnodC50tOPofbcl-w	1,426,544,692	LIQUIDADO	si
2152/19	217,019,565	REG BPPID 2018 15000 0121 DE 23 08 2018 CONCURSO MERITOS 05/19 INTERVENTORIA TECNICA ADTVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA DEL HOSPITAL R	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9088907&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6IuLvNSjGAkeB1909Fh_waCqBoEr9dErD3NZQhPjtnBJt1K8fGjMQIGu0q3qOCJuT_7BByia3ysKlxeLlFaX9IzQ8XGk5jtD1eMrmdoFOSTcNlF4GlwDD3lFWFjV-biV3vzRKUCacTW4Za4gwHcpnHWtdsLO_rXiy6bz71gkdVISX3Bdmv9_GzV86ac0_v7gmzB3f_8KEdpre_EEpZBZECWwpjRkvAb_2J2_smDaepcnHjA1vrNEYqfnDxN__q_EWPPoRGbyhneKgCIANjydM7C1tqBAHZBcStpbY65vSFIT81wQUxmlY5Ybw8PGDlgNd4KZFJln3oZyfyTBihjlDkxBy_Yb2HB4mOZ4uq0eq1BNa91JsEE6zwFQo59sn5uoPDcBpELuWzy5BKAwojLg_KDf8m719hA3XHb--o0uXEV29rsXzAB5RUvF4ToPvh9qxjBh8-oQGb0PZCCrkLyCl8Ghi6iSpoh1Kuu_XTmS9OcJZ-fhBEAZP3gR5pPsCL6OWcJkmSV67-27wQEWq38vZqypRBpf1IFB1ZFb3gCfXtg0hNmKS1SjmOXKrIoSg9rNn4DsMCTyCqnvLAnWDOHhp8N_DQqGo_2249Y58M387CunguM0-iiUo5Epusy9DNHVeA8eybSYqEd8YO76ygZ3GkVMdV1vYu_JkROZv9PUeWga1qRC_kih09Got8JBNy1BWPxh0lcqJfylcMvRQzTrh4dzy751odm-NM4DNGB8ZJoDskoutoLofsm90S3TElFnHPmfPDSHFXrsXkVm6uWn7HsEvao8y5siq7z056ZrJV5m63qHXSpEEUAYxDn6KhVS5ShzHcNE_PDPOytlJz9RxzVFC7DR_etjvVqUVTcK5axsouCmc9zKHCvfvQF-EdSWA4QlzbMMbuMhzcNg1hrTNBvNr0v-pmtEh_-3sLQRUioyAH9Hile_J12c8J6kir57cfV18B_r4Rg8Xt1-0nayZxs7_Ylp1DuopE50QknztKeioXM8wXzDVgIClxbBhjGYatuyIKCql0x_mUJbHnTvbgmOUVG8O4_zFx3RGxc_UxTh7yVodlVCUYDTev9ryh3UIXe_Z	98,129,995	LIQUIDADO	si

2313/19	810,705,581	REG BPPID 2019004150125 DE 08 04 19 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAUNA PARA LA ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA SUPERIOR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9511683&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Cb0ccCaPp-LC8h2uPM52o246TM-J7Y_hs7b7Gpn4USmF8iU8t7hVMKoUxF7FinL9gsVv0LwbtCBhQdrFvceNokfU_ayMP5oXZvy1Ozul7_ixQSQQuHDlyZYbTk_Aq_zWUzrJn-jM26X7KNWysO0OYPUXHTNkerFFqRaC1YHIZ2ekHEoeSdSiA7p2TawqOr-q96p-PIGkv3GZ6fNPR7tgeJ_anXWi0_RhO45lxZqAemLnTdoQHEVCoX2SsajDnJjY89z6HuxKqwhiFCeHDK0Kn9gztH9-iLBgnKRnH5YAFUBfc4K44PYvog0Z30Ac40pQZ4Sm6xpFjN-sr-FEeHrC_e87N3dbonZpYXfsgXxqXcJAXZLzBw-m4ix5vkZ1iKzhIAB8oDLSxiqjFHnNKxySAYzbH8HVtLG_Dou4cVONBsTB3MAn7LKQkR4Hn6fqPVuhYxVBYsaVXpL7AHICapJ_JFrBoqNzRY9jc2GWyArpCaFElHZ1dx360Bc775t9UuO2rf5jRGK1i2liHEdc47UHBgrvFh-dXcsIdZqZRe9PsSPbeJGtX54GFOW6EcrTuiPekm2ROBHDfBBE1q6qgnDcxPjxpYbPVdRuZ8ZSEpNSbePmZxRu6kUY8kynN5HyIACt-SbBYjm1v2DVRFyXfarX6yTL1CochJzO9D-oPLDMtpjF3ii6y_gOZk3xzQo8iC7u4BIBPJNUu9qKN34Kd2Pl5_vYfMP5bzgWLcpyS5yOBy4yrDXcJmHAuROpxdhvL0UBb8alf72fvrPjy-b5ukS4s-B_J7BL-8Sav2MRPMmLtK66BV7T3YNSdFFLt-u-YCYdN7oqlhAg6t7mF-bHx8Ty69IUn2BdidlCfKcvSCCqfnSzPZTYSvXLMGRoUdQM7N9HfzboOhzyahghdoUgiyUboMRn1lThp45ue2cPc-1kMpAvAzc1tvzKL_ZJv3lkZfsrMt_J-NdoXCZjQZPEAA-BfnZx9viuJvvHtkbNkb3aZMgtI5-OWmyC7BjzO0u48K8BDyzJw6UWCCZMoxl9dOYGkttx1fA8TJDKdLMtebHr_DIj1gHijN0gtcHD5cwYXkhX1OXVEhf4cBB9oSMqrKv9PglM1AdEVlZTBK5hrvsvFSbDfurUd-bHx8Ty69IUn2BdidlCfKcvSCCqfnSzPZTYSvXLMGRoUdQM7N9HfzboOhzyahghdoUgiyUboMRn1lThp45ue2cPc-1kMpAvAzc1tvzKL_ZJv3lkZfsrMt_J-NdoXCZjQZPEAA-BfnZx9viuJvvHtkbNkb3aZMgtI5-OWmyC7BjzO0u48K8BDyzJw6UWCCZMoxl9dOYGkttx1fA8TJDKdLMtebHr_DIj1gHijN0gtcHD5cwYXkhX1OXVEhf4cBB9oSMqrKv9PglM1AdEVlZTBK5hrvsvFSbDfurU-bAPk2rXdxnur-6ErzKdStt0kSbTbothAH1G8RrOlMg2VLPpx7kmvJBa5Kx1UZZY3Xt5dW6YnSe_W7aO-Ae1ilcEm1LBihNE_lz1jSLkIPQ3v75Kg9eDv3hOiFIJqwGlc7t95XrOWLJIH2Wc7AnNyQx93pfz02DEkVM88VwbT1EuqXhOLUAkIQM53uCnk6yQN1a-z9wwrHixCe2MlcxnJHXMPCTsr6uP6oQ-bD6sMaWbBSwIp-x8t61QlyT8xl-KTnCe5Btn0qJVJ0cNubgI5hqK0Hx2bpFJDhzR1YZH169DEMuPDyqLTkAG0KyaKWnhq-42nl_Z_HUjYebmvsOEJhJed1oukNPKykCaXplzZUlJyYj_Mf_VJ9TcTf5Y6Kcbei3W-MWHukydEKYmTLjuard2NIhe1dfFO8nO0D7e8m6qqoykwHwW0xvJzf-y1mA4aHgB-F17tPZkoyFCCJP2_jJEUf7lOJXh3l4QTBNWD5vuZASC0q0BGrJyFC8TI9aUspIwJF4nyVKfI60zPc0NFYAqg8Bz6sMl5xwh56L0QqaJjVViT9D-97j3TZnBLvK7tWI7IdvB1Fnu6wWUetWd3osU96UpAkpW1VeUdW7WSuYUqeBFSLZ4pBui5hHPEpIEZRyR8eBxM859h2zXXBnyTqUTtD3IX1CxKFsQ0SG0k2P3aq_2zH1sYKlUDEsuN5n98Vwk3bStsLMChhfOumjgcO_bBMDzGT_Dg-yqG215_0a8jzvCI5DDlsukgvanxy2Lv0z0H2RMr544QXSRp8KnTAhDkR2qsGv0nXUsy7KLN-mDRveM6sGvNVqhdEP9FK-7F9VCcAp-F8aDBKerdIQf0spoEKhB9-F2MTqSbGXpiCg_V5-jlntg0cUldOsFZCp1igLFaQes1MPIPPWxvORaEXgUMFYXU1pY2macocio8szRbtjCYeOe94z4h-erYAcvr4meCPCNYcBX2mPOo_bXGVVdvkuZCcyDAmc7rklm0ld2qJE6I2-GghYTUvUVRtprSvQZgw77N57bxxBDfveMsn4gY8a6ul4Nq-QUAhkzxfARWYUYNVqQ	-	LIQUIDADO	si
1635/18-01	240,736,343	REG BPPID 2017000050071 ADICIONAL NO. 1 EN RECURSOS FINANCIEROS AL CONTRATO NO 1635 DE 2018 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA V	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7717597&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6eH5KXY5jn8PUE_F-bAPk2rXdxnur-6ErzKdStl0kSbTbothAH1G8RrOlMg2VLPpx7kmvJBa5Kx1UZZY3Xt5dW6YnSe_W7aO-Ae1ilcEm1LBihNE_lz1jSLkIPQ3v75Kg9eDv3hOiFIJqwGlc7t95XrOWLJIH2Wc7AnNyQx93pfz02DEkVM88VwbT1EuqXhOLUAkIQM53uCnk6yQN1a-z9wwrHixCe2MlcxnJHXMPCTsr6uP6oQ-bD6sMaWbBSwIp-x8t61QlyT8xl-KTnCe5Btn0qJVJ0cNubgI5hqK0Hx2bpFJDhzR1YZH169DEMuPDyqLTkAG0KyaKWnhq-42nl_Z_HUjYebmvsOEJhJed1oukNPKykCaXplzZUlJyYj_Mf_VJ9TcTf5Y6Kcbei3W-MWHukydEKYmTLjuard2NIhe1dfFO8nO0D7e8m6qqoykwHwW0xvJzf-y1mA4aHgB-F17tPZkoyFCCJP2_jJEUf7lOJXh3l4QTBNWD5vuZASC0q0BGrJyFC8TI9aUspIwJF4nyVKfI60zPc0NFYAqg8Bz6sMl5xwh56L0QqaJjVViT9D-97j3TZnBLvK7tWI7IdvB1Fnu6wWUetWd3osU96UpAkpW1VeUdW7WSuYUqeBFSLZ4pBui5hHPEpIEZRyR8eBxM859h2zXXBnyTqUTtD3IX1CxKFsQ0SG0k2P3aq_2zH1sYKlUDEsuN5n98Vwk3bStsLMChhfOumjgcO_bBMDzGT_Dg-yqG215_0a8jzvCI5DDlsukgvanxy2Lv0z0H2RMr544QXSRp8KnTAhDkR2qsGv0nXUsy7KLN-mDRveM6sGvNVqhdEP9FK-7F9VCcAp-F8aDBKerdIQf0spoEKhB9-F2MTqSbGXpiCg_V5-jlntg0cUldOsFZCp1igLFaQes1MPIPPWxvORaEXgUMFYXU1pY2macocio8szRbtjCYeOe94z4h-erYAcvr4meCPCNYcBX2mPOo_bXGVVdvkuZCcyDAmc7rklm0ld2qJE6I2-GghYTUvUVRtprSvQZgw77N57bxxBDfveMsn4gY8a6ul4Nq-QUAhkzxfARWYUYNVqQ	240,736,343	LIQUIDADO	si
2318/19	602,371,527	REG BPPID 2019004150118 DE 02 04 19 AUNAS ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TOPAGA PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION CASONA PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARTAMENTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9518682&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4Kx24dPmMMXJ8Av5eXqFVatF9Y2Tf6z0Zz83DzDg-tTdFKIFhQUkmNK9jMYqGuzXU1Fh1QtpwDmmVcaXexiw71ZJfW3vy2xkQMH6Q4EkkBO5gQugEMofz0UVyFZrF8m1WcJRtvQfvY1A2IGNMdmoQZ--Dm7akk_bwT9oHc31_tCjqjgBqKKX1Q3N2afG1SWsnCWg_BwjXUnHUChC4XEYLAVI1dAFGN9FhPJ24SeGpz8-STkboLJYQeVFN5c1jGwHvinLvS_LEeMmabmYfLX0kYymSEjjWe-U2Y1itZL0Wy3Pe_d5n4OtOm7xt-6MdO8FTv44ZMAKTOi1jtD6EyJTKw4TV_whf4UdEqP9NyJvGP2m69f5yn8Jk0mz-UupCyaPQOWEkuWlZKW43He2qxplwHqKvGwlSj8cNLZR1OPxj2PwQG97_z8qu-sWL72JRuSTBHoXL8jhQMFh1Bps_o_NO1vkyfpcRpFitAoaTYKMW2JFB5W9KousjnKHf9MyYkcwXgsHFe7PtZ74RlsZqJhflukvc3LwGZZyCsswGdlHM__QlVsr-IA_C7LVC8YXScP78Miq35w2le42whFUm_ua2YO1_yyly5wUjd_cGdBuk6lTB3YEC1PoRYCn3WxKPVdOw6jzWJk7ZD6Kapuj9ilQ5na94vzdTxuIdmsXBJmgNRu6Q9CHCz4cLsMD2xPUgCirdpRkEDkzo0nmTuk_fRFlwNdxc95Nok8_wKz_REQ3Bo1iZk0A8xJQaClDiP7o4OZ8Mufk-LtTbnCZvB_pphome6pQK80g2pGyST9PFzzRKFOKBenpH0rULtGvABJ4Y9pEzO0bjPVluG2EGccQ2ag7vlORrVjekaLi3ErXUcYUyTUTj10zkDZd8PEhyVY0zE4z4gtJjTQjEqBEGuEUaIjlk9Jop1FNSjgbZd6oZUMrojGvB5FxfeJYs8E1k9_k2LFVphNM3lYjxjlVavOsQygpxZSvxaRcpNanv53pdoXXKUlOU6s7vGpI433VZ8j422KmB0qcUUKvXpk_hFeplUGIHL-NRvNblxrWBihPrsaLSjFHbdts	-	LIQUIDADO	si

1641/18	3,439,090,614	INFRAESTRUCTURA REG BPPID 2017000050071 ADICIONAL NO. 2 EN RECURSOS FINANCIEROS AL CONTRATO NO 1641 DE 2018 CUYO OBJETO ES REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA CRUCE 5608 EL SALITRE SOMONDOCO CODIGO 56BY01 DEPTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186032&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7rRlV65wYNLoV1tEjkGtAwStuNjUI_SxEbSpS36HVtCCZhNGERWKpyOZ-7xtW5CJjp98sSymtgEWE3YAS-QMXoYoZrwX3hW6y0FX5V9xhAhSEnrUUQfY__VxrkZkUjYvxwjzrxteMFW8Y7O_Sz3XPzkd_nXMQo0G09P95aBqHge8WWvH9lT1fIlE3kcwS02RXwsStcBLW8ni87-oD0Iqx-eyLrqiVytXAlE5dQYBINBrKjHyUdKX1oSXKjaEDHOKV26Q0hoe7_pY088_OcEGfkzvClaqWX8h-tvmHvg8DH10Lfh4zgpMs2plveXsRyzIO2OEWYfIFfDD-6IJDSaK45aPGjnOU5Rm5EPI-12mZe6ZbKCREMqjHxxrTZ8oLsakP6rBg4YHBEDct53Tkj-ajNpYg0InuLIRd0CFpzm42voiqE_8j635x85DlUAY3XtnVVOJCGanOyJEIAYpQtzk9MBSQcr9Vq_20hmKlh0B6-xvnkk6z34DGp7bemwUy9u5EQnkk7TVxvI2pUPjtya64OKBB3aie0edTUjphAlMCTETTjevh2Pccrs2QwLA5v9nhzLp03frUUIO7-Az-qMxHkoowLCnjBYdZY0_KDKRI32npc95kFjL-YFzISlyaDUQpw35-33W7XT6QH1KCIal7sDMgLyqAqUTlM6fF6dPYdyxV2u6vo01xkhxo4Gy6bRTLNZxOdv31wCMtG4RCvg-Vu5SQhR2OUnnQQ-JBoBPtS3qxR1K32vUgkW6ItUEyQZLM0GlmdaDuuzkftGCBhz39mHw4WOyycHk2TkCyAAVd3qPJVJg-n9Sk2rARq9OpjpgY7hTSfMH7RlEV6ZV5deum5KA_2-hl7Pbaawjl4n9VtL0g5deU4_Hrz17o24cGoJp1RIkJoSh0jDH0EDZZa-HdEmWRCNCnGeIZE84ad0SVbxwlMfgCmsamhn8k_Ya63llVb7xc4QNYlH67JWinjUbKZceucSoFbB2pfHHwECNyWv7MfExJcAdpiIXYFteXwgSxq3AbiizINrh21bqQY3kjbR4khDU4-tyYOk-GloLfDvnE-paXOKomRG8LanTtUo_gBVaHqgFTLVnw8mIIMCZRsN8bsHEvfyQzgUgC5upvic9WAI_k	-	LIQUIDADO	si
2541/19	660,600,355	REG BPPID 2019 00415 0129 DE 22 04 19 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GUAYATA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LAS MERCE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9599937&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4amSLyg6qLXo0LI7gXsrb_xdmY5HmgAiQNV293wXwcQKmGjqTHhjTG_QFFfT5Ej-P7Xbo8dfVFRbjEAY96F1fFASHWEMYqnHV8uFrUI4D7Ilzh4TjLfGT4oZA_xNKTSMGgJxZrEwnh9-Fi1AszoJwouqEdST1g7-HJixlKAYwnJlUxWkfwrd2lbOPPjvtuocKZ4bQNZAkk8jwRr4vtShrbhZE64y22Fe0OIcQeDiDo2bjcA3vwhrJTzyMl2xlz76U3rxbhDHXtOEBRGb38Xr0tBeI0TTP2PlUwPX8Eo X8m0vT_1rXfRGt8CtD_0aaiSQy971_ILPTEfIMF65Zmlkhgckj0NLm67en87vBxyMlagMfgp2gMcYK9i3R70sDvh5DxIhktFy4YZAEg46VWAiL6D6SGvXAeXQMyo06WUfoaVh0KOI7zTrh0JmiNv0E47CHID9-vofOFS4efwStKUcdnwII0xAXPp7kXHUdLc-Eabo9it_J4cG_A7OLlkFrHWfC7wkoV-mJlZC5FHQmVDHxfeyAxcX97vz_uALm-JylRYapLiZeLzs71U_VGgJUMeY2bry7v9tV2xNRg_U0Xs3RGV0Da9yUlNle_OFYOTr1DfE1PRNoKr0lBSwnOhJYxo9TOEqlkaafz5kcEqqsAQlZpLzLeo3uDv8TfPS03lDDbrhW3wU0yO-WUK0edRAVpLADH0aHCDo7RVrdF4BUNFWzZQiVKw4e_8U6ysEvSz74XIF8b_vKua2S-KAg9UNbAM72B5dV_nHLS9QsxSsFgcNG7oAvtpoMJNeqApIJ9S9L8Y6I83ksXhndzbCn50blKubI4DQKx2Fn7-mG3KpkMa3xqteTHw8vYPELLi_EbjzfPlaMalQuVYDsTrmS5Q3o2QXI4MMlPJhk_GgpALKlYPFMgVDOyFMW9GhEj4-Kt4lNIxoNTEGRNIRUtnKCXB4JAv5Oy0sGruPh48F-qLcEXXpBPBhFSLccQl_3jFgB8eTdHADUXu7GS_yVEKzg-5hyZWqlCUfY2KL3CtnrRuwYEyrmTNXR7hBZzzSC0G1qbhOibJaBoD7agUp7V8uGtek5xzLEOtiZP	272,591,036	LIQUIDADO	si
3471/19	7,745,500,557	REG BPPID 2018 15000 0123 DE 23 08 2018 CONTRATAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA RECUPERACION Y TERMINACION DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 9 No 17 50/56/60 MUNICIPIO DE TUNJA DEPTO DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9453458&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7AcdPFDhH8ZQLfTm4iz15_8i7JuZkqeTLOim_N-cQ1Nk5lmbYkZfiLebd59_BK5TALiloBpwukhy4A9dtxe6XSFE-UHyiDPeBb89gqNvP-o14k7MlB7df752m2GS_zLyFVtHs8ex6O8h9bn685q2xHZCkWXFadOzS6dkFanoxssUvFE1Qz4UmiA_t-erZJP3GgHDuz26CYREwj0BUrFoaGkt0GJ4c2jJskCaS1s0eoQ0WsdhZ1gemczLQJXleAfvsmgLyncWNWs7d7qHaL44_TGSHnQvv9sWyLvQ6Emgkf-29DPs6L13Jez9kQTbkRk74x74dWQIM4ZgYRXdSY6SXO9Q3QCuzTOKjNB7azubD25wmZzkf8Zy2BHJVW6ZlrZkJdFk-ps-fi_kmEKqlKgb7slydAzvzbKe_NBfjjPbzXF_lngmWGCRptwzm__ZkFvcMYi4lnWQcWdliQwXV3RLWTExtWpZKjYDHo_pnYjf5VD-jPE0aw-0cR4mxq3L8yvaKDMBcrHMgW0pX92Gr7xAVqz8-KjbloIYXTDAcBylHw2NWKriJ-GPvBqncmJuN7f_30a-POvxEyi19mxArVetX-5gPWLMXbmgUcLdbiVwFuZxphVYwou4ddLFEAbjYhCSbMEGaSZk_pn8xw5AlNP4SBrZSK1iv69dY9sU1-cSHX4XlQEL-gOMiVHcattGccgR8BIHy8C9ArDWeIpuXpifaKSiOGkgRR8DQJ_eomJf1_ZJfxnHLvKFtK8rSlvKduN1NTJoFML5xelaNECXy6TeBmLfkxMtlvNs9TSdWtzIdsJlwJ9ALELwbs_9EPtWdOjaUArP5wPREsEobdH0lHSjrzge9AZlHhdwaDg9VTh5LI83XdMX82WfBfI0INKBA1Zoj4fcwqlicRjf0kOLtqe4a9LauK1An6WUpJQhu4CAP7AfZtJ5QbFzLV8QVqQFpNDNxuh63Mg9-i3ZwxToSFxcbzigvhzXkEr_DH9JCkmhyvkHPk1lmtD_n99FEyHKSvk5_LLtXtK5zUodaKmJ2wUDUfsNilMuXfUd2lrPN_R6cMnaii06f2SbCSOKXv8QIDw-7DvXY8qxr9xJAz4z8_e6y7bFyAA	3,084,112,150	LIQUIDADO	si

3552/19	542,990,600	CM GB 16/19 REG BPPID 2018 15000 0123 DE 23 08 2018 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJ RECUPER Y TERMINACION DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 9 NO 17 50 56 60 MPIO D	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9777053&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Cjg2EkJEi-iltyUzSppuSW-K3KR6PfvkspRcRQTnOJ0O3FkP4lOZ-ZTOxdt5zwZkLCiul4kHY31jC9ZGSvHUODe9tRj8f7cJZu_XU9fENXsXL6Wc5d4aGpcsZ2f_FitdLD15huejWvEocL1yW9fWZLJsBw3MXFcqpdDPtGPqAOEuLp9CGEs4VFU1nOU8dH0EKFX9JPSiN1rjExYjP-jMvUlbsZKd4F77mxHyWJj3djYEDuEQhnz6ZepKfXyL7VAIILOsODS-O-h-RXo6Fw4VVGT7B3otR3O9hes9vFNIHnlUFb3xRQDyRkoF5aiJRwdhPJCA2Xq_TIasFPSN_1dUcBfm8tCOdG_tEKK8WdOTlQeN_HHYmGZsuXeCqUMworEVj4UMn94N3TSrjN2RJ_gFdXwzeHBsPwiWXLKTq7zEh2YR01HNSWt7fKvhyI-B7uOsQjCFLSCrQT_hjCdjZVBT8OYn-Knpgsfu-jxcqJzIuRDQnBejll30bcZWy2f_Ss39Z22e0hJpqL2NDhUdbVobuPbrvXQnqvgln3ivv0SQWYfatLUNGFlVYvy7swX5PINporMiob5zbwIX_zAWm7fITHWb3NbqlXmyPHn-CIEUocLpc4luGvMkAJ7R1t_PIYAXIG31-LP8dNxvQX1P5sRihUqYXRNlwKLwumV8F8PleLdpSHUzI5sWI5tS6KWQmAj1QAXIMYKbuBo3W746_5iBADpbaBx89H0AkFDtdJoKAi8bHzgh5AmJ6_dZGHFfMMRDNgCyBLKzwo3gX5M_rY1SvMDurR5uTvCSzgDqW-jbVeyWNiJjNg2ZTnQj1cBJW9OCToL3uvezGZUJmATgzZyiQFV9MxuUqvviC34CWcLZWW1thm_doHP6R_T4awyfsOxOgY_RBIPwghrZlz9DUbORzefQlWPE_6bKVclovzS7IJp8EmI2CpVVtu654l5dPuXEcUg1F6NNNBZC6144B2_B2csN3D5IWI4CWBFsZRWUHgSARoMv323tKQt4EpwpWBJhbS3K9V0VxZDA6bjyO5LMVz34n2sbzELohZM4AgKY6_rzs6PI7x-oLi8GXipGDhY1IELBrdaKQkylnn7xEUZq4bZCLPW-Gp0hvmlv_BLfSMU-Cm23sdH3BLnhJggYw4yD0	215,887,850	LIQUIDADO	si
TOTAL	276,229,471,108			98,587,289,796		
GRAN TOTAL				374,816,760,904		

FUENTE: Formatos SIA CONTRALORIAS - Secretarias de Hacienda y Contratación de la Gobernación de Boyacá.

De acuerdo al formato 18B_CGB enviado a la plataforma SIA CONTRALORIAS, aparece en la columna estado actual del contrato, en etapa (4) es decir poscontractual contractual, en la tabla anterior y de acuerdo a la trazabilidad realizada los contratos están: liquidados, no liquidados y/o no fue posible hacer su seguimiento por falta de la documentación a pesar de ser requerida.

Tabla 53 SEGUIMIENTO INVERSION PRÉSTAMOS POR PAGAR

No.	(C) Entidad Financiera	(C) Descripción Del Contrato	(F) Fecha Inicio Del Crédito (Aaaammdd)	(F) Fecha Vencimiento (Aaaammdd)	(D) Saldo Deuda Anterior 31/12/2024	(D) Saldo Final De Deuda 31/12/2025
1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	12/2/2015	12/2/2025	-	-
2	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	12/2/2015	12/2/2025	-	-
3	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	12/2/2015	12/2/2025	4,158,625,000	-
4	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	10/21/2016	10/21/2026	-	-
5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	10/21/2016	10/21/2026	-	-
6	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	10/21/2016	10/21/2026	2,730,000,000	1,365,000,000
7	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	10/13/2017	10/13/2027	-	-
8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	10/13/2017	10/13/2027	-	-
9	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	10/13/2017	10/13/2027	1,202,267,279	801,511,519
10	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/24/2017	10/24/2027	-	-
11	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/24/2017	10/24/2027	-	-
12	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3.	10/24/2017	10/24/2027	2,092,358,977	1,394,905,985

		CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).				
13	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/26/2017	10/26/2027	-	-
14	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/26/2017	10/26/2027	-	-
15	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/26/2017	10/26/2027	697,790,883	465,193,922
16	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2017	12/7/2027	-	-
17	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2017	12/7/2027	-	-
18	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2017	12/7/2027	850,783,338	567,188,892
19	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/11/2017	12/11/2027	-	-
20	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/11/2017	12/11/2027	-	-
21	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/11/2017	12/11/2027	145,614,798	97,076,532
22	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/22/2017	12/22/2027	-	-
23	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO	12/22/2017	12/22/2027	-	-

		DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).				
24	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/22/2017	12/22/2027	864,278,820	576,063,612
25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	12/27/2017	12/27/2027	-	-
26	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	12/27/2017	12/27/2027	-	-
27	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	12/27/2017	12/27/2027	4,573,080,942	3,048,720,582
28	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/28/2017	12/28/2027	-	-
29	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/28/2017	12/28/2027	-	-
30	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/28/2017	12/28/2027	175,456,372	116,970,915
31	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/28/2017	12/28/2027	-	-
32	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/28/2017	12/28/2027	-	-
33	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/28/2017	12/28/2027	59,214,258	39,476,172
34	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	4/13/2018	4/13/2028	-	-
35	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	4/13/2018	4/13/2028	-	-
36	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	4/13/2018	4/13/2028	412,774,834	294,839,170

37	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	4/27/2018	4/27/2028	-	-
38	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	4/27/2018	4/27/2028	-	-
39	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	4/27/2018	4/27/2028	42,966,186	30,690,130
40	BANCO BBVA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO DE BOYACA.	6/1/2018	6/1/2028	-	-
41	BANCO BBVA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO DE BOYACA.	6/1/2018	6/1/2028	-	-
42	BANCO BBVA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO DE BOYACA.	6/1/2018	6/1/2028	5,151,999,993	3,679,999,993
43	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	6/20/2018	6/20/2028	-	-
44	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	6/20/2018	6/20/2028	-	-
45	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	6/20/2018	6/20/2028	417,153,494	297,966,778
46	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	6/26/2018	6/26/2028	-	-
47	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	6/26/2018	6/26/2028	-	-
48	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DESARROLLO VIAL PROVINCIAS DE ORIENTE Y NEIRA, LENGUPA Y LA LIBERTAD.	6/26/2018	6/26/2028	3,981,250,000	2,843,750,000
49	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	7/4/2018	7/4/2028	-	-
50	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	7/4/2018	7/4/2028	-	-
51	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	7/4/2018	7/4/2028	325,332,679	238,577,295
52	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO	7/4/2018	7/4/2028	-	-

		DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).				
53	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	7/4/2018	7/4/2028	-	-
54	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	7/4/2018	7/4/2028	646,537,616	431,025,084
55	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	8/1/2018	8/1/2028	-	-
56	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	8/1/2018	8/1/2028	-	-
57	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	8/1/2018	8/1/2028	629,570,408	419,713,616
58	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	8/22/2018	8/22/2028	-	-
59	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	8/22/2018	8/22/2028	-	-
60	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	8/22/2018	8/22/2028	237,323,974	174,037,581
61	BANCO BBVA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO DE BOYACA.	9/21/2018	9/21/2028	-	-
62	BANCO BBVA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO DE BOYACA.	9/21/2018	9/21/2028	-	-
63	BANCO BBVA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO DE BOYACA.	9/21/2018	9/21/2028	47,644,995	34,939,663
64	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	9/24/2018	9/24/2028	-	-
65	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	9/24/2018	9/24/2028	-	-

66	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	9/24/2018	9/24/2028	497,875,826	365,108,938
67	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	9/27/2018	9/27/2028	-	-
68	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	9/27/2018	9/27/2028	-	-
69	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	9/27/2018	9/27/2028	302,289,634	221,679,066
70	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	10/4/2018	10/4/2028	-	-
71	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	10/4/2018	10/4/2028	-	-
72	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	10/4/2018	10/4/2028	183,384,928	137,538,696
73	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/5/2018	10/5/2028	-	-
74	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/5/2018	10/5/2028	-	-
75	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/5/2018	10/5/2028	1,550,494,376	1,162,870,780
76	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/5/2018	10/5/2028	-	-
77	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL	10/5/2018	10/5/2028	-	-

		PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).				
78	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	10/5/2018	10/5/2028	22,439,919	16,829,939
79	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	-	-
80	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	-	-
81	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	394,702,100	296,026,576
82	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	-	-
83	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	-	-
84	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	145,619,530	109,214,646
85	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	-	-
86	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	-	-
87	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/7/2018	12/7/2028	87,500,351	65,625,263
88	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE	12/20/2018	12/20/2028	-	-

		TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).				
89	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/20/2018	12/20/2028	-	-
90	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/20/2018	12/20/2028	552,720,327	414,540,247
91	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/26/2018	12/26/2028	-	-
92	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/26/2018	12/26/2028	-	-
93	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	12/26/2018	12/26/2028	1,275,579,416	956,684,564
94	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/27/2018	12/27/2028	-	-
95	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/27/2018	12/27/2028	-	-
96	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/27/2018	12/27/2028	747,056,244	498,037,496
97	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	3/11/2019	3/11/2029	-	-
98	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	3/11/2019	3/11/2029	-	-
99	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	3/11/2019	3/11/2029	361,035,435	276,085,923
100	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	4/24/2019	4/24/2029	-	-
101	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE	4/24/2019	4/24/2029	-	-

		AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).				
102	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	4/24/2019	4/24/2029	436,614,013	302,327,921
103	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	4/30/2019	4/30/2029	-	-
104	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	4/30/2019	4/30/2029	-	-
105	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	4/30/2019	4/30/2029	351,138,661	273,107,849
106	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	5/7/2019	5/7/2029	-	-
107	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	5/7/2019	5/7/2029	-	-
108	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	5/7/2019	5/7/2029	122,657,327	95,400,147
109	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	5/8/2019	5/8/2029	-	-
110	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	5/8/2019	5/8/2029	-	-
111	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	5/8/2019	5/8/2029	307,948,761	239,515,701
112	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	5/8/2019	5/8/2029	-	-
113	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	5/8/2019	5/8/2029	-	-
114	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL	5/8/2019	5/8/2029	171,935,148	133,727,336

		CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).				
115	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	5/30/2019	5/30/2029	-	-
116	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	5/30/2019	5/30/2029	-	-
117	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	5/30/2019	5/30/2029	13,639,864	10,608,784
118	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	7/3/2019	7/3/2029	-	-
119	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	7/3/2019	7/3/2029	-	-
120	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	7/3/2019	7/3/2029	132,373,352	104,505,276
121	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/5/2019	7/5/2029	-	-
122	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/5/2019	7/5/2029	-	-
123	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/5/2019	7/5/2029	275,487,938	217,490,478
124	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	7/9/2019	7/9/2029	-	-
125	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	7/9/2019	7/9/2029	-	-
126	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	7/9/2019	7/9/2029	770,216,663	533,226,927
127	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/22/2019	7/22/2029	-	-
128	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/22/2019	7/22/2029	-	-
129	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/22/2019	7/22/2029	306,371,673	241,872,377
130	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3.	8/2/2019	8/2/2029	-	-

		RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).				
131	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	8/2/2019	8/2/2029	-	-
132	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	8/2/2019	8/2/2029	1,092,559,286	819,419,470
133	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	8/9/2019	8/9/2029	-	-
134	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	8/9/2019	8/9/2029	-	-
135	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	8/9/2019	8/9/2029	155,811,148	103,874,100
136	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	9/12/2019	9/12/2029	-	-
137	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	9/12/2019	9/12/2029	-	-
138	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	9/12/2019	9/12/2029	149,498,785	118,025,357
139	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	9/13/2019	9/13/2029	-	-
140	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	9/13/2019	9/13/2029	-	-
141	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	9/13/2019	9/13/2029	989,830,809	791,864,649
142	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	9/18/2019	9/18/2029	-	-
143	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	9/18/2019	9/18/2029	-	-
144	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	9/18/2019	9/18/2029	57,538,483	43,153,867
145	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3.	11/1/2019	11/1/2029	-	-

		RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).				
146	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/1/2019	11/1/2029	-	-
147	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/1/2019	11/1/2029	495,292,944	371,469,708
148	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/20/2019	11/20/2029	-	-
149	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/20/2019	11/20/2029	-	-
150	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/20/2019	11/20/2029	339,983,260	271,986,608
151	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	11/20/2019	11/20/2029	-	-
152	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	11/20/2019	11/20/2029	-	-
153	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	11/20/2019	11/20/2029	178,692,381	142,955,916
154	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	11/22/2019	11/22/2029	-	-
155	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	11/22/2019	11/22/2029	-	-
156	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	11/22/2019	11/22/2029	47,210,144	37,768,116
157	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/26/2019	11/26/2029	-	-
158	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/26/2019	11/26/2029	-	-
159	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	11/26/2019	11/26/2029	656,317,916	525,054,336
160	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/10/2019	12/10/2029	-	-
161	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/10/2019	12/10/2029	-	-
162	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/10/2019	12/10/2029	171,875,376	137,500,304

163	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/16/2019	12/16/2029	-	-
164	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/16/2019	12/16/2029	-	-
165	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/16/2019	12/16/2029	377,187,584	282,890,688
166	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/16/2019	12/16/2029	-	-
167	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO,CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/16/2019	12/16/2029	-	-
168	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/16/2019	12/16/2029	1,452,281,363	1,161,825,095
169	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/23/2019	12/23/2029	-	-
170	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/23/2019	12/23/2029	-	-
171	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/23/2019	12/23/2029	175,388,550	140,310,846
172	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/24/2019	12/24/2029	-	-
173	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/24/2019	12/24/2029	-	-
174	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/24/2019	12/24/2029	466,505,735	349,879,303
175	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/24/2019	12/24/2029	-	-
176	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/24/2019	12/24/2029	-	-
177	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	12/24/2019	12/24/2029	175,952,880	117,301,920
178	BANCO DE OCCIDENTE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA DETALLADOS EN EL CONTRATO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE 25 BUSES CON CAPACIDAD PARA 35 PASAJEROS Y 24 BUSETAS CON CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS.	12/24/2019	12/24/2027	-	-
179	BANCO DE OCCIDENTE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA DETALLADOS EN EL CONTRATO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE 25 BUSES CON CAPACIDAD PARA 35 PASAJEROS Y 24 BUSETAS CON CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS.	12/24/2019	12/24/2027	-	-
180	BANCO DE OCCIDENTE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA DETALLADOS EN EL CONTRATO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE 25 BUSES CON CAPACIDAD PARA 35 PASAJEROS Y 24 BUSETAS CON CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS.	12/24/2019	12/24/2027	5,560,928,576	3,707,285,720

181	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	2/18/2020	2/18/2030	-	-
182	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	2/18/2020	2/18/2030	-	-
183	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	2/18/2020	2/18/2030	775,535,436	627,814,404
184	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	3/13/2020	3/13/2030	-	-
185	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	3/13/2020	3/13/2030	-	-
186	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	3/13/2020	3/13/2030	616,040,424	410,693,616
187	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	3/13/2020	3/13/2030	-	-
188	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	3/13/2020	3/13/2030	-	-
189	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	3/13/2020	3/13/2030	26,597,720	21,278,176
190	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	3/20/2020	3/20/2030	-	-
191	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	3/20/2020	3/20/2030	-	-
192	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	3/20/2020	3/20/2030	350,122,675	262,592,007
193	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	3/19/2020	3/19/2030	-	-
194	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	3/19/2020	3/19/2030	-	-
195	BANCO BBVA	1. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE, HASTA EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($2.816.637.460), 2. RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO Y TERMINACION DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CRA 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ($3.033.094.200), 3. CONSTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA ($13.079.046.839), 4. ADECUACION DEL ENTORNO PAISAJISTICO Y DEL ESPACIO PUBLICO DEL EJE VIAL PASEO DE LA GOBERNACION DE TUNJA ($3.277.921.606).	3/19/2020	3/19/2030	232,641,833	188,329,105

196	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	4/8/2020	4/8/2030	-	-
197	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	4/8/2020	4/8/2030	-	-
198	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	4/8/2020	4/8/2030	131,021,796	108,235,396
199	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	5/21/2020	5/21/2030	-	-
200	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	5/21/2020	5/21/2030	-	-
201	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	5/21/2020	5/21/2030	173,467,231	134,918,963
202	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	6/12/2020	6/12/2030	-	-
203	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	6/12/2020	6/12/2030	-	-
204	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	6/12/2020	6/12/2030	144,278,623	118,046,151
205	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	6/30/2020	6/30/2030	-	-
206	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	6/30/2020	6/30/2030	-	-
207	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	6/30/2020	6/30/2030	333,234,665	275,280,813
208	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/1/2020	7/1/2030	-	-
209	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/1/2020	7/1/2030	-	-
210	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	7/1/2020	7/1/2030	13,911,116	11,491,792
211	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	10/14/2020	10/14/2030	-	-
212	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE	10/14/2020	10/14/2030	-	-

		AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).				
213	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	10/14/2020	10/14/2030	406,082,553	343,608,317
214	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/29/2020	10/29/2030	-	-
215	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/29/2020	10/29/2030	-	-
216	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/29/2020	10/29/2030	235,777,067	196,480,891
217	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/29/2020	10/29/2030	-	-
218	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/29/2020	10/29/2030	-	-
219	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/29/2020	10/29/2030	247,098,454	205,915,382
220	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/3/2020	12/3/2030	-	-
221	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/3/2020	12/3/2030	-	-
222	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/3/2020	12/3/2030	286,226,199	238,521,834
223	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/7/2020	12/7/2030	-	-
224	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/7/2020	12/7/2030	-	-
225	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/7/2020	12/7/2030	88,274,607	73,562,175
226	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/7/2020	12/7/2030	-	-
227	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/7/2020	12/7/2030	-	-
228	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/7/2020	12/7/2030	1,999,858,311	1,666,548,595
229	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/23/2020	12/23/2030	-	-
230	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	12/23/2020	12/23/2030	-	-
231	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA	12/23/2020	12/23/2030	200,801,359	167,334,471

		($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)				
232	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/23/2020	12/23/2030	-	-
233	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/23/2020	12/23/2030	-	-
234	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/23/2020	12/23/2030	1,301,211,066	1,084,239,998
235	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/30/2020	12/30/2030	-	-
236	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/30/2020	12/30/2030	-	-
237	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	12/30/2020	12/30/2030	490,265,661	408,438,969
238	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	1/14/2021	1/14/2031	-	-
239	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	1/14/2021	1/14/2031	-	-
240	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	1/14/2021	1/14/2031	142,539,990	119,733,594
241	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	3/17/2021	3/17/2031	-	-
242	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	3/17/2021	3/17/2031	-	-
243	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	3/17/2021	3/17/2031	1,236,012,237	1,038,250,281
244	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	5/5/2021	5/5/2031	-	-
245	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	5/5/2021	5/5/2031	-	-
246	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	5/5/2021	5/5/2031	128,545,278	108,769,086
247	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	5/14/2021	5/14/2031	-	-
248	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	5/14/2021	5/14/2031	-	-
249	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	5/14/2021	5/14/2031	234,813,601	198,688,433
250	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	5/14/2021	5/14/2031	-	-

251	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	5/14/2021	5/14/2031	-	-
252	BANCO DE OCCIDENTE	1. CONST PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LAS VEREDAS: VARELA, MOLINA, TENERIA, LA MESA, BALSA BAJO, SASA BAJO, CASA BLANCA Y SUCRE OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA ($2.909.419.223), 2. CONSTRUCCION PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PAIPA ($801.199.937), 3. CONST MULTIPARQUE SECTOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE PAIPA ($580.127.576), 4. IMPLEMENTACION FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA ($4.844.000.000), 5. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 18, CARRERA 18 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ($4.608.162.372).	5/14/2021	5/14/2031	592,118,137	501,023,039
253	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	6/17/2021	6/17/2031	-	-
254	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	6/17/2021	6/17/2031	-	-
255	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	6/17/2021	6/17/2031	35,297,199	29,866,862
256	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	8/12/2021	8/12/2031	-	-
257	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	8/12/2021	8/12/2031	-	-
258	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	8/12/2021	8/12/2031	83,482,477	71,114,705
259	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	8/13/2021	8/13/2031	-	-
260	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	8/13/2021	8/13/2031	-	-
261	BANCOLOMBIA S.A.	1. MEJ/REHAB/VIA MONIQUIRA-TOGUI ($2.346.149.670). 2. RECUPERAC/TERMINAC/EDIFICIO CONTATRALORIA GENERAL DE BOYACA ($8.300.000.000). 3. OBRAS POLIDEPORT/COLISEOS EN SAN LUIS DE GACENO, CHIVATA, CHITA Y SORACA ($2. 037.199.102)	8/13/2021	8/13/2031	577,203,677	491,692,025
262	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/25/2021	10/25/2031	-	-
263	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/25/2021	10/25/2031	-	-
264	BANCO DE OCCIDENTE	1. MEJ/REHAB/AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA GLORIETA HOSPITAL REGIONAL LA QUEBRADA L AROMA DUITAMA ($3.317.299.077). 2. ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUDITORIO JORGE VELOZA TUNJA ($4.704.382.300.97). 3. RECUP/TERM/POLIDEPORTIVOS/TUTAZA, BERBEO, FLORESTA, MONGUI, MONGUA, SOTAQUIRA Y VILLA DE LEYVA ($4.702.029.397.11).	10/25/2021	10/25/2031	859,673,779	736,863,241
265	BANCOLOMBIA S.A.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL VADO HONDO-LABRANZAGRANDE-YOPAL	8/29/2025	8/29/2035	-	-
266	BANCOLOMBIA S.A.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL VADO HONDO-LABRANZAGRANDE-YOPAL	8/29/2025	8/29/2035	-	-
267	BANCOLOMBIA S.A.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL VADO HONDO-LABRANZAGRANDE-YOPAL	8/29/2025	8/29/2035	-	8,927,010,000
268	BANCOLOMBIA S.A.	COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	10/22/2025	10/22/2035	-	-
269	BANCOLOMBIA S.A.	COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	10/22/2025	10/22/2035	-	72,219,637,688
270	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA,	5/13/2022	5/13/2032	-	-

		SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.				
271	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	5/13/2022	5/13/2032	-	-
272	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	5/13/2022	5/13/2032	4,340,863,647	4,030,801,957
273	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	7/17/2023	5/13/2032	-	-
274	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	7/17/2023	5/13/2032	-	-
275	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	7/17/2023	5/13/2032	6,902,577,179	6,409,535,951
276	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	9/15/2023	5/13/2032	-	-
277	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	9/15/2023	5/13/2032	-	-
278	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	9/15/2023	5/13/2032	24,768,834,298	22,999,631,848

279	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	6/25/2024	5/13/2032	-	-
280	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	6/25/2024	5/13/2032	-	-
281	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	6/25/2024	5/13/2032	6,336,005,081	5,883,433,289
282	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	7/12/2024	5/13/2032	-	-
283	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	7/12/2024	5/13/2032	-	-
284	FINDETER S.A.	1. CONST UNIDAD CUIDADO CRITICO ADEC SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA $5.000.000.000. 2. CONST NUEVA TORRE DE URGENCIAS Y ALTA COMPLEJIDAD PRIMERA ETAPA DE CUATRO PISOS ASISTENCIALES Y UN SÓTANO DE SERVICIOS $ 34.000.000.000. 3. CONST NUEVO BLOQUE DE TRES PISOS: PRIMER PISO AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO DE URGENCIAS, SEGUNDO PISO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL, TERCER PISO UNIDAD QUIRÚRGICA $ 5.000.000.000. 4. CONST NUEVA TORRE DE TRES PISOS PARA: SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNOSTICAS, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, SALAS DE CIRUGÍA, SALAS DE PARTOS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN $ 5.000.000.000.	7/12/2024	5/13/2032	6,651,719,795	6,176,596,953
285	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	2/6/2019	2/6/2029	-	-
286	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	2/6/2019	2/6/2029	-	-
287	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	2/6/2019	2/6/2029	183,695,495	140,473,023
288	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO	4/29/2019	1/29/2029	-	-

		($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).				
289	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	4/29/2019	1/29/2029	-	-
290	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	4/29/2019	1/29/2029	210,812,092	161,209,256
291	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/17/2019	1/17/2029	-	-
292	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/17/2019	1/17/2029	-	-
293	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/17/2019	1/17/2029	289,871,112	221,666,148
294	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/26/2019	1/26/2029	-	-
295	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/26/2019	1/26/2029	-	-
296	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/26/2019	1/26/2029	206,984,589	158,282,333
297	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/19/2019	3/19/2029	-	-
298	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/19/2019	3/19/2029	-	-
299	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/19/2019	3/19/2029	165,530,735	126,582,327
300	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	1/27/2020	1/27/2029	-	-
301	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO	1/27/2020	1/27/2029	-	-

		($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).				
302	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	1/27/2020	1/27/2029	985,026,639	753,255,663
303	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	3/16/2020	3/16/2029	-	-
304	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	3/16/2020	3/16/2029	-	-
305	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	3/16/2020	3/16/2029	43,989,074	33,638,702
306	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/4/2020	3/4/2029	-	-
307	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/4/2020	3/4/2029	-	-
308	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/4/2020	3/4/2029	106,632,244	81,542,304
309	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/16/2020	3/16/2029	-	-
310	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/16/2020	3/16/2029	-	-
311	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/16/2020	3/16/2029	31,492,964	24,082,856
312	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/26/2020	3/26/2029	-	-
313	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/26/2020	3/26/2029	-	-
314	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO	6/26/2020	3/26/2029	56,621,535	43,298,819

		($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).				
315	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/14/2020	1/14/2029	-	-
316	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/14/2020	1/14/2029	-	-
317	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/14/2020	1/14/2029	267,593,086	204,630,006
318	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/10/2020	12/10/2028	-	-
319	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/10/2020	12/10/2028	-	-
320	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/10/2020	12/10/2028	95,594,868	71,696,152
321	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	10/15/2020	1/15/2029	-	-
322	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	10/15/2020	1/15/2029	-	-
323	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	10/15/2020	1/15/2029	210,730,437	161,146,805
324	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	10/27/2020	1/27/2029	-	-
325	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	10/27/2020	1/27/2029	-	-
326	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	10/27/2020	1/27/2029	74,111,517	56,673,513
327	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO	12/15/2020	3/15/2029	-	-

		($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).				
328	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	12/15/2020	3/15/2029	-	-
329	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	12/15/2020	3/15/2029	39,193,819	29,971,747
330	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	12/23/2020	3/23/2029	-	-
331	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	12/23/2020	3/23/2029	-	-
332	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	12/23/2020	3/23/2029	186,009,106	142,242,258
333	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	2/8/2021	2/8/2029	-	-
334	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	2/8/2021	2/8/2029	-	-
335	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	2/8/2021	2/8/2029	37,112,034	28,379,790
336	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	4/22/2021	4/22/2029	-	-
337	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	4/22/2021	4/22/2029	-	-
338	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	4/22/2021	4/22/2029	53,830,130	41,867,882
339	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/22/2021	4/22/2029	-	-
340	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO	7/22/2021	4/22/2029	-	-

		($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).				
341	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	7/22/2021	4/22/2029	893,193,246	694,705,858
342	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/24/2021	3/24/2029	-	-
343	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/24/2021	3/24/2029	-	-
344	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	9/24/2021	3/24/2029	147,260,297	112,610,817
345	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	11/29/2021	2/28/2029	-	-
346	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	11/29/2021	2/28/2029	-	-
347	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	11/29/2021	2/28/2029	63,122,105	48,269,845
348	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/29/2022	3/29/2029	-	-
349	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/29/2022	3/29/2029	-	-
350	IDEBOY	1. CONST/MUROS/CONTENC/VIA FLORESTA-BUSBANZA ($828.056.723.55). 2. MEJ/MMTO/VIAS DUITAMA ($1.205.796.104.21). 3. CONST/CUBIERTA/POLIDEP/LA GERMANIA/TIBASOSA (399.388.285.72). 4. REHAB/MMTO/VIA EL SALITRE SOMONDOCO ($3.679.826.957.02). 5. ADEC/FUNC/PLANTA/SUPERIOR PARQUE PRINCIPAL PAUNA ($810.705.580.99). 5. CONST/TERM/CASONA PLAZA MERCADO TOPAGA ($602.371.526.91). 6. CONST/2a ETAPA/AULA Y BATRIAS SANITARIAS I.E. LAS MERCEDES GUAYATA ($660.600.355.43).	6/29/2022	3/29/2029	56,980,484	43,573,312
	TOTAL				116,341,482,331	172,578,017,796

FUENTE: Formatos SIA CONTRALORIAS - Secretaria de Hacienda Gobernación de Boyacá.

CRITERIO: Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Resolución 533 de 2015 e inobservancia de la Resolución 494 de 2017, aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso no se encuentran integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad.

CAUSA: Falta de efectividad en la gestión de la información de la situación financiera de la Gobernación de Boyacá, por parte de los funcionarios encargados en la realización de este proceso.

EFECTO: Reporte de la información financiera que no refleja la realidad económica y social de la Gobernación de Boyacá, lo que ocasiona riesgo por la inadecuada clasificación de la información, e inadecuada planeación de la gestión administrativa y financiera como resultado de una información con inconsistencias.

Analizada la respuesta y teniendo en cuenta que no soportan documento alguno como: extractos de las cuentas donde se encuentran los empréstitos, para desvirtuar la observación y no dan aclaración a la inconsistencia establecida por valor de **$4.059.369.245**, la cual fue establecida en trabajo de campo.

Por otra parte, no se pudo establecer en qué estado se encuentran los contratos realizados con los recursos del empréstito, en el formato 18B (C) Estado Actual Del Contrato (1) planeación (2) precontractual (3) contractual (4) postcontractual, establece estado poscontractual es decir 4, tampoco ha dado cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones de Registro de la deuda pública, por ejemplo, la Resolución No. 294 con fecha 12 de septiembre de 2025 que dice:



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ				
	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 3
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

RESOLUCIÓN No. 294

(12 de septiembre de 2025)

Por medio de la cual se autoriza el Registro de la Deuda Pública del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, Leyes 42 de 1993, 330 de 1996, 617 de 2000 y ordenanza 039 de 2007, y


C O N S I D E R A N D O:

Que el numeral 3 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescribe que es atribución del Contralor General de la República, "llevar un Registro de la Deuda Pública de la Nación de las Entidades Territoriales".

Que el Artículo 272 de la Constitución Política, establece como función de los Contralores Departamentales, las atribuciones al Contralor General de la República citadas en el Artículo 268 Ibidem.

Que el Artículo 43 de la Ley 42 de 1993, dispone que todo documento constitutivo de Deuda Pública, deberá someterse a la refrendación del Contralor General de la República.

Que la Resolución 020 de 20 de enero de 2025, de la Contraloría General de Boyacá; establece los periodos, forma y términos y la documentación que deben allegar a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas, las entidades sujetas a control, a efectos de obtener la Refrendación y Registro de la Deuda Pública.

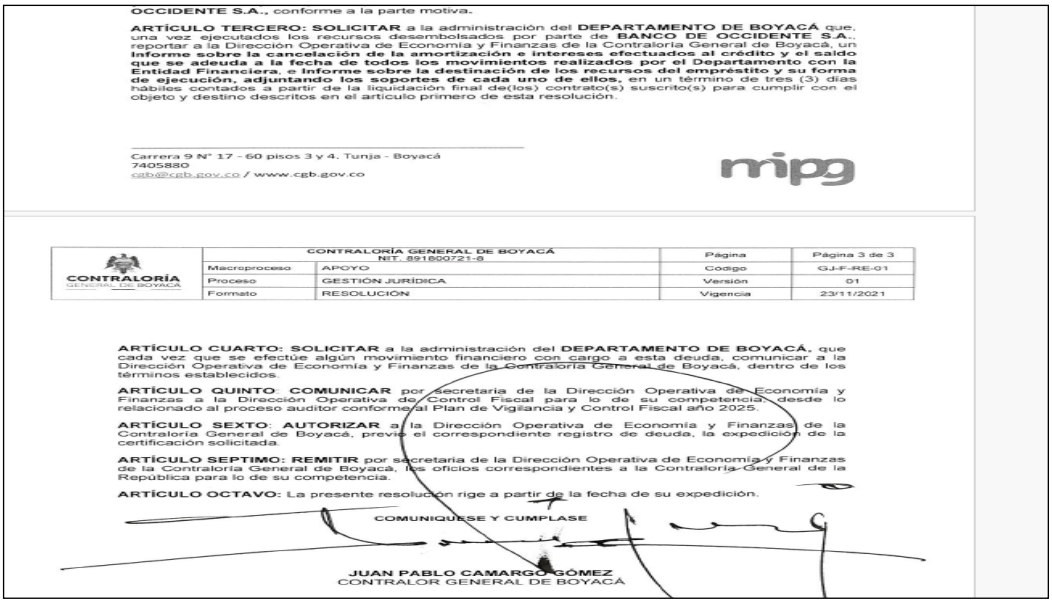

OCCIDENTE S.A., conforme a la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: SOLICITAR a la administración del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** que, una vez ejecutados los recursos desembolsados por parte de **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**, reportar a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, un **informe sobre la cancelación de la amortización e intereses efectuados al crédito y el saldo que se adeuda a la fecha de todos los movimientos realizados por el Departamento con la Entidad Financiera, e informe sobre la destinación de los recursos del empréstito y su forma de ejecución, adjuntando los soportes de cada uno de ellos,** en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la liquidación final de(los) contrato(s) suscrito(s) para cumplir con el objeto y destino descritos en el artículo primero de esta resolución.

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ				
	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 3 de 3
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

ARTÍCULO CUARTO: SOLICITAR a la administración del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, que cada vez que se efectúe algún movimiento financiero con cargo a esta deuda, comunicar a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, dentro de los términos establecidos.

ARTÍCULO QUINTO: **COMUNICAR** por secretaria de la Dirección Operativa de Economía y Finanzas a la Dirección Operativa de Control Fiscal para lo de su competencia, desde lo relacionado al proceso auditor conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal año 2025.

ARTÍCULO SEXTO: **AUTORIZAR** a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, previo el correspondiente registro de deuda, la expedición de la certificación solicitada.

ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR por secretaria de la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, los oficios correspondientes a la Contraloría General de la República para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En la Resolución No. 295 con fecha 12 de septiembre de 2025, artículo tercero:

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ				
	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 3
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

RESOLUCIÓN No. 295

(12 de septiembre de 2025)

Por medio de la cual se autoriza el Registro de la Deuda Pública del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.


EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, Leyes 42 de 1993, 330 de 1996, 617 de 2000 y ordenanza 039 de 2007, y

C O N S I D E R A N D O:

Que el numeral 3 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescribe que es atribución del Contralor General de la República, "llevar un Registro de la Deuda Pública de la Nación de las Entidades Territoriales".

Que el Artículo 272 de la Constitución Política, establece como función de los Contralores Departamentales, las atribuciones al Contralor General de la República citadas en el Artículo 268 Ibídem.

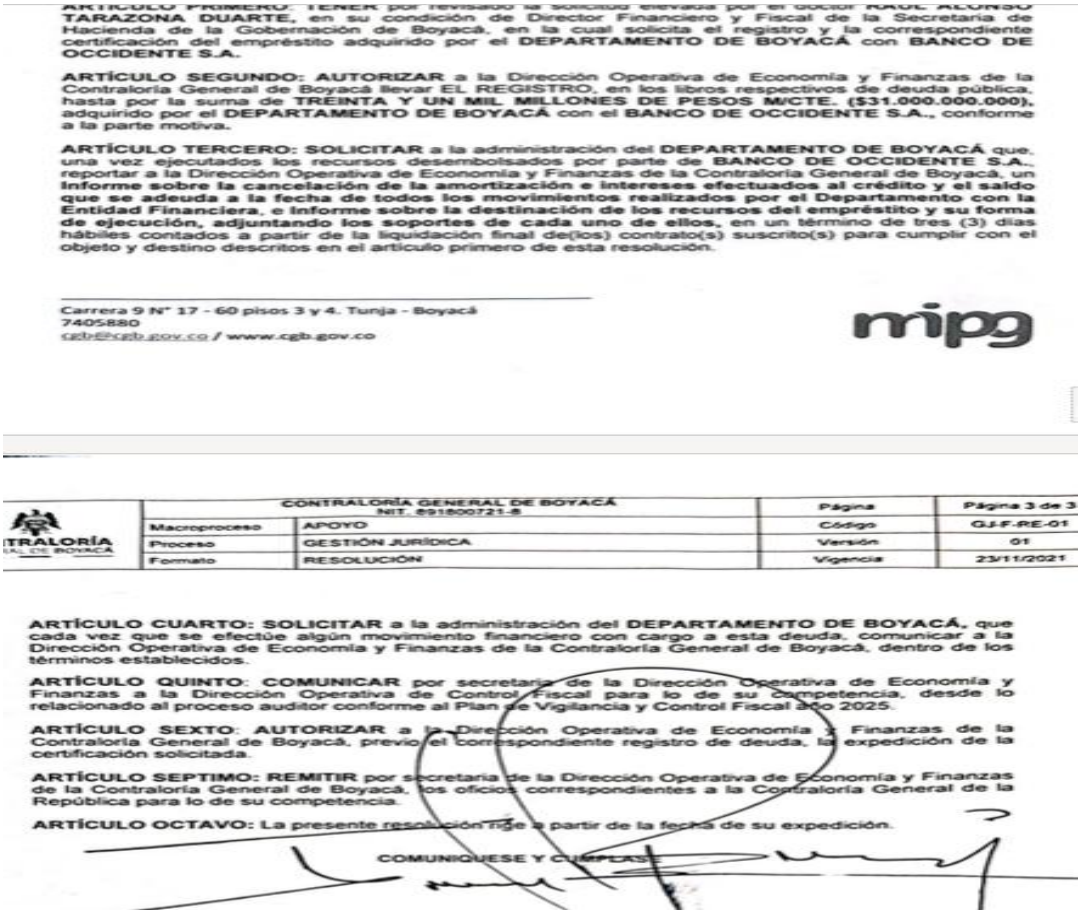

ARTÍCULO PRIMERO: TENER por tercero de buena fe exenta por el doctor **RAÚL ALONSO TARAZONA DUARTE**, en su condición de Director Financiero y Fiscal de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá, en la cual solicita el registro y la correspondiente certificación del empréstito adquirido por el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** con **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá llevar EL REGISTRO, en los libros respectivos de deuda pública, hasta por la suma de **TREINTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($31.000.000.000),** adquirido por el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** con el **BANCO DE OCCIDENTE S.A.,** conforme a la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: SOLICITAR a la administración del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** que, una vez ejecutados los recursos desembolsados por parte de **BANCO DE OCCIDENTE S.A.,** reportar a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, un **informe sobre la cancelación de la amortización e intereses efectuados al crédito y el saldo que se adeuda a la fecha de todos los movimientos realizados por el Departamento con la Entidad Financiera, e informe sobre la destinación de los recursos del empréstito y su forma de ejecución, adjuntando los soportes de cada uno de ellos,** en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la liquidación final de(los) contrato(s) suscrito(s) para cumplir con el objeto y destino descritos en el artículo primero de esta resolución.

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá
7405880
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mipg

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8			
Macroproceso	APOYO	Página	Página 3 de 3
Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Código	GJ-F-RE-01
Formato	RESOLUCIÓN	Versión	01
		Vigencia	23/11/2021

ARTÍCULO CUARTO: SOLICITAR a la administración del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** que cada vez que se efectúe algún movimiento financiero con cargo a esta deuda, comunicar a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, dentro de los términos establecidos.

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR por secretaría de la Dirección Operativa de Economía y Finanzas a la Dirección Operativa de Control Fiscal para lo de su competencia, desde lo relacionado al proceso auditor conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal año 2025.

ARTÍCULO SEXTO: AUTORIZAR a la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, previo el correspondiente registro de deuda, la expedición de la certificación solicitada.

ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR por secretaría de la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, los oficios correspondientes a la Contraloría General de la República para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que no aclaran las inconsistencias, ni soportan documento a las Resoluciones expedidas por esta Entidad de Control, se confirma en todas sus partes esta observación y se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

OPERACIONES RECIPROCAS.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 12. OPERACIONES RECIPROCAS PRESENTAN INCONSISTENCIAS.

CONDICIÓN: Se evidenció que la Entidad a diciembre 31 de 2025, presenta diferencias con el valor que registran y reportan las entidades públicas con las cuales efectúan transacciones económicas, acorde al reporte de la CGN tenemos:

Tabla 54 OPERACIONES RECIPROCAS

CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD	CUENTA	VALOR REPORTADO	PARTIDA CONCILIATORIA	ORIGEN DIFERENCIA
0		SUBVENCIONES	0.0	-5,802,108,293.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
125115000	E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	5,802,108,293.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-1,954,074,023.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
125915000	E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	1,954,074,023.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-1,835,864,601.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
27400000	Universidad Nacional de Colombia	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,835,864,601.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-1,576,368,414.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,576,368,414.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272936	Tierrasua S.A.S.	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-1,340,768,411.8	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220315322	E.S.E. Hospital Regional II Nivel Valle de Tenza	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	1,340,768,411.8	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-1,215,477,971.6	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115466	E.S.E. las Mercedes del Municipio de Monguí	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	1,215,477,971.6	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-799,446,859.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	6,693,134,150.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	10,553,988,671.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,413,782,615.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,474,757,330.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	PARA PROGRAMAS DE SALUD	863,859,770.5	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	11,287,450,716.5	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,719,248.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-759,948,645.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,584,074,666.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
211615516	Paipa	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,824,126,021.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-682,769,063.7	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	716,717,073.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213715837	Tuta	PARA PROGRAMAS DE SALUD	33,948,009.3	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-610,318,903.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
90900000	E.S.E. Centro de Salud Rafael Salgado	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	184,435,814.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

90900000	E.S.E. Centro de Salud Rafael Salgado	OTRAS SUBVENCIONES	428,449,172.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,566,083.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-539,202,746.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,566,083.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
126115000	E.S.E. Hospital Regional de Duitama	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	541,768,829.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-539,070,562.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	539,070,562.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213215332	Güicán	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-531,759,737.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
12300000	Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	3,121,919,737.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,590,160,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-479,581,571.1	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115368	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Natividad Jericó - Boyacá	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	479,581,571.1	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-476,302,689.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115162	E.S.E. Centro de Salud - Cerinza	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	476,302,689.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-454,989,259.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115820	E.S.E. Centro de Salud San Judas Tadeo	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	454,989,259.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-434,485,963.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	434,485,963.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
125454000	Universidad de Pamplona	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-430,501,135.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
126115000	E.S.E. Hospital Regional de Duitama	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	430,501,135.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-429,482,345.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,566,083.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
126415000	E.S.E. Salud Aquitania	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	432,048,428.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-425,459,436.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115403	E.S.E. Centro de Salud la Uvita	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	425,459,436.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-402,943,742.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
97000000	E.S.E. Centro de Salud San Vicente Ferrer - Saboyá - Boyacá	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	402,943,742.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-344,999,999.7	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,616,234,723.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	169,676,177.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
211715317	Guacamayas	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,961,234,723.1	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
211715317	Guacamayas	PARA PROGRAMAS DE SALUD	169,676,176.6	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-343,825,087.8	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,206,921,500.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	310,536,525.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	229,308,214.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216215762	Sora	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,206,921,499.9	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216215762	Sora	PARA PROGRAMAS DE SALUD	310,536,524.9	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216215762	Sora	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	573,133,302.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-313,098,726.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115897	U.A.E. Centro de Salud - Zetaquirá	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	313,098,726.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-311,061,546.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
92000000	E.S.E. Inés Ochoa Pérez - Tibasosa	OTRAS SUBVENCIONES	311,061,546.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-305,631,703.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	305,631,703.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210815808	Tinjacá	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-295,008,630.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
93500000	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Rita de Casia	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	295,008,630.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-290,850,729.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115686	E.S.E. Centro de Salud de Santana	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	290,850,729.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-280,417,443.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	263,787,443.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	16,630,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217615676	San Miguel de Sema	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-277,982,048.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115837	E.S.E. Puesto de Salud San Miguel - Tuta	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	277,982,048.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-276,697,953.8	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115621	E.S.E. Centro de Salud San Rafael - De Rondón	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	276,697,953.8	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-274,631,388.7	Por inconsistencia en reporte y registros contables

111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	646,670,088.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	322,895,545.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
212215822	Tota	PARA PROGRAMAS DE SALUD	694,934,244.3	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-273,360,888.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
93700000	E.S.E. Centro de Salud de Motavita	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	273,360,888.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-265,195,398.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	338,585,974.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216215162	Cerinza	PARA PROGRAMAS DE SALUD	338,585,974.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216215162	Cerinza	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	265,195,398.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-262,004,235.4	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	553,325,200.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	262,004,235.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
219715897	Zetaquira	PARA PROGRAMAS DE SALUD	553,325,199.6	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-252,319,504.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115212	E.S.E. Centro de Salud Luis Lanceros - Coper	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	252,319,504.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-250,106,323.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115832	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Tunúngua	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	250,106,323.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-249,394,018.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115109	E.S.E. Centro de Salud - Buenavista	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	249,394,018.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-248,483,322.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115757	E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús - Socha	OTRAS SUBVENCIONES	248,483,322.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-243,798,496.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5,132,167.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115296	E.S.E. Gámeza Municipio Saludable	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	248,930,663.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-240,152,323.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	383,035,921.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	80,388,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217715377	Labranzagrande	PARA PROGRAMAS DE SALUD	383,035,921.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217715377	Labranzagrande	OTRAS TRANSFERENCIAS	320,540,323.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-225,315,248.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	225,315,248.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210015500	Oicatá	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-222,766,805.8	Por inconsistencia en reporte y registros contables

111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	303,639,120.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217915879	Viracachá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	526,405,925.8	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-220,769,078.2	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	237,974,220.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213515135	Campohermoso	OTRAS TRANSFERENCIAS	458,743,298.2	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-220,234,800.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
11800000	Ministerio de Transporte	OTRAS TRANSFERENCIAS	220,234,800.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-219,414,300.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,566,083.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115226	E.S.E. Centro de Salud Lago salud de Cuítiva	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	221,980,383.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-212,264,868.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212,264,868.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217615676	San Miguel de Sema	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-204,013,336.6	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	204,013,336.6	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-192,088,900.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115106	E.S.E. Centro de Salud de Briceño	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	192,088,900.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-183,111,493.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5,132,167.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115676	E.S.E. Centro de Salud - San Miguel	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	188,243,660.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-180,019,206.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
127215000	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Paipa	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	180,019,206.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-180,000,000.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
826715000	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	180,000,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-178,980,539.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	178,980,539.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210615106	Briceño - Boyacá	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-175,045,681.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115403	E.S.E. Centro de Salud la Uvita	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	175,045,681.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-151,276,310.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	151,276,310.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213215332	Güicán	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-147,007,046.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	147,007,046.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
214815248	El Espino	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-142,256,360.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
126115000	E.S.E. Hospital Regional de Duitama	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	142,256,360.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-141,997,643.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	141,997,643.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
214015740	Siachoque	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-140,903,242.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	79,131,251.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
128868000	Universidad Industrial de Santander	OTRAS TRANSFERENCIAS	220,034,493.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-135,381,625.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115761	E.S.E. Centro de Salud San Sebastián	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	135,381,625.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-128,844,704.4	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
126415000	E.S.E. Salud Aquitania	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	128,844,704.4	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-109,826,728.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	109,826,728.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
219215092	Betéitiva	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-104,381,812.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	104,381,812.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216215162	Cerinza	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-97,304,020.3	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210815808	Tinjacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	97,304,020.3	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-89,223,191.2	Por inconsistencia en reporte y registros contables
27615000	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,431,201,154.2	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
27615000	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	378,653,782.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,431,201,154.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	289,430,591.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-85,238,015.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	85,238,015.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210015500	Oicatá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-84,608,175.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	84,608,175.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
211415114	Busbanzá	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-83,661,488.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
90900000	E.S.E. Centro de Salud Rafael Salgado	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	83,661,488.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-82,690,236.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	82,690,236.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217915879	Viracachá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-81,938,851.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115514	E.S.E Centro de Salud Jorge González Olmos - Páez	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	81,938,851.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-80,721,891.3	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115814	E.S.E. Centro de Salud de Toca	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	80,721,891.3	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-80,713,414.8	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217615676	San Miguel de Sema	OTRAS TRANSFERENCIAS	80,713,414.8	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-80,497,046.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,173.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216715367	Jenesano	OTRAS TRANSFERENCIAS	80,499,219.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-78,113,589.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115494	E.S.E. Centro de Salud - Nuevo Colón	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	78,113,589.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-77,603,221.7	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115790	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Tasco	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	77,603,221.7	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-76,301,143.9	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,255,269,958.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216215762	Sora	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,331,571,101.9	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-70,560,000.3	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	264,400,546.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	70,560,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
212115621	Rondón	PARA PROGRAMAS DE SALUD	264,400,545.7	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-70,454,545.5	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,068,331,480.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	70,454,545.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
211415814	Toca	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,068,331,479.5	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-66,943,090.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
219715897	Zetaquira	OTRAS TRANSFERENCIAS	66,943,090.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-66,895,556.9	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212,440,090.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	66,895,557.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
211815518	Pajarito	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212,440,090.1	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-65,863,945.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115087	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de Belén	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	65,863,945.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-65,310,648.9	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
270115660	E.S.E. Centro de Salud Jaime Díaz Pérez	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	65,310,648.9	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-62,945,674.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
218515185	Chitaraque	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,945,674.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-62,919,842.9	Por inconsistencia en reporte y registros contables
27400000	Universidad Nacional de Colombia	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,919,842.9	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-61,890,855.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	61,890,855.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210115401	La Victoria - Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-60,872,441.6	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	489,563,909.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
218915189	Ciénega - Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	550,436,350.6	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-58,736,451.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	58,736,451.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115332	E.S.E. Hospital Andrés Girardot - Güicán	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.0	-57,587,314.1	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	5,452,927,982.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,834,991,048.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO	2,207,773,061.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS, Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS CON BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.	83,753,269.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	671,317,983.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	110,214,900.1	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	OTROS RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO	602,465,035.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-54,855,556.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115761	E.S.E. Centro de Salud San Sebastián	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	54,855,556.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-53,455,916.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127,831,916.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	15,624,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210115401	La Victoria - Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	90,000,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-53,373,203.5	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115162	E.S.E. Centro de Salud - Cerinza	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	53,373,203.5	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-50,586,011.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,586,011.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217315673	San Mateo	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-50,586,011.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217315673	San Mateo	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,586,011.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-49,140,001.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	195,579,766.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	49,140,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213215832	Tununguá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	195,579,765.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-48,153,476.4	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220215380	E.S.E. Centro de Salud - La Candelaria	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	48,153,476.4	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-47,690,999.5	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210,600,782.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	47,691,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
215015550	Pisba	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210,600,782.5	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-40,352,779.7	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	692,652,791.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	93,250,102.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213515835	Turmequé	PARA PROGRAMAS DE SALUD	692,652,791.4	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213515835	Turmequé	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	52,897,322.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-39,691,160.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	189,404,563.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
219315293	Gachantivá	OTRAS TRANSFERENCIAS	229,095,723.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-37,862,999.9	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	852,212,773.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	37,863,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
215515455	Miraflores - Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	852,212,773.1	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-36,102,359.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210315403	La Uvita	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,102,359.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-34,894,702.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220215759	E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	34,894,702.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-32,090,245.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
13200000	Registraduría Nacional del Estado Civil	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	15,381,346.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	47,471,591.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-32,004,000.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	489,409,242.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	32,004,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216715667	San Luis de Gaceno	PARA PROGRAMAS DE SALUD	489,409,242.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-30,373,252.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,668,352.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
212615226	Cuítiva	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,295,100.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-29,981,500.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
22200000	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	29,981,500.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-25,325,999.2	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	922,106,482.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	25,326,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
218015480	Muzo	PARA PROGRAMAS DE SALUD	922,106,482.8	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-24,512,000.1	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,946,359,424.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	49,024,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217615176	Chiquinquirá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,946,359,423.9	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217615176	Chiquinquirá	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	24,512,000.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables

0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-21,300,000.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	96,007,883.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210815808	Tinjacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	117,307,883.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-19,655,054.9	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	635,787,515.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	19,655,055.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
216315763	Sotaquirá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	635,787,515.1	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		REGALÍAS	0.0	-18,216,363.2	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272423	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	OTROS INTERESES POR COBRAR	18,216,363.2	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-16,638,412.4	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	138,957,956.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210315403	La Uvita	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	138,957,956.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210315403	La Uvita	OTROS GASTOS DIVERSOS	16,638,412.4	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-15,608,867.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
827815000	Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,608,867.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-13,931,018.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,283,950.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
211115511	Pachavita	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,214,968.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-13,779,673.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,779,673.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217615476	Motavita	Esta entidad no reporto operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-13,250,869.4	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	715,950,695.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	70,454,545.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
210015600	Ráquira	PARA PROGRAMAS DE SALUD	773,154,370.6	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	-12,490,637.5	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	PARA PROGRAMAS DE SALUD	318,506,860.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
217215172	Chinavita	PARA PROGRAMAS DE SALUD	330,997,497.5	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		SUBVENCIONES	0.0	-12,356,783.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
111515000	Departamento de Boyacá	Esta entidad no reportó operación recíproca	0.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
220115839	E.S.E. Centro de Salud Simón Bolívar - Tutazá	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	12,356,783.0	0.0	Por inconsistencia en reporte y registros contables
			158,026,207,546.2	-33,913,698,356.6	

Fuente: Reporte de Operaciones reciprocas de la Contaduría General de la Nación.


Estas cifras son referenciadas a fin de que la Gobernación De Boyacá realice las gestiones administrativas necesarias para conciliarlas para subsanar estas deficiencias.

Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá realizó acciones para la conciliación de saldos de operaciones reciprocas como: Comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, consultas con la Contaduría General de la Nación, establece y hace seguimiento a los compromisos realizados con los Entes involucrados.

Atendiendo las instrucciones impartidas por la CGN y el procedimiento de la Gobernación con suficiente antelación se realizó la circularización de los saldos a través del formato **CÓDIGO: A-GF-GI-F-032** y enviado a los correos oficiales que se tienen en la base de datos del área.

Por tal razón, expidió la Gobernación de Boyacá, las Circulares con fechas febrero 5 y 26 de 2026.

Ilustración 29



Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-032
CIRCULARIZACIÓN OPERACIONES RECÍPROCAS A REPORTAR POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		FECHA: 7/May/2025


Tunja, Febrero 5 de 2026

Señores:
ENTIDADES DEL ESTADO DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
Ciudad

ASUNTO: CIRCULARIZACION OPERACIONES RECÍPROCAS A REPORTAR POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CON CORTE a DICIEMBRE 2025

Respetados señores:

En cumplimiento a lo estipulado en Circular Externa 005 de septiembre de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación, y con el fin de realizar conciliación de las Operaciones Recíprocas, nos permitimos informar los saldos que el Departamento reportará con corte a DICIEMBRE de 2025



Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-049
CIRCULARIZACIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS		FECHA: 07/May/2025

Tunja, Febrero 26 de 2026

Señores:
GERENCIA
E.S.E. Centro de Salud Simón Bolívar – Tutazá
Ciudad

ASUNTO: CONCILIACIÓN OPERACIONES RECÍPROCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ COD 111515000 CON CORTE DICIEMBRE DE 2025

Respetados señores:

En cumplimiento a lo estipulado en Circular Externa 005 de septiembre de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación, y con el fin de realizar conciliación de las Operaciones Recíprocas, nos permitimos solicitar **se revisen y concilien** los saldos que tiene su entidad con la nuestra y que fueron reportados **a la CGN.**


Existen tres aspectos que se deben tener en cuenta para que los saldos de operaciones recíprocas reportados cumplan su reciprocidad

1. Que las cuentas reportadas por ambas entidades sean correlativas de acuerdo a las reglas de eliminación emitidas por la Contaduría General de la Nación.
2. Que los saldos reportados por ambas entidades sean clasificados de igual manera de acuerdo a su exigibilidad y liquidez en Corriente y No Corrientes.
3. Que los valores reportados sean iguales.

De acuerdo a lo anterior y con base en la información enviada por ambas entidades a la CGN con corte a DICIEMBRE DE 2025 se pudo identificar las siguientes partidas conciliatorias que por operaciones recíprocas se generaron así:

También oficializaron a las diferentes Entidades, por ejemplo.

Ilustración 30



Gobernación de Boyacá | Hacienda

Tunja, Marzo 1 de 2026

DOCTORA
FRANCY YANETH MAYORGA CANTOR
Asesor
Contaduría General de la Nación

ASUNTO: **0260226_RSXC_111515000 REQUERIMIENTO SALDOS POR CONCILIAR-OPERACIONES RECIPROCAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 – II REPORTE (PRELIMINAR)**

En atención a la conversación sostenida el día viernes 27 de febrero sobre la revisión de los saldos por conciliar con el Departamento de Boyacá realizamos las siguientes explicaciones sobre los saldos más significativos:


En el análisis de la información suministrada, se estableció circularización para realizar ajustes a las Operaciones Reciprocas a diciembre de 2025, en la gestión realizada por la Gobernación de Boyacá en la conciliación de las partidas se reflejó la disminución del año 2025 respecto al año 2024, cuyos valores fueron de $33.418.962.267 y $88.292.709.855, con una variación en disminución del -$54.873.747.588 y con un número de partidas entre 169 y 295, con una disminución de 126 partidas conciliatorias es decir una disminución del -142.71%, tal como se ilustra en la siguiente tabla y gráfica

Tabla 55 COMPARATIVO OPERACIONES RECIPROCAS 2025 - 2024

INFORMA A DICIEMBRE DE 2024		INFORME A DICIEMBRE DE 2025		COMPARATIVO 2025 - 2024		VARIACIÓN %	VARIACIÓN %
Número de partidas conciliatorias año 2024	Valor Partidas Conciliatorias 2024	Número de partidas conciliatorias año 2025	Valor Partidas Conciliatorias 2024	Variación Absoluta Número de partidas Conciliatorias	Variación Absoluta Valor partidas Conciliatorias	Variación % Número de partidas	Variación Valor Partidas Porcentual
295	88,292,709,855	169	33,418,962,267	-126	(54,873,747,588)	-142.71%	-62.15%

Fuente: Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Boyacá.

Ilustración 31 COMPARATIVO OPERACIONES RECIPROCAS 2025 - 2024

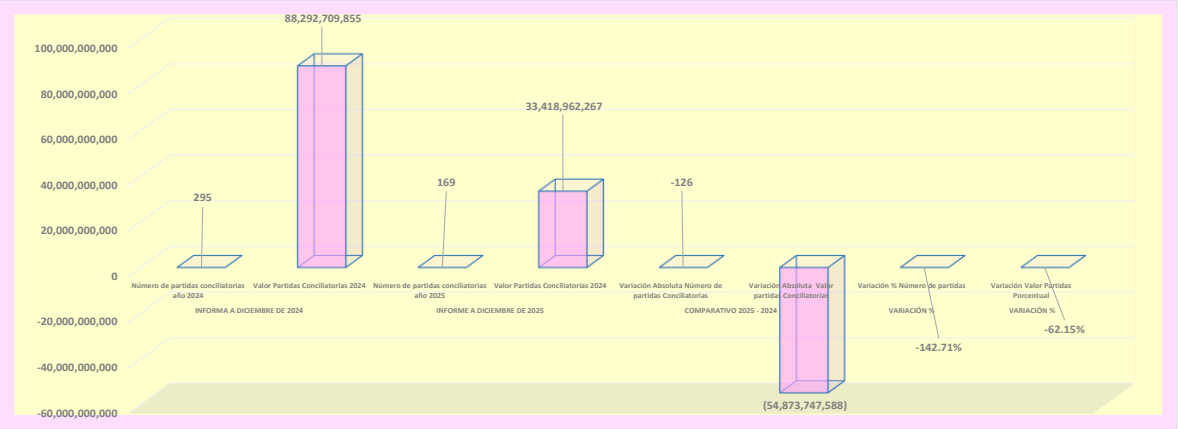

Por lo descrito anteriormente el equipo de la Gobernación de Boyacá debe continuar con la depuración de las operaciones reciproca a fin de que se presentes de manera razonable los Estados Financieros.

Criterio: De acuerdo con la **Resolución 193 del 05 de mayo de 2016**, "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable." En su numeral 3.2 Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable, 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información.

Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, acudiendo a herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las cuales se efectúan transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización con deudores y acreedores.

El Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable establecido por la **Resolución 193 de 2016** expedido por la Contaduría General de la Nación, determina que:

> *"De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, acudiendo a herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las cuales se efectúan transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización con deudores y acreedores."*

Incumplimiento de la Circular Externa 005 de septiembre de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación, a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, aunado al hecho de que los módulos de las dependencias que tienen que ver con este proceso no se encuentran integrados en línea con software PCTG y con la Dependencia de Contabilidad. Inobservancia de la Resolución 494 de 2017.

Resolución 357 de 2008 – Régimen de Contabilidad Pública (Contaduría General de la Nación). **Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública – Operaciones Recíprocas**, CGN. **Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de la Contraloría General de Boyacá**, componente de legalidad e información financiera. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) – Principios de razonabilidad y verificabilidad.

El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad. Igual que en la normativa colombiana, en NIIF, las notas deben venir

referenciadas en el cuerpo de los estados financieros de la entidad, las operaciones reciprocas.

CAUSA: Deficiencias en los procesos de conciliación contable con terceros, ausencia de procedimientos internos claros para la validación de operaciones recíprocas y omisión de registros por parte del Grupo de Gestión Contable de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ y fuentes de recolección de información interna y externa.

EFECTO: Estas operaciones se eliminan en el proceso de consolidación, con el fin de evitar la sobrestimación generada por la doble acumulación de valores, la diferencia presentada en los saldos referidos afecta la mencionada consolidación al no tener certeza sobre los mismos, para lo cual deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso conciliatorio tenga un seguimiento entre los documentos soporte y los libros de contabilidad a fin de subsanar estas deficiencias. Por lo tanto, afecta la **razonabilidad de los estados financieros**, ya que las cifras no reflejan de forma íntegra la realidad contable de la entidad. Se dificulta la **comparabilidad interinstitucional**, afectando el sistema consolidado de contabilidad pública.

Una vez analizada la respuesta, se evidenció que la Entidad a diciembre 31 de 2025, presenta diferencias con el valor que registran y reportan las entidades públicas con las cuales efectúan transacciones económicas, acorde al reporte de la CGN, por lo que no aportan documento alguno del avance en las inconsistencias presentadas, en la columna origen de las diferencias, por lo que se confirma la observación a fin de que continúen con la depuración de las diferencias presentadas y se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 12,** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

CONTROL INTERNO CONTABLE

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13. CONTROL INTERNO CONTABLE PRESENTA INCONSISTENCIAS.

CONDICIÓN: La evaluación de la calidad y eficiencia del control interno contable se obtiene como producto de la administración de riesgos institucionales y de cada uno de los controles evaluados, cuyo resultado permitió la identificación de deficiencias, e incumplimientos en los procesos financieros y presupuestales, donde probablemente dichos procesos se exponen a un alto nivel de materialización de riesgo lo cual se relaciona con:

- ✓ **AUSENCIA DE SEGUIMIENTOS PERMANENTES** por parte de los Lideres responsables del proceso contable y financiero, deficiencias en el liderazgo y consolidación a los planes de mejoramiento a todos los procesos analizados, en la evaluación del plan de fomento a la cultura del autocontrol, en no prestar acompañamiento y asesoría a los responsables de procesos en la formulación de acciones correctivas para los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas.
- ✓ **AUSENCIA DE MEDIDAS Y ACCIONES CONCRETAS** que permitan la identificación y valoración de riesgos financieros y contables con la capacidad de afectar el proceso contable. El sistema de Control Interno de la Gobernación de Boyacá, está obligado a tener un papel proactivo frente al seguimiento a la actualización de los mapas de riesgos, aspecto donde la Secretaría de Hacienda, no ha agotado dicho proceso de manera satisfactoria y efectiva, convirtiéndose en la sectorial con más dificultad para enfrentar la identificación de los riesgos y la efectividad de los controles diseñados, a pesar del acompañamiento y asesoría que se les ha brindado por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Boyacá.
- ✓ **CARENCIA** de eficacia y eficiencia en cuanto a los resultados derivados del funcionamiento del comité coordinador de control interno, del comité técnico de sostenibilidad financiera y de los sistemas de información.

Por lo tanto, se denota falencia del uso de herramientas otorgadas en los modelos de calidad y control interno, (MECI-MIPG) que propendan por buscar la mejora en la información financiera; así como tampoco de la implementación de mecanismos, políticas y lineamientos organizacionales, orientados a la depuración, progreso y perfeccionamiento de la información financiera al 31 de diciembre de 2025.

No se presentan planes de mejoramiento definidos, según formato institucional V-CG-F-011 producto de los resultados de auditorías internas, sin evidenciar el seguimiento y control por parte de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Boyacá.

De acuerdo con los anteriores resultados, el concepto sobre control fiscal interno contable es **Con deficiencias**.
Al igual que revisando el contenido del documento en formato Excel, enviado al grupo auditor como parte de la información complementaria y que corresponde al mismo que fue entregado a la auditora en desarrollo del proceso auditor, la

calificación obtenida fue de cuatro punto cero uno (4.01) , la cual según las disposiciones de la Resolución N°193 de 2016, corresponde al grado de cumplimiento y efectividad del control interno contable, valor que en la escala de calificación se interpreta como calificación cualitativa eficiente, pero que no se ajusta a la realidad de la Gobernación de Boyacá de acuerdo a lo observado por el Equipo Auditor.

Ilustración 32 CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO

RANGO DE CALIFICACION	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
1.0 ≤ CALIFICACION <3.0	DEFICIENTE
3.0 ≤ CALIFICACION <4.0	ADECUADO
4.0 ≤ CALIFICACION ≤5.0	EFICIENTE

Estas situaciones se observan y deben ser objeto de explicación, debido a que en la EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE su calificación cualitativa es eficiente y su rango de calificación corresponde a un 4,01, que no es coherente con lo planteado anteriormente, en lo relacionado con el proceso macro financiero de la vigencia 2025, a la Gobernación de Boyacá, para lo cual se debe tener en cuenta:

Tabla 56 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES
2.1	FORTALEZAS	El sector Central, cuenta con un equipo de trabajo dinámico y proactivo, que permite cumplir con cada una de las actividades del proceso contable, generando un ambiente de trabajo óptimo para el desarrollo de sus actividades en cada uno de los procesos, y dando cumplimiento dentro de su oportunidad a la consolidación y rendición de la información contable pública. El sector central cuenta con el órgano asesor y de acompañamiento frente al proceso de depuración y sostenibilidad contable de la entidad, el cual debe ser activado para atender y apoyar los procesos que requieren de tratamiento y definición de sus partidas con saldos objeto de depuración, para lo cual se convoca a las entidades agregadas a ser partícipes del accionar de esta instancia, con el objeto de mejorar la razonabilidad de las cifras. La secretaría de Educación del Departamento, cuenta con un sistema contable y financiero denominado ADFI, el cual ha permitido que las Instituciones educativas registren sus operaciones de una forma fácil y oportuna, por tener una parametrización que se ajusta al Manual de políticas contables y al quehacer de las instituciones educativas. La Asamblea de Boyacá, tiene la disposición de Mejorar el proceso contable de la entidad e involucrar a todos los actores, para el año 2026 se adquirió un sistema financiero integral que permita el flujo de información y el mejoramiento, actualización, y capacitación de todos los procesos y procedimientos
2.2	DEBILIDADES	El sector central, presenta dificultad en el proceso gestión documental, para lo cual debe dar aplicación a las tablas de retención documental vigente y a la transferencia de archivos con cumplimiento de lo regulado por el Archivo General de la Nación. El sector central del Departamento de Boyacá, al contar con una alta rotación de personal de prestación de servicios, al surgir dicho evento genera interrupción en la continuidad de las actividades del proceso contable, afectando el aseguramiento de los procesos en cada una de las áreas proveedoras de información financiera. La Secretaría de Educación del Departamento requiere de capacitación en las actualizaciones del Manual de Políticas contables del departamento. Existe un riesgo de información, ya que el sistema con el que cuenta la Gobernación para consolidar la información de las instituciones educativas es propiedad de un proveedor de servicio, no se adquirió como tal el programa, se paga anualmente un arriendo y un soporte, situación que pone en riesgo la disponibilidad y el acceso a la información de todas las instituciones educativas. La rotación constante del Contador Público de la entidad, genera riesgos en el proceso contable de la entidad, en la continuidad de procesos de depuración, flujo de información, y demoras en la Presentación y Publicación de Estados Financieros.
2.3	AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	El sector Central, como entidad agregadora de la Asamblea del Departamento y de las 255 instituciones educativas del departamento, suscribieron en el año 2024 y en el 2025 planes de acciones, para mejorar en los procesos que fueron observados producto de la Evaluación de Control Interno Contable, donde la Secretaría de Educación y el Sector Central, cerraron satisfactoriamente las observaciones formuladas en el plan de acción, sin embargo, la Asamblea de Boyacá, se encuentra en proceso de actualización de sus procedimientos, guías y formatos para contribuir al mejoramiento y avance del proceso contable, a pesar de los resultados de años anteriores, cuenta con el compromiso para continuar mejorando significativamente. Se ha podido avanzar en la parametrización amigable del sistema ADFI, que permite a cada institución educativa registrar de una mejor forma sus operaciones. La Asamblea de Boyacá adquirió software de Información financiera integral que permite generar información oportuna.
2.4	RECOMENDACIONES	El sector central, cumple su rol de consolidador y transmisor de la información financiera contable pública, sin embargo las entidades agregadas y las sectoriales del Departamento de Boyacá deben garantizar la confiabilidad de las cifras, dado que son las originadoras de los hechos económicos, por ende, deben garantizar que en su registro, reconocimiento y medición cumplan con las características cuantitativas y cualificativas en cumplimiento de lo regulado en el marco normativo para entidades de gobierno. Se exhorta a la Secretaría de Educación, con sus 255 instituciones educativas del departamento, propender y dar continuidad al proceso de capacitación de sus funcionarios con el fin de garantizar la idoneidad y pertinencia de las cifras que representan fielmente los hechos económicos. Es importante, que tanto el sector central, como sus agregadas, atienda los procesos de depuración de partidas y sostenibilidad contable, manejo y administración de los inventarios, manejo y tratamiento contable de obligaciones contingentes, revisión de vidas útiles, metodologías y tratamiento del deterioro de valor de los activos, aseguramiento de la información financiera a través de TIC para prevención de ataques cibernéticos. El sector central y sus agregadas, deben identificar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción y fraude, a su vez deben considerar políticas y/o estrategias de prevención mediante mecanismo de lucha contra la corrupción, a través del SARLAFT SAGRILAFT, a través del sistema de administración y prevención de riesgos, contra el lavado de dinero, o el manejo recursos para financiamiento de actividades terroristas. Se recomienda realizar visitas e

		inspecciones a algunas instituciones educativas para verificar el estado de los activos para verificar indicios de deterioro y bajas de activos. Se recomienda realizar capacitaciones de manejo del sistema y políticas contables a los encargados del manejo del sistema en cada institución educativa.

FUENTE: Contaduría General de Nación

Teniendo en cuenta la evaluación de control interno contable de la vigencia 2025, en el cual aparecen 14 códigos con calificación parcialmente, que equivalen al 45.16% del total de la evaluación y los restantes 17 ítems con calificación SI para un total de 34 códigos, lo que requiere que se les continue con el seguimiento a fin de que los Estados Financieros reflejen la realidad de la Gobernación de Boyacá, así:

Tabla 57 SEGUIMENTO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4,01
1.1.1	.....1. ¿LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?	SI	El Departamento de Boyacá, actualizó el Manual de Políticas Contables, en el documento con código A-GF-GI-M-005 Versión 5, de fecha de actualización 21 de noviembre de 2025, cuyo versión obedeció a lo contemplado en la Resolución 139 de Julio 05 de 2025 expedida por la Contaduría General de la Nación, en lo referente a la incorporación de los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, cuya actualización fue aprobada mediante Resolución 171 de Diciembre 24 de 2025 del Departamento de Boyacá. La Secretaría de Educación de Boyacá con el fin de unificar criterios en el manejo de la información contable de sus 255 fondos de servicios educativos, cuenta con el Sistema integrado de información administrativa y financiera ADFI, que permite consolidar la información financiera y reportarla al ente central. De igual forma se acoge al Manual de políticas contables del Departamento como entidad agregada. Por medio de la Resolución No. 145 del 11 de abril de 2023, la Asamblea de Boyacá, adoptó el Manual de Políticas Contables en la Asamblea de Boyacá, y se dictan otras disposiciones como entidad agregada, de conformidad con el artículo primero y el parágrafo primero de la resolución citada. A través de la Resolución No.600 de octubre 12 de 2023, se adopta Manual de Procesos y procedimientos contables para la Asamblea de Boyacá.	0,93	
1.1.2	.....1.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?	PARCIALMENTE	Las políticas contables se encuentran para su acceso y consulta en la plataforma tecnológica ISOLUCION, ubicada en la sede electrónica de la Gobernación de Boyacá, para conocimiento de los actores del proceso contable de la entidad, junto con sus agregadas, a su vez, mediante la Circular C-2026-000098-CIR de febrero 05 de 2026, se socializó y se adjuntó el documento debidamente aprobado para consulta de las partes interesadas. La Secretaría de Educación del Departamento mediante comunicado del día 29 de abril de 2025, socializó la actualización del Manual de políticas contables con sus 255 instituciones educativas lo que se videncia con 535 visualizaciones de la publicación, sin embargo, la última actualización del sector central fue en noviembre de 2025, se sugiere realizar retroalimentación de estas actualizaciones. Las políticas contables de la entidad agregadora, Asamblea de Boyacá, se encuentran en el sistema integrado de gestión ISOLUCION,		
1.1.3	.....1.2. ¿LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE?	SI	El Departamento de Boyacá, de acuerdo a los lineamientos y directrices define los procedimientos y formatos específicos, para asegurar el proceso contable de la entidad, cuyos instrumentos se encuentran debidamente documentados en la plataforma ISOLUCION, los mismos son versionados en atención a los cambios normativos emanados por la Contaduría General de la Nación. La Secretaría de Educación del Departamento aplica los procedimientos establecidos en el sector central y la información contable se maneja de acuerdo a las políticas contables aprobadas. La Asamblea de Boyacá, cuenta con una manual de política contable, pero requiere la adopción de la actualización del manual de política de la Gobernación de Boyacá		
1.1.4	.....1.3. ¿LAS POLÍTICAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?	SI	Las políticas contables definen el marco normativo aplicable en la entidad y sus agregadas, suministrando información relevante para su aplicación y ejecución en cada una de las etapas del proceso contable, acciones que integran su naturaleza e institucionalidad. Así mismo la información contable pública se ha venido reportando trimestralmente a través del aplicativo Chip a la CGN con transmisión Aceptada, lo que evidencia que se están utilizando adecuadamente las cuentas y subcuentas de acuerdo a la versión más actualizada del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. La Asamblea de Boyacá, como entidad agregada al Departamento de Boyacá, le es aplicable el Manual de Políticas Contables, sin embargo, la Asamblea, cuenta con procedimientos y formatos donde se describe las diferentes formas de desarrollar las actividades de la gestión contable. Sin embargo, los procedimientos, formatos e instrumentos de gestión del proceso contable, deben ser revisados con el fin actualizar, implementar y/o ajustar los mismos, con el objeto de blindar cada una de las actividades que se ejecutan, por ende, deben ser documentados y y socializados con los actores o intervinientes; acciones que contribuirán al fortalecimiento del proceso contable.		

1.1.5	.....1.4. ¿LAS POLÍTICAS CONTABLES PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	SI	Las políticas contables de la entidad, enmarcan las características de la información, siendo relevante, la representación fiel de los hechos económicos, a través de su identificación, registro, medición y revelación, logrando la calidad y oportunidad de la información financiera, para satisfacer las necesidades de los usuarios de la información y/o partes interesadas. Esto se evidencia además con la opinión limpia sobre los Estados Financieros que emite el ente de control del Departamento en la Auditoría Regular realizada. Las políticas contables establecidas le permiten a la Secretaría de Educación remitir la información financiera consolidada y consistente de tal forma que se incorpore a la información del Departamento y se presente de forma uniforme. El Manual de Políticas Contables A-GF-GI-M-005 abarca todos los criterios para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la entidad		
1.1.6	.....2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ¿ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA?	SI	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realiza seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, para lo cual tiene documentando el formato V-EG-F-053 Versión 0, denominado Matriz de Seguimiento Auditorías, de naturaleza interna y para auditorías de naturaleza externa, cuenta con el Formato V-EG-F-022 Versión 0, denominado Seguimiento al Plan de Mejoramiento Entes de Control, instrumentos que permiten llevar un control y seguimiento en tiempo real, La Secretaria de Educación de Boyacá cumplió al 100por ciento el Plan de Acción producto de las observaciones generadas como resultado de la evaluación de control interno contable vigencia 2024, adelantado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Boyacá, el cual fue cerrado satisfactoriamente. Para la vigencia 2025, la Asamblea de Boyacá presenta informe de seguimiento a planes de mejoramiento con corte semestral, en el cual indica, que no presenta planes de mejoramiento producto de auditorías internas. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Producto de la Evaluación de Control Interno Contable de la Vigencia 2024, se suscribió Plan de Acción, el cual a diciembre se cumplió en un 60 por ciento	1,00	
1.1.7	.....2.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES?	SI	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realiza inducción y socialización de los formatos descritos en el ítem anterior, los cuales son aplicables por los auditores designados para el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los procesos de auditoría interna y externa. La secretaria de Educación de Boyacá tiene en cuenta los procesos y formatos que se encuentran en Isolución, cada responsable del seguimiento los utiliza para garantizar el cumplimiento de los planes de mejoramiento. La Asamblea de Boyacá, continúa con el compromiso para llevar a cabo el cumplimiento de las acciones de mejora, contempladas en el plan de acción, producto de las observaciones generadas en la aplicación de la Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia anterior.		
1.1.8	.....2.2. ¿SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO?	SI	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realiza seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas, identificando su avance y cumplimiento de conformidad con lo programado en el Plan Anual de Auditorías. La suscripción de planes de mejoramiento e informes finales de seguimiento a los mismos, de procesos auditores de la Contraloría General de la República, se reportan periódicamente en la plataforma SIRECI de ésta misma entidad, a su vez, se hace seguimiento a los planes de mejoramiento con otros entes de control, verificando su avance y cumplimiento, tales como Superintendencia de Salud, Instituto Nacional de Salud, Procuraduría General de la Nación, y de auditorías del Departamento Nacional de Planeación. La Asamblea de Boyacá, cuenta con el formato RG-TH-45 Versión 3 de fecha 15 07 2023, denominado Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento, herramienta que presenta el estado de los planes de mejoramiento. Así mismo, de conformidad con las observaciones generadas por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Boyacá, producto de la Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2024, la entidad agregada suscribió plan de acción, actividades que están en proceso de revisión de procedimientos y formatos, con el objeto de actualizar e implementar los mismos, acciones que permitirán mejorar significativamente.		
1.1.9	.....3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ¿ETC.) TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA?	SI	La entidad cuenta con un manual de políticas contables que define los criterios para ejecutar el proceso contable, así mismo, contempla la preparación y programación para el reporte de la información contable, por parte de las entidades agregadas al Departamento, tales como: Asamblea del Departamento y la Secretaría de Educación para sus 255 instituciones educativas, con el objeto de consolidar y rendir con oportunidad las respectivas categorías en el aplicativo Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP de la Contaduría General de la Nación. Por su parte la Secretaría de Educación al contar con el Sistema ADFI ha facilitado el flujo de información de los 255 fondos, contando con procesos claros en el programa que permite un mejor reporte al sector central. La Asamblea de Boyacá, cuenta con un sistema contable FLASH donde se registra la información	1,00	
1.1.10	.....3.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	SI	El sector central del Departamento de Boyacá, tanto como el Manual de Políticas Contables, como los procedimientos, guías, instructivos y formatos son de consulta en la plataforma ISOLUCION para los actores del proceso contable junto con sus agregadas, quien adoptaron el manual para su cumplimiento y aplicación, así mismo deben atender al cumplimiento de los cronogramas internos y externos, para su respectiva consolidación y rendición. La Secretaría de Educación está en contacto directo con sus instituciones educativas brindando soluciones oportunas al manejo del sistema y reporte de la información. Teniendo en cuenta que hay una rotación constante del personal involucrado en el proceso contable se requiere una permanente capacitación del proceso contable		

1.1.11	.....3.2. ¿SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA AL ÁREA CONTABLE?	SI	Las entidades agregadas al Departamento de Boyacá, cuentan con los respectivos manuales, instructivos, procedimientos y formatos internos, que permiten dar aplicación y alcance a las áreas que origina los hechos económicos, por parte de los responsables directos del proceso contable en la entidad, con el objeto de integrar los movimientos en tiempo real a los cierres. Se requiere actualización de los formatos internos que sustenten las operaciones		
1.1.12	.....3.3. ¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS QUE FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA?	SI	Las entidades agregadas al Departamento de Boyacá, cuentan con los respectivos manuales, instructivos, procedimientos y formatos internos, que permiten dar aplicación y alcance a las áreas que origina los hechos económicos y por los responsables directos del proceso contable en la entidad. A su vez el sistema manejado por la Secretaría de Educación cuenta con procesos claros de cada módulo presupuesto, contabilidad, tesorería lo que permite a cada fondo manejar claramente la información a reportar, conceptos a afectar y documentos a utilizar. Se requiere actualización de los formatos internos que sustenten las operaciones financieras		
1.1.13	.....4. ¿SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?	PARCIALMENTE	El Departamento de Boyacá, cuenta con el procedimiento A-AD-SA-P-004 Versión 2, denominado Administración de Inventarios individuales de los bienes muebles, enseres y equipos de cómputo, a su vez se encuentra asociado Al Manual para el manejo y control administrativo de los bienes del Departamento de Boyacá, con código A-AD-SA-M-001, herramientas que son utilizadas en la gestión contable de la entidad. A su vez, la secretaria de Educación tiene en su sistema el reporte de Activos fijos reconocidos de acuerdo a las políticas contables, bienes de consumo útiles, papelería, aseo y bienes de control que son indispensables para la prestación del servicio educativo y se debe tener control de ellos como por ejemplo los pupitres. La Asamblea de Boyacá, está en el proceso de actualización del SFTWARE	0,60	
1.1.14	.....4.1. ¿SE HA SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	PARCIALMENTE	La entidad dispone de la plataforma tecnológica de Gestión de Calidad, ISOLUCIÓN, cuyo vinculo de acceso está en la sede electrónica institucional del Departamento, para consultar los instrumentos en tiempo real, los cuales son objeto de actualización cuando surgen cambios en el marco normativo por parte de la CGN, aplicado a las entidades de gobierno. El sistema ADFI, cuenta con procesos de fácil entendimiento para ser registrados los bienes de acuerdo a las políticas establecidas. Se está capacitando al personal involucrado en el proceso, en el funcionamiento del sistema de información		
1.1.15	.....4.2. ¿SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS?	PARCIALMENTE	La entidad cuenta con los procedimientos documentados A-AD-SA-P-009 denominado Manejo, Control y Seguimiento de los Bienes Inmuebles del Departamento de Boyacá, el cual define las políticas de operación y presenta el anexo, Manual A-AD-SA-M-001, instrumentos que definen las actividades a desarrollar para el control y manejo individual de los bienes de la entidad, en el mismo sentido, a través de la Circular C-2025-001345-CIR de Octubre 20 de 2025 fueron socializadas para conocimiento de los actores de los procesos. La Secretaría de Educación genera reporte del sistema de los bienes individualizados por Institución Educativa. Se está adelantando la toma física del inventario de bienes muebles y propiedad planta y equipo de la entidad por la Oficina de Gestión Documental y de Bienes.		
1.1.16	.....5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES, ¿A FIN DE LOGRAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?	SI	La entidad cuenta con su procedimientos y formatos debidamente documentados, para realizar conciliación de saldos y cruces de información, para lograr una adecuada identificación y registro de información financiera, se cuenta con los procedimientos A-GF-GI-F-033 Formato Acta de Conciliación Operaciones Recíprocas, A-GF-GI-F-034 Formato Actas de Mesas de Trabajo Conciliación Operaciones Recíprocas, procedimiento A-GF-GI-P-012 denominado recursos Sistema General de Regalías y el instructivo A-GF-GI-I-002 denominado Conciliación Bancaria. Formato A-GF-GI-F-055 Relación de Cuentas Bancarias. Los encargados del proceso contable de la Secretaría de Educación del Departamento aplican los procedimientos establecidos por el ente central.	1,00	
1.1.17	.....5.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	SI	La entidad tiene a su disposición y acceso las herramientas para su consulta en la plataforma tecnológica de Gestión de Calidad ISOLUCION, los procedimientos y el instructivo para ser aplicado por los intervinientes en el proceso contable. Por su parte la Secretaría de Educación del Departamento. El sistema ADFI, cuenta con la aplicación o interface de conciliación, tanto bancaria, de movimientos y control de conciliación de operaciones recíprocas en el registro de información de naturaleza de ingreso de recursos transferidos. El Manual de Políticas Contables, está publicado en el aplicativo ISOLUCION disponible en la página web de la Gobernación de Boyacá,		
1.1.18	.....5.2. ¿SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS?	SI	En el proceso de alistamiento de información para cierre, se realiza la verificación y comprobación de saldos, y por ende, la aplicación de cada directriz impartida en los procedimientos e instructivos de la entidad. La Secretaría de Educación, verifica la información reportada por cada una de las instituciones educativas antes de ser remitida al ente central y cuando hay errores procede a informar para que se realicen los ajustes correspondientes y así poder realizar cierre. Las conciliaciones son realizadas por el área contable de manera mensual y algunas al cierre de la vigencia. Los conceptos conciliados mensualmente corresponden a: Conciliaciones Bancarias, amortización de licencias y software, depreciación de propiedad planta y equipo, conciliación de reciprocas con otras Entidades, y de forma anual, se realizan las conciliaciones de pasivos de índole de prestaciones sociales y de descuentos de nómina, sin embargo, dichos procesos requieren de estar documentados para contar con los referentes idóneos que respalden el quehacer contable.		
1.1.19	.....6. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O	PARCIALMENTE	El sistema de información financiera, contable, de tesorería y presupuestal, cuenta con mecanismos de control y de habilitación de permisos para los ejecutores del sistema, en cada uno de sus módulos, con el fin de llevar trazabilidad en tiempo real de los	0,60	

	INSTRUCCIÓN EN QUE SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES (AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE LOS PROCESOS CONTABLES?		registros de los hechos económicos, de sus ajustes y cambios significativos. El sistema Adif contempla para cada institución educativa su usuario y accesos autorizados para el procesamiento de la información por parte del encargado, de tal manera que el sistema sea alimentado por la persona con funciones a su cargo. De conformidad con la parametrización del sistema de información contable pública, que maneja la Asamblea de Boyacá, se identifica el ejecutor del sistema, el cual detalla registro de elaboración, de revisión y de aprobación.		
1.1.20	.....6.1. ¿SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	PARCIALMENTE	Los procedimientos, guías, instructivos y formatos se encuentran a disponibles para su consulta en la plataforma ISOLUCION, para su acceso y consulta por parte de los actores de la gestión contable. El sistema Adif contempla procedimientos específicos por módulo para su manejo adecuado. El Manual de Políticas Contables, está publicado en el aplicativo ISOLUCION, se encuentra disponible en la página web de la Gobernación de Boyacá, para consulta del personal involucrado en el proceso contable, sin embargo, la Asamblea de Boyacá, debe revisar la implementación y/o ajuste de sus procedimientos internos.		
1.1.21	.....6.2. ¿SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN?	PARCIALMENTE	Los instrumentos documentados para la ejecución de los procesos contables, cuenta con una revisión, previa y posterior por parte de los líderes y responsables de cada uno de los procesos, con el fin de asegurar la calidad de la información. Los responsables de la Secretaría de Educación de consolidar la información, verifican que cada fondo educativo remita información real y oportuna. si se presentan errores se procede a realizar los ajustes en el siguiente período. De conformidad con las actividades desarrolladas y atribuibles al proceso contable, el personal asignado y disponible, realiza las labores de tesorería, de contabilidad, almacén, funciones que están definidas, junto con las actividades que realizan las profesionales externos de apoyo, bajo la coordinación del profesional contable externo, que ejerce la asesoría como contador, sin embargo, la principal incidencia para no garantizar la calidad de la información y el respaldo de la misma, está afectada por la alta rotación del personal involucrado en el proceso contable.		
1.1.22	.....7. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	SI	El Departamento de Boyacá, en el Manual de Políticas Contables, establece el cronograma interno de entrega de información por parte de las agregadas, con el objeto de que el sector central consolide con anticipación y luego proceda a la rendición a través de la transmisión en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación, en las fechas de corte y fechas límite de establecidas. El Manual de Políticas Contables del Departamento de Boyacá, define para el sector central y para sus agregadas, las fechas de corte y fechas límites de presentación de la información contable pública con corte trimestral, cuya preparación y reporte al sector central para su consolidación y transmisión, debe ser remitida con anticipación, para su presentación oportuna.	1,00	
1.1.23	.....7.1. ¿SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	SI	El cronograma de rendición se encuentra establecido tanto en el Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad, de conformidad con la regulación contemplada en la Resolución 138 como en la sede electrónica institucional de la Contaduría General de la Nación, cuyo cambio normativo lo reguló la Resolución No. 139 de julio 05 de 2025 - CGN. La Secretaría de Educación como entidad agregada, da cumplimiento con anterioridad de la entrega oportuna de la información al ente central para que pueda ser verificada y consolidada para su respectivo reporte. El Manual de Políticas Contables del Departamento de Boyacá, define para el sector central y para sus agregadas, las fechas de corte y fechas límites de presentación de la información contable pública con corte trimestral, cuya preparación y reporte al sector central para su consolidación y transmisión, debe ser remitida con anticipación, para su presentación oportuna. El Manual de Políticas Contables se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION, en la sede electrónica de la Gobernación de Boyacá, herramienta a través de la cual se socializan los documentos formalizados, donde los intervinientes en el proceso contable acceden a su consulta.		
1.1.24	.....7.2. ¿SE CUMPLE CON LA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN?	SI	Se da cumplimiento con la directriz establecida para la presentación de la información contable, contemplada en el Manual de Políticas Contables, donde las entidades agregadas remiten los formularios debidamente validados de la Categoría Información Contable Pública - Convergencia, para ser consolidada y transmitida por el Sector Central, en cabeza de la Subdirección de Contabilidad del Departamento de Boyacá, en cumplimiento del cronograma que está alineado con el fechas de rendición establecidas por la CGN. La Asamblea de Boyacá, remite de la información, y con corte trimestral la información contable pública, a la Subdirección Técnica de Contabilidad para su consolidación y transmisión dentro de las fechas límites establecidas en el Manual de Políticas Contables y en cumplimiento de la programación indicada por la Contaduría General de la Nación.		
1.1.25	.....8. ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO, EN FORMA ADECUADA, ¿EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS?	SI	La entidad cuenta con procedimientos para Cierre Presupuestal y de Tesorería A-GF-GI-M-001; a su vez, el sistema contable, financiero y presupuestal, cuenta con la parametrización de cierres mensuales y cierre final o anual. Así mismo, el Manual de Políticas Contables, cuenta con la sección numeral 2. denominada Política Contable para Cierres Contables, la define los responsables, los plazos de cierre trimestral y las revisiones periódicas y la programación de rendición. La Secretaría de Educación del Departamento le da cumplimiento al cronograma de cierres establecidos por el ente central, a su vez solicita el reporte de las 255 instituciones educativas para que realicen los cierres a tiempo y puedan generar la información de acuerdo al tiempo de labores del sector educativo, ya que es diferente al del sector central. La Gobernación de Boyacá Realizo mesas de Trabajo con el personal involucrado del proceso contable de la Asamblea de Boyacá	1,00	

1.1.26	.....8.1. ¿SE SOCIALIZA ESTE PROCEDIMIENTO CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	SI	El personal de apoyo a la gestión y los funcionarios de planta de la Subdirección de Contabilidad, conocen los lineamientos y o directrices para el proceso de cierre, para lo cual efectúan acciones de revisión, conciliación de saldos y ajustes necesarios con las sectoriales que generan hechos económicos. Los responsables del sistema ADFI, verifican que la información reportada por las instituciones no contenga errores al momento del cierre, de lo contrario realizan solicitud de reversión de comprobante y nuevo registro de las operaciones. La Asamblea de Boyacá, debe considerar un procedimiento interno, para el proceso de cierre, o concurrir a la actualización del Manual de Políticas Contables, incluyendo el capítulo de cierre integral y la lista de chequeo de las actividades que se deben realizar previo al cierre, procedimiento que debe estar documentado y socializado con el personal involucrado en el proceso contable.		
1.1.27	.....8.2. ¿SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO?	SI	El Sector Central del Departamento de Boyacá, realiza los cierres de forma sistemática dada la parametrización y/o homologación de las partidas contables en el sistema financiero, así mismo, este proceso implica la revisión periódica de los registros contables de acuerdo a su origen, la conciliación de saldos y el ajuste de saldos, su consolidación y la respectiva emisión de los estados financieros, para dar cumplimiento a la transmisión en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación. La Asamblea de Boyacá, debe implementar un procedimiento interno, con el fin de dar cumplimiento a las actividades previas al cierre integral, dado que el Manual de Políticas contables del Departamento de Boyacá, tampoco cuenta con la directriz de cierres, sin embargo, a pesar de no estar documentado se realiza el cierre de forma sistemática.		
1.1.28	.....9. ¿LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS?	PARCIALMENTE	El Departamento de Boyacá, cuenta con el procedimiento A-AD-SA-P-004, Versión 2, el cual fue actualizado en septiembre 01 de 2025, denominado Administración de los Inventarios individuales de los bienes muebles, enseres y equipos de cómputo. En el mismo sentido, se encuentra asociado el Manual para el manejo y control administrativo de los bienes del Departamento de Boyacá. La Secretaría de Educación de Boyacá para dar cumplimiento al procedimiento establecido, realiza visitas a las instituciones educativas muestra aleatoria con el fin de verificar la existencia y estado de los activos que se encuentran en el inventario, esto ha permitido determinar la veracidad de la información contable. La Asamblea de Boyacá, requiere revisar y actualizar su procesos y procedimientos.	0,60	
1.1.29	.....9.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	PARCIALMENTE	Los procedimientos se encuentran disponibles en la plataforma ISOLUCION, para su acceso y consulta para el personal involucrado en el proceso contable. La Secretaría de Educación informa sobre los procesos a las instituciones educativas a cargo.		
1.1.30	.....9.2. ¿SE CUMPLE CON ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS?	PARCIALMENTE	El sector central da aplicación a sus procedimientos, y cuenta con el Manual de Políticas Contables, el cual incluye los lineamientos para los elementos de activos y pasivos de la entidad, y la sección 14, denominada 14. Política Contable de Inventarios, Sin embargo, es importante, concentrar acciones para verificar la medición posterior de algunas partidas de propiedad, planta y equipo.		
1.1.31	.....10. SE TIENEN ESTABLECIDAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS SOBRE ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?	PARCIALMENTE	La entidad aplica las políticas contables relacionando cada uno de los hechos económicos que se originan en cada sectorial o dependencia, de acuerdo a la información contable que se reporta y procesa en tiempo real. La Secretaría de Educación de Boyacá a través de la plataforma ADFI, garantiza que la información reportada por las 255 instituciones educativas sea registrada y reportada de la mejor manera, ya que el sistema está parametrizado de forma que se minimice el riesgo de un mal registro o un mal concepto. La Asamblea de Boyacá, debe implementar procedimientos que definan el alcance y los insumos entregables por parte de cada una de las dependencias que interactúan y generan información contable, donde las mismas, informan o comunican los sucesos, con el objeto de garantizar la precisión e integridad de cada uno de los registros de los hechos económicos que se origina en dichas dependencias.	0,60	
1.1.32	.....10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	PARCIALMENTE	El Departamento de Boyacá, mediante el Decreto 1782 de junio 27 de 2007, creó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, órgano que actúa como instancia asesora y de decisión frente al proceso de depuración de la información contable, fundamentada en gestiones administrativas necesarias que conducen a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable, que produce información razonable y oportuna. Los encargados de consolidar y verificar la información reportada en el sistema ADFI por todos los usuarios reportan cualquier error a tiempo para ser corregido en la misma vigencia o en el siguiente período. La Asamblea de Boyacá requiere actualizar sus procedimientos y formatos		
1.1.33	.....10.2. ¿EXISTEN MECANISMOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS?	PARCIALMENTE	Mediante sesiones el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, realiza los Comités Técnicos de Saneamiento Contable, escenario en el que se presenta las fichas técnicas que sustentan las partidas objeto de depuración contable de procesos, suscribiendo actas debidamente aprobadas, las cuales sustentan su aprobación, y el tratamiento contable dado a las partidas requeridas por las sectoriales líderes y responsables de los procesos administrativos y objeto de depuración o baja. La Secretaría de Educación de Boyacá a través de la plataforma ADFI, garantiza que la información reportada por las 255 instituciones educativas sea registrada y reportada de la mejor manera, ya que el sistema está parametrizado de forma que se minimice el riesgo de un mal registro o un mal concepto. La Asamblea de Boyacá, no refiere trazabilidad documental que permita ver el accionar y el cumplimiento de las funciones del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública de la entidad, frente al proceso de depuración y sostenibilidad contable; la activación del Comité es de gran		

			importancia para llevar a cabo los procesos de mejoramiento en la calidad y consistencia de la información contable pública.		
1.1.34	.....10.3. ¿EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS PERIÓDICAMENTE?	PARCIALMENTE	El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, como instancia decisoria, verifican y aprueban los procesos objeto de depuración, presentados por las sectoriales que requieren sanear ciertas partidas contables, generando acto administrativo, Resolución, autorizando el tratamiento contable respectivo. Los encargados de consolidar y verificar la información reportada en el sistema ADFI por todos los usuarios, lo hacen mensualmente y reportan cualquier novedad al encargado para su respectiva corrección. La Asamblea de Boyacá, no refiere acciones de análisis de partidas conciliatorias, de depuración y seguimiento de las misma, como tampoco la periodicidad con la que se deben realizar. Por ende, dicha actividad en la vigencia 2024, no cuenta con actas de reuniones ordinarias o extraordinarias, con evidencias de mesas de trabajo realizadas y de temas tratados, consultados o resueltos en dicha instancia.		

Fuente: Oficina Control Interno – Gobernación de Boyacá – Información complementaria.

La Oficina de control interno en el seguimiento que realizó, reflejan irregularidades en calidad y eficiencia ya que obtiene productos de alto riesgo institucional en cada uno de los controles evaluados, dándose resultados en deficiencia e incumplimiento en los procesos financieros, donde probablemente se exponen a un alto nivel de materialización de riesgos en ausencia de seguimientos permanentes, medidas y acciones concretas.

Por lo anterior, es necesario continuar con la mejora en sus procesos y en el seguimiento a los planes de mejoramiento objeto de las auditorías realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, para que sea más efectivo y eficaz a fin de que las inconsistencias presentadas en la Situación financiera se ajusten a la realidad de la Gobernación de Boyacá; también es importante, contar con las actuaciones realizadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Por otra parte, se deben tener en cuenta los planes de mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por la Contraloría General de Boyacá, en cuanto el seguimiento y control para que los riesgos planteados se disminuyan y logren llegar a una solución efectiva.

CRITERIO. Ante las deficiencias reseñadas anteriormente, se identifica una posible vulneración de:

Los literales a), d), e), y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 [*por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones*].

También, a lo definido en los numerales 1, 3 y 41 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019 [*por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario]*.

Además, de acuerdo con el artículo 3 y el literal a., del artículo 5 de la ley 1712 de 2014 [*por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*], las entidades públicas deben garantizar el derecho de acceso a la información como parte del proceso de gestión de la información pública.

Adicionalmente, se da incumplimiento al Decreto 035 del 28 de enero del 2021, por medio del cual se reglamenta y modifica el Decreto de aprobación del MIPG y por tal el Sistema de Administración de Riesgos de la Gobernación de Boyacá.

El incumplimiento de la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de julio de 2008 y Ley 1474 de 2011.
CAUSA: Inefectividad en el seguimiento de riesgos y aplicación de controles o no aplicación de los mismos para ejecutar el proceso financiero de una forma efectiva, ausencia de medidas tendientes a la verificación periódica del cumplimiento de las políticas contables adoptadas por la entidad, así como ineficacia del comité de coordinación de control interno de la Entidad Territorial.

EFECTO: Información financiera con deficiencias e inobservancia de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, como autoridad reguladora de la contabilidad pública.

Analizada y los documentos anexos a la respuesta a esta observación, no desvirtúan la inconsistencia y envista a que la Oficina Asesora de Control Interno no ha realizado actuación alguna que logre establecer mejora en los procesos financieros de la Entidad, se confirma en todas sus partes la observación y se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

12.2. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS

12.2.1. PRESUPUESTO

Gestión de legalidad

Manual de programación presupuestal

Se verifico que la Gobernación de Boyacá, cuenta con el Manual de Programación Presupuestal, documento que define los lineamientos a tener en cuenta para la elaboración y Programación del Presupuesto para la vigencia fiscal 2025.

Cumplimiento programación presupuestal

En cumplimiento a la programación presupuestal, el sujeto auditado presentó Ordenanza No. 038 del 20 de Noviembre de 2024 expedida por la Asamblea del Departamento, mediante la cual se aprueba el "Presupuesto de Rentas, Gastos y recursos de capital del Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones", posteriormente se verifico el Decreto de liquidación No. 1200 de fecha 27 de diciembre de 2024 por valor de $1.748.662.757.339: este decreto es consistente con la ordenanza de aprobación

Estatuto Orgánico de Presupuesto

Se verifico que la Gobernación de Boyacá cuenta con un Estatuto orgánico de presupuesto expedido por la Asamblea de Boyacá, mediante Ordenanza No. 023 del 12 de diciembre de 2023, documento que a la fecha está vigente

Presupuesto Gobernación de Boyacá

Presupuesto definitivo

Mediante los actos administrativos presentados, se verifico que la GOBERNACIÓN DE BOYACA, para la vigencia fiscal 2025, a través del Decreto No. 1200 del 27 de diciembre de 2024, fue liquidado por la suma de $**1.748.662.757.339**, con adiciones por $**1.414.022.027.463**, reducciones por $**91.886.752.235**, para un presupuesto definitivo de $**3.021.994.584.117**, también se evidenciaron traslados por valor de $**849.771.129.145**

Ejecución presupuestal de ingresos

De acuerdo a la información presentada en la Plataforma SIA en el formato FO6 AGR - Ejecución presupuestal de ingresos se evidencia un presupuesto definitivo de $**3.021.994.584.117** con un valor recaudado de $**2.220.461.843.932**, representando un recaudo del **73.48**% del valor presupuestado, pormenorizado en los siguientes sectores así:

Análisis detallado del recaudo de ingresos comparado con el presupuesto definitivo.

Tabla 58 PARTICIPACION DE RECAUDOS VIGENCIA 2025

Código	Nombre Rubro	Definitivo	Participación %	Recaudos	Por Recaudar	% Por Recaudar
1	INGRESOS	3,021,994,584,117	100.00%	2,220,461,843,933	801,532,740,184	26.52%
1 1	INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS	512,609,187,526	16.96%	463,410,525,259	49,198,662,267	9.60%
1 1 10	IMPUESTOS INDIRECTOS	442,624,481,796	14.65%	411,082,807,501	31,541,674,295	7.13%
1 1 15	IMPUESTOS DIRECTOS	69,984,705,730	2.32%	52,327,717,759	17,656,987,972	25.23%
1 2	INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS	2,009,503,590,932	66.50%	1,382,814,172,071	626,689,418,861	31.19%
1 2 10	TRANSFERENCIAS SGP	1,202,987,474,445	39.81%	1,202,987,474,445	-	0.00%
1 2 11	TRANSFERENCIAS SGR	415,573,169,073	13.75%	5,054,229	415,568,114,843	100.00%
1 2 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	91,013,327,794	3.01%	89,030,301,562	1,983,026,232	2.18%
1 2 15	OTROS NO TRIBUTARIOS - EXPLOTACION	34,893,498,231	1.15%	34,251,299,500	642,198,731	1.84%
1 2 20	APORTES; CONVENIOS Y CON.	248,185,163,090	8.21%	26,397,463,521	221,787,699,569	89.36%
1 2 30	CONTRIBUCIONES	5,500,000,000	0.18%	5,359,733,953	140,266,047	2.55%
1 2 40	MULTAS Y SANCIONES	11,347,958,299	0.38%	24,777,580,060	(13,429,621,761)	-118.34%
1 2 45	TASAS	3,000,000	0.00%	5,264,801	(2,264,801)	-75.49%
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	499,881,805,659	16.54%	374,237,146,602	125,644,659,056	25.13%
1 3 10	RECURSOS DEL BALANCE	226,380,927,869	7.49%	215,751,379,767	10,629,548,103	4.70%
1 3 15	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	169,502,380,465	5.61%	81,146,647,688	88,355,732,777	52.13%
1 3 25	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5,254,298,448	0.17%	5,685,504,387	(431,205,939)	-8.21%
1 3 30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,990,168,342	0.23%	6,398,187,035	591,981,307	8.47%
1 3 35	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,541,209,445	0.08%	3,237,862,007	(696,652,562)	-27.41%
1 3 50	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	89,212,821,089	2.95%	62,017,565,718	27,195,255,371	30.48%

FUENTE: Ejecución de ingresos vigencia 2025

Participación de recaudos

Ingresos corrientes Tributarios y no Tributarios

La Administración Central para la vigencia 2025, en su recaudo acumulado, refleja un valor de $**2.226.214.360.481**, que representa el 26.52% menos del presupuesto definitivo, ya que su presupuesto definitivo estimado fue de $**3,021,994,584,117,** es decir $**801,532,740,184**, menos de lo presupuestado esto debido al comportamiento representativo de los ingresos no tributarios que disminuyeron en un **9.65%** del presupuesto definitivo.

Así mismo, se verifica que los ingresos corrientes no tributarios obtuvieron un decremento del **31.19%,** los cuales como se evidencia en el cuadro anterior.

Recursos de capital

Se destaca dentro del análisis de los ingresos la participación de los recursos de capital los cuales registran un incremento del 25.13% en el recaudo, se verifica que este valor es representativo comparado con el presupuesto definitivo ya que tenía un presupuesto definitivo por un valor de **$499,881,805,659** y su recaudo acumulado fue por **$374,237,146,602,** es decir se recaudaron **$125,644,659,056** menos**,** representado en recursos del crédito interno por valor de $**88,355,732,777**.

Análisis comparativo recaudo vigencias 2025 y 2024

Se verifica el comportamiento de los recaudos de la vigencia 2025 por valor acumulado de $2.220.461.843.933, frente al valor acumulado en recaudo de la vigencia 2024 por $2.226.214.360.461, así:

Tabla 59 COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIAS 2025/2024

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECAUDO ACUMULADO 2025	RECAUDO ACUMULADO 2024	VARIACIÓN % EN EJECUCIÓN 2025-2024	DIFERENCIA
1	**INGRESOS**	**2,220,461,843,933**	**2,226,214,360,481**	**-0.26%**	**(5,752,516,548)**
1 1	**INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS**	**463,410,525,259**	**405,059,765,685**	**12.59%**	**58,350,759,574**
1 1 10	IMPUESTOS INDIRECTOS	411,082,807,501	358,215,387,830	12.86%	52,867,419,671
1 1 15	IMPUESTOS DIRECTOS	52,327,717,759	46,844,377,855	10.48%	5,483,339,904
1 2	**INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS**	**1,382,814,172,071**	**1,562,200,739,970**	**-12.97%**	**(179,386,567,899)**
1 2 10	TRANSFERENCIAS SGP	1,202,987,474,445	1,037,404,513,596	13.76%	165,582,960,849
1 2 11	TRANSFERENCIAS SGR	5,054,229	276,372,622,240	-5468045.76%	(276,367,568,011)
1 2 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	89,030,301,562	59,498,699,707	33.17%	29,531,601,855
1 2 15	OTROS NO TRIBUTARIOS - EXPLOTACION	34,251,299,500	166,896,181,270	-387.27%	(132,644,881,770)
1 2 20	APORTES; CONVENIOS Y CON.	26,397,463,521	8,978,522,690	65.99%	17,418,940,831
1 2 30	CONTRIBUCIONES	5,359,733,953	4,928,185,064	8.05%	431,548,889
1 2 35	INTERESES	-	2,962,113,476	0.00%	(2,962,113,476)
1 2 40	MULTAS Y SANCIONES	24,777,580,060	5,159,901,927	79.18%	19,617,678,133
1 2 45	TASAS	5,264,801	-	100.00%	5,264,801
1 3	**INGRESOS DE CAPITAL**	**374,237,146,602**	**258,953,854,826**	**30.80%**	**115,283,291,776**
1 3 10	RECURSOS DEL BALANCE	215,751,379,767	228,876,193,596	-6.08%	(13,124,813,829)
1 3 15	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	81,146,647,688	-	100.00%	81,146,647,688
1 3 25	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5,685,504,387	12,987,724,876	-128.44%	(7,302,220,489)
1 3 30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,398,187,035	9,507,083,487	-48.59%	(3,108,896,452)
1 3 35	EXCEDENTES FINANCIEROS	3,237,862,007	-	100.00%	3,237,862,007
1 3 50	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	62,017,565,718	7,582,852,867	87.77%	54,434,712,851

FUENTE: Ejecución de ingresos vigencia 2025 y 2024

Tomando como base las ejecuciones de ingresos de las vigencias 2024 y 2023 de la Administración Central, se evidencia un decrecimiento del 0.26% respecto del total de los ingresos vigencia 2025 en comparación con la vigencia 2024, es decir un valor -$**5,752,516,548**.

Respecto a los **ingresos corrientes - tributarios**, estos se incrementaron de la vigencia 2025 con respecto a la vigencia 2024, por $**58,350,759,574,** representan un incremento para 2025 del **12.59%**; situación contraria ocurrió con los ingresos no

tributarios, donde estos se redujeron en $**179,386,567,899** el recaudo para el año 2025 fue de $**1,382,814,172,071** y para 2024 el recaudo fue de $**1,562,200,739,970**.

Comparativo Recursos de capital vigencias 2024-2025

Los recursos de capital para la vigencia 2024 el recaudo acumulado fue de **$258.953.854.826,** y para la vigencia 2025 fue de $**374,237,146,602** evidenciando un recudo de **$115,283,291,776** más que el valor recaudado en la vigencia del 2024, el incremento porcentual respecto de lo recaudado en la vigencia fue del **30.80**%.

Lo anterior se debe a que en la ejecución de la vigencia 2025, la entidad presenta al presupuesto de ingresos en el rubro 1315 recursos del crédito por un valor de $**81,146,647,688**. Situación que incremento los ingresos de capital con respecto a la vigencia 2024

En cuanto a los rendimientos financieros para la vigencia 2025, el recaudo acumulado es de **$6,398,187,035,** representado entre otros, en depósitos: Provenientes de recursos de libre destinación, intereses fondo territorial de pensiones, intereses estampilla pro cultura, intereses Res 16480/15 PAE, intereses Fondo convenios nacionalizados, rendimientos Financieros Res. 014663/20 MEN FOME - Alternancia Educativa, Intereses Cesantías Administración Central, Intereses Cesantías Educación Intereses Sobretasa Bomberil, Intereses Fondo Cuenta de Impuesto al Consumo de Productos Extranjeros, Intereses del Fondo de Educación - Prestación de Servicios, Rendimientos Financieros SGP- Plan de Alimentación Escolar – PAE, y Rendimientos Financieros SGP- Prestación de Servicios. El recaudo es inferior a la vigencia 2024 en $3,108,896,452 equivalente al 48.59%

Análisis de estrategias recaudo

Con el fin de promover acciones tendientes a captar y gestionar eficientemente el cumplimiento de metas en el recaudo de ingresos, la Gobernación de Boyacá presenta informe sobre las estrategias implementadas para este fin, durante las vigencias 2025 y 2024 apoyados con la expedición de ordenanzas que modificaron en lo pertinente el Estatuto de Rentas del Departamento establecido mediante la Ordenanza 030 de 2017 así:

- ✓ Impuesto al consumo.

Respecto a los operativos de control rentístico, se expone que, durante el año 2025 se visitaron algunos municipios, con el fin de adelantar los controles, para evitar el

ingreso de productos de contrabando y el comercio de productos adulterados. Estas actividades permitieron que los ingresos no sufrieran la afectación debido a las estrategias implementadas, finalmente el impacto solo fue del 16% gracias a dichas estrategias, recaudándose el 90% del impuesto proyectado para la vigencia 2025; lo cual permitió que el Departamento pudiera cumplir con obligaciones laborales de sus trabajadores y contratistas, pago oportuno de la deuda.

Los controles adelantados, igualmente permitieron que, según cifras de la Federación Nacional de Departamentos, mediante encuesta contratada con la firma INVAMER, empresa encargada de medir cifras sobre el contrabando de cigarrillos en el país, identificó que Boyacá está entre los departamentos de menor impacto con menos del 3% para la vigencia 2025, igualmente se implementó el proceso de trámites a través de correo electrónico, atendiendo las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria.

Durante el año 2025 se realizaron operativos de control a varios municipios, lo que permitió un crecimiento promedio en los ingresos corrientes de libre destinación por concepto de gravámenes al consumo de licores, cerveza, cigarrillos, con relación al año 2024 que refleja un incremento del 9%.

- ✓ Impuesto de vehículos

Para el año 2025, se adoptaron beneficios estipulados en la reforma tributaria establecida en la Ley 2010 de 2019, así como los previstos en el Decreto 678 de 2020, permitiendo beneficiar a cerca de 26.000 deudores de impuesto de vehículos, con beneficio en sanciones e intereses de mora.

Se concedieron descuentos por pronto pago del impuesto y se amplió la fecha para pago oportuno del impuesto, los cuales fueron prolongados durante el año 2025 hasta el mes de noviembre. Este impuesto frente al año 2024 registra un crecimiento del 24% y un mayor recaudo del 9% frente al valor presupuestado para 2024.

- ✓ Impuesto de registro

Para este tributo en la vigencia 2025 se tramitaron beneficios consistentes en la exención del impuesto de registro, para el programa de formalización de tierras.

- ✓ Estampillas pro y tasas

Mediante Ordenanza 026 de 2020, se adoptó la Estampilla pro Electrificación. La cual durante el año 2024 permitió un recaudo de $13.554.917.915 de pesos.

Presupuesto de gastos

Se verificó la Ejecución presupuestal de egresos donde se evidencian compromisos por $**2.538.338.724.500**, obligaciones por **$2.106.871.743.918** y pagos por $**2.055.003.291.753**.
De acuerdo al cuadro siguiente, se evidencia que, respecto al presupuesto definitivo de $**3.021.994.584.117**, se comprometió el valor de $**2.538.338.724.500**, el cual representa el **84.00**% y que se encuentra desagregado de la siguiente manera:

Tabla 60 EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	NOMBRE RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	INDICADOR DE EJECUCIÓN %
A	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**241,465,473,687**	**184,738,173,094**	**76.51%**
A 1	GASTOS DE PERSONAL	72,772,052,068	69,683,480,254	95.76%
A 2	GASTOS GENERALES	50,890,900,777	48,337,026,274	94.98%
A 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,802,520,843	66,717,666,565	56.64%
B	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**86,845,071,069**	**59,557,616,625**	**68.58%**
B 1	DEUDA PUBLICA	86,845,071,069	59,557,616,625	68.58%
C	**INVERSIÓN**	**2,693,684,039,361**	**2,294,042,934,781**	**85.16%**
C 1	PROYECTOS DE INVERSIÓN - RECURSOS PROPIOS	228,078,004,750	221,397,279,335	97.07%
C 2	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,227,054,881,626	1,195,487,663,051	97.43%
C 3	OTROS	822,977,983,913	530,887,345,602	64.51%
C 4	SISTEMA GENRAL DE REGALÍAS	415,573,169,073	346,270,646,794	83.32%
TOTAL EJECUCION EGRESOS		**3,021,994,584,117**	**2,538,338,724,500**	**84.00%**

FUENTE: Ejecución de gastos vigencia 2025.

- Gastos de funcionamiento, estos gastos fueron ejecutados en un 76.51%
- Servicio de la Deuda Pública, estos fueron ejecutados en un 68.58%
- Gastos de Inversión, estos gastos fueron ejecutados en un 85.16%
- Sistema general de regalías, ejecutadas en un 83.32%.

Comparativa ejecución de gastos vigencias 2025 - 2024

Para la vigencia 2025, se fija como presupuesto definitivo de funcionamiento el valor de $**241.465.473.687** con unos compromisos por $**184.738.173.094** equivalente al **76.51**% del presupuesto definitivo

Cuadro 3 COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS 2025 – 2024

Código	Nombre Rubro	Compromisos 2025	Compromisos 2024	VAR PORC	VAR ABS
A	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**184,738,173,094**	**161,921,914,414**	**12.35%**	**22,816,258,680**
A 1	GASTOS DE PERSONAL	69,683,480,254	65,712,745,990	5.70%	3,970,734,264
A 2	GASTOS GENERALES	48,337,026,274	36,666,139,174	24.14%	11,670,887,100
A 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,717,666,565	59,543,029,250	10.75%	7,174,637,315
B	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**59,557,616,625**	**100,602,333,033**	**-68.92%**	**(41,044,716,408)**
B 1	DEUDA PUBLICA	59,557,616,625	100,602,333,033	-68.92%	(41,044,716,408)
C	**INVERSIÓN**	**2,294,042,934,781**	**1,906,356,068,439**	**16.90%**	**387,686,866,342**
C 1	PROYECTOS DE INVERSIÓN - RECURSOS PROPIOS	221,397,279,335	144,808,259,556	34.59%	76,589,019,779
C 2	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,195,487,663,051	1,040,513,997,381	12.96%	154,973,665,670
C 3	OTROS	530,887,345,602	321,144,806,793	39.51%	209,742,538,809
C 4	SISTEMA GENRAL DE REGALÍAS	346,270,646,794	399,889,004,709	-15.48%	(53,618,357,915)
TOTAL EJECUCION EGRESOS		**2,538,338,724,500**	**2,168,880,315,886**	**14.56%**	**369,458,408,614**

FUENTE: Ejecuciones de gastos vigencias 2025 - 2024.

Tomando como base las ejecuciones de gastos de las vigencias 2025 y 2024 de la Administración Central, se evidencia un incremento del **14.56**% respecto del total de los gastos vigencia 2025 en comparación con la vigencia 2024, es decir un valor $**369,458,408,614**.

Respecto a los gastos de funcionamiento, estos se incrementaron en un **12.35%**, que corresponden a un valor de **$22,816,258,680** de la vigencia 2025 con respecto a la vigencia 2024, el servicio de la deuda presenta una disminución por valor de $**41,044,716,408,** equivalente al **68.92%,** siendo el rubro con mayor decrecimiento respecto a los demás gastos; igual situación ocurrió con los gastos de inversión, donde se presentó un crecimiento por valor de $**387,686,866,342** que corresponde al crecimiento del 16.90**%** con respecto a la vigencia anterior en los gastos de inversión se presenta crecimiento en el rubro Proyectos de inversión – recursos propios del **34.59%** con respecto a la vigencia anterior que corresponden a un valor de $**76,589,019,779**, se presenta crecimiento en el sistema general de participaciones por un valor de $154,973,665,670 que corresponden al **12.96%** de variación.

Participación de los sectores de inversión

Una vez verificada la ejecución presupuestal de gastos se evidencian los porcentajes de ejecución de todos los sectores que hacen parte de los gastos de inversión, en donde se evidencia que los sectores educación; Sector Agricultura y Desarrollo Rural; Sector Minas y Energía, Sector Tecnologías de la Información y

Comunicaciones, Organismos de Control deporte, Sector Comercio, Industria y Turismo, Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y sector minero, fueron los sectores que representa una ejecución cercana al 100% de sus recursos; mientras el Sector Transporte 50.04% de ejecución; este sector fue el más bajo en ejecución.
Los siguientes sectores tienen un alto nivel de ejecución, es decir que la gestión presupuestal fue óptima destacándose un eficiente manejo presupuestal:

Tabla 61 EJECUCION DE LA INVERSIÓN POR SECTORES

ITEM	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	VALOR COMPROMISO	INDICADOR DE EJECUCION
1	Sector Justicia y del Derecho	1,766,206,355	1,747,208,121	98.92%
2	Sector Agricultura y Desarrollo Rural	7,053,497,809	6,553,689,135	92.91%
3	Sector Salud y Protección Social	278,233,045,707	228,309,588,020	82.06%
4	Sector Minas y Energía	19,120,356,217	18,586,347,053	97.21%
5	Sector Educación	1,228,299,801,879	1,205,432,906,288	98.14%
6	Sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones	17,756,742,394	17,122,743,487	96.43%
7	Sector Transporte	463,788,025,463	232,085,136,969	50.04%
8	Organismos de Control	647,208,539	639,312,521	98.78%
9	Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	7,017,514,711	5,974,599,267	85.14%
10	Sector Cultura	43,266,606,516	41,433,679,686	95.76%
11	Sector Comercio, Industria y Turismo	48,565,408,744	47,968,038,556	98.77%
12	Sector Trabajo	35,000,000	35,000,000	100.00%
13	Sector Ciencia, tecnología e innovación	67,354,000	67,354,000	100.00%
14	Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	36,637,795,297	31,398,444,697	85.70%
15	Sector Inclusión Social y Reconciliación	6,633,618,009	6,302,376,086	95.01%
16	Sector Deporte y Recreación	14,665,644,422	14,665,644,422	100.00%
17	Sector Gobierno Territorial	98,101,189,278	83,044,092,431	84.65%
TOTAL SECTORES		**2,271,655,015,340**	**1,941,366,160,738**	**85.46%**

FUENTE: Ejecución gastos de Inversión vigencia 2025 y 2024- secretaria de Hacienda -Gobernación de Boyacá.

Así como hay sectores que para la vigencia 2025 tuvieron un índice de inversión óptima, también hay sectores que para el 2025, tuvieron un bajo nivel de ejecución, y más teniendo en cuenta que la necesidad de la población no se cubre con lo presupuestado.

Análisis comparativo gastos de inversión 2025 y 2024

Tabla 62 COMPARATIVO GASTOS DE INVERSION 2025-2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO 2025	VALOR COMPROMISO 2024	DIFERENCIA	INCREMENTO % EGRESOS
TOTAL SECTORES		**1,941,366,160,738**	**1,421,420,659,039**	**519,945,501,699**	**36.58%**
1	Sector Justicia y del Derecho	1,747,208,121	1,430,343,188	316,864,933	22.15%
2	Sector Agricultura y Desarrollo Rural	6,553,689,135	2,506,127,672	4,047,561,463	161.51%
3	Sector Salud y Protección Social	228,309,588,020	209,266,718,844	19,042,869,176	9.10%
4	Sector Minas y Energía	18,586,347,053	3,303,577,017	15,282,770,036	462.61%
5	Sector Educación	1,205,432,906,288	1,008,412,767,736	197,020,138,552	19.54%
6	Sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones	17,122,743,487	6,387,025,632	10,735,717,855	168.09%
7	Sector Transporte	232,085,136,969	34,195,606,285	197,889,530,684	578.70%
8	Organismos de Control	639,312,521	353,575,953	285,736,568	80.81%
9	Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	5,974,599,267	3,722,535,513	2,252,063,754	60.50%
10	Sector Cultura	41,433,679,686	22,046,717,267	19,386,962,419	87.94%
11	Sector Comercio, Industria y Turismo	47,968,038,556	24,303,822,350	23,664,216,206	97.37%
12	Sector Trabajo	35,000,000	25,000,000	10,000,000	40.00%
13	Sector Ciencia, tecnología e innovación	67,354,000	10,832,000	56,522,000	521.81%
14	Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	31,398,444,697	19,609,804,714	11,788,639,983	60.12%
15	Sector Inclusión Social y Reconciliación	6,302,376,086	3,310,073,776	2,992,302,310	90.40%
16	Sector Deporte y Recreación	14,665,644,422	15,408,405,546	- 742,761,124	-4.82%
17	Sector Gobierno Territorial	83,044,092,431	67,127,725,547	15,916,366,884	23.71%

FUENTE: Ejecución de gastos vigencia 2025 y 2024 SIA CONTRALORIAS – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Al realizar el comparativo de la ejecución de los recursos de inversión de la vigencia 2025 frente a la ejecución de la inversión vigencia 2024, podemos evidenciar que para:

- **Sector Justicia y del Derecho:** En donde solo se ejecutó **$1.747.208.121** en el 2025, incremento su inversión en el 22.15%; mientras que en la vigencia 2024 se ejecutó; **$1.430.343.188,** recursos invertidos en programas como; Boyacá sigue avanzando en gestión del riesgo; en conocimiento del riesgo de desastres; en recurso humano; en Protección y bienestar social del recurso humano y en programas especiales de prevención y atención de desastres, entre otros.

- **Sector Agricultura y Desarrollo Rural**: Se comprometieron recursos para la vigencia 2025 por **$6.553.689.135,** los cuales equivalen **a $4.047.561.463**, más que los de la vigencia anterior**,** es decir que se ejecutó un **161.51**% más para el 2024, que corresponde a la ejecución en programas de

escuela campesina avanzar; dotación de equipos, materiales y suministros e infraestructura propia del sector entre otros.

- **Sector Salud y Protección Social**: En donde se ejecutó **$228.1309.588.020** en el 2025, incremento su inversión en **$19.042.869.176**; en la vigencia 2024 se ejecutó; **$209.266.718.844,** recursos invertidos en que corresponde a ejecución en programas Boyacá avanza en salud; avancemos en las prioridades en salud pública; en recurso humano y gastos de administración en salud, entre otros.

- **Sector Minas y Energía:** Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**18.586.347.053,** recursos que incremento el compromiso en **$15.282.770.036** frente a la vigencia 2024, equivalente al 462.61% estos corresponden a la ejecución en fortalecimiento del sector entre otros.

- **Sector Educación**: Para la vigencia 2025 se comprometieron recursos por $**1.205.432.906.288,** recursos que incrementaron el compromiso en **$197.020.138.552** frente a la vigencia 2024 equivalente al 19.54%, estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: fortalecimiento del desarrollo educativo de la población estudiantil boyacense.

- **Sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**17.122.743.487,** recursos que superaron el compromiso en **$10.735.717.855,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 168.09% estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: desarrollo tecnológico de las comunicaciones entre otras

- **Sector Transporte**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**232.085.136.979,** recursos que superaron el compromiso en **$197.889.530.684,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 578.70% estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: apertura y mantenimiento de vías entre otras

- **Organismos de Control**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**639.312.521,** recursos que superaron el compromiso en **$285.736.568,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 80.81% estos corresponden a la ejecución en la inversión

- **Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**5.974.599.267,** recursos que superaron el compromiso en **$2.225.063.754,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 60.50%

estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas de conservación y mitigación del deterioro ambiental en el departamento

- **Sector Cultura**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**41.433.679.686** recursos que superaron el compromiso en **$19.386.962.419,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 87.94% estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: desarrollo y protección del recurso cultural del departamento.

- **Sector Comercio, Industria y Turismo**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**47.968.038.556,** recursos que superaron el compromiso en **$23.664.216.206,** frente a la vigencia 2024 equivalente al 97.37%, estos corresponden fortalecimiento de alianzas comerciales con otros departamentos.

- **Sector Trabajo**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**35.000.000,** recursos que superaron el compromiso en **$25.000.000,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 28.5% estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: menor desempleo, mayores fuentes de trabajo etc.

- **Sector Ciencia, tecnología e innovación**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**67.354.000,** recursos que superaron el compromiso en **$56.522.000,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 521.81% estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas desarrollo tecnológico entre otras

- **Sector Vivienda, Ciudad y Territorio**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**31.398.444.697** recursos que superaron el compromiso en **$11.788.639.983,** frente a la vigencia 2024 equivalente al 60.2%, estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: subsidios de vivienda principalmente

- **Sector Inclusión Social y Reconciliación**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**6.302.376.086,** recursos que superaron el compromiso en **$2.992.302.310,** frente a la vigencia 2024, equivalente al 90.40% estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: avancemos por las víctimas del departamento de Boyacá; con la participación de las victimas avanzamos en la implementación de la política pública de víctimas; en el recurso humano; entre otras

- **Sector Deporte y Recreación**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**14.665.644.422,** recursos que decrecieron en **$742.761.124,** frente a la vigencia 2024, equivalente al -4.82% estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas como: infraestructura de escenarios deportivos y apoyo a eventos deportivos

- **Sector Gobierno Territorial**: Para la vigencia 2025, se comprometieron recursos por $**83.044.092.431,** recursos que superaron el compromiso en **$15.916.366.884,** frente a la vigencia 2024, estos corresponden a la ejecución en la inversión de programas diversos de la administración departamental

En términos generales el equipo auditor considera optima la inversión en los diferentes sectores, salvo el sector deporte y recreación

Análisis de la implementación según el porcentaje de cumplimiento por secretarias y sectoriales del cumplimiento del plan financiero en el plan de desarrollo vigencia 2025 y fuentes de financiación vigencia 2025

Ilustración 33

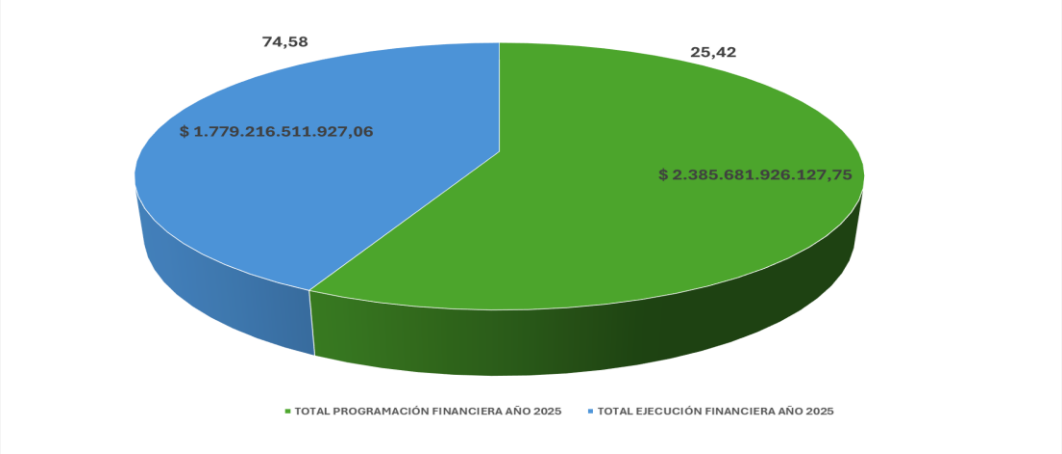


Tabla 63 SEGUIMIENTO EJECUCIÓN SECTORIAL VIGENCIA 2025

SECRETARIA	PROGRAMADO POR SECTORIAL	TOTAL AÑO EJECUTADO POR SECTORIAL	% DE CUMPLIMIENTO	% PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN
Secretaría General	14,184,504,532	1,524,657,706.00	10.75%	0.09%
Secretaría de Hacienda	11,533,202,279	9,285,504,509	80.51%	0.52%

Secretaria de Contratación	3,576,885,200	3,171,148,782	88.66%	0.18%
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario	1,688,659,661	526,325,690	31.17%	0.03%
Unidad Administrativa Especial de Asesoría Jurídica	1,225,477,081	1,914,440,000	156.22%	0.11%
Lotería de Boyacá	27,650,000,000	26,230,267,868	94.87%	1.47%
47Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	27,763,787,149	11,365,369,822	40.94%	0.64%
64Secretaría de Turismo	5,626,905,880	5,354,563,014	95.16%	0.30%
30Secretaría de Desarrollo Empresarial	5,792,920,000	1,152,073,723	19.89%	0.06%
Gestión de Riesgos y Desastres3	3,288,480,000	3,923,245,146	119.30%	0.22%
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal	12,490,943,999	6,857,843,667	54.90%	0.39%
Secretaría de Integración Social	7,504,488,000	4,696,709,240	62.59%	0.26%
Control Interno de Gestión	742,559,999	570,284,660	76.80%	0.03%
Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales	1,092,917,000	425,837,166	38.96%	0.02%
Secretaría de TIC Y Gobierno Abierto	34,160,381,334	57,012,034,986	166.90%	3.20%
Secretaría de Infraestructura Pública	50,862,717,249	143,908,820,467	282.94%	8.09%
Secretaría de Educación	1,092,712,688,971	1,196,650,887,110	109.51%	67.26%
INDEPORTES	79,372,023,052	39,731,615,179	50.06%	2.23%
Casa del Menor	1,060,389,210	1,014,970,549	95.72%	0.06%
Nueva Licorera de Boyacá	737,500,000	1,144,069,290	155.13%	0.06%
Secretaría de Agricultura	65,665,372,776	8,236,690,218	12.54%	0.46%
Secretaría de Salud	340,484,479,686	177,106,410,052	52.02%	9.95%
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo	2,330,434,400	1,990,057,280	85.39%	0.11%
Secretaría de Cultura y Patrimonio	51,578,355,680	17,827,949,732	34.56%	1.00%
Secretaría de Minas y Energía	31,045,779,200	27,010,480,261	87.00%	1.52%
Empresas públicas de Boyacá	37,080,832,160	17,942,704,514	48.39%	1.01%
ITBOY	1,956,081,289	4,169,820,406	213.17%	0.23%

IDEBOY	2,603,750,100	1,375,571,201	52.83%	0.08%
Secretaria de Planeación	12,104,955,002	7,096,159,688	58.62%	0.40%
TOTAL	**2,385,681,926,128**	**1,779,216,511,927**	**74.58%**	**100.00%**

Fuente: Información complementaria 2025

Análisis de la implementación según el porcentaje de cumplimiento por sectorial. Analizando los recursos para la implementación reportados por cada una de las sectoriales e institutos descentralizados, es importante mencionar que las inversiones realizadas por la Secretaría General corresponden a un total de $1.524 millones, con recursos de Ingresos corrientes de libre destinación y recursos de Gestión en el periodo de estudio y corresponden a las apuestas servidores proactivos e información transparente y accesible al servicio de los ciudadanos; al igual que inversiones por un Boyacá Grande con la recuperación de sus bienes para mejorar las condiciones laborales, el acceso a la oferta de servicios institucionales y facilitar la custodia y consulta de la gestión Documental, del mismo modo realizaron capacitaciones y asesorías en gestión documental al igual, que promovieron espacios de participación y se actualizaron sistemas de información.

En cuanto a la Secretaría de Hacienda, realizó inversiones en el segundo año de gobierno por un valor de $**9.285.504,509** millones de recursos propios; de los cuales $**3.801,3** millones corresponden a ingresos corrientes de libre destinación y $**3.100,75** millones a Ingresos corrientes de destinación específica y $**2.385,45** millones correspondientes a recursos de Gestión, la inversión corresponde a la apuesta por una eficiencia administrativa y fiscal para una Boyacá Grande, las actividades realizadas son en su mayoría en el programa de saneamiento fiscal y generando estrategias en la concientización de la población en el tema de contrabando, compra venta y consumo de licores y cigarrillos, al igual se realizaron asistencias técnicas para lograr una eficiencia fiscal y administrativa.

Respecto a la Secretaría de Contratación, implementó recursos en el año en la apuesta por las compras y contratación pública en la Boyacá grande por un valor de $3.**171.148.782** millones que corresponde a recursos de ingresos corrientes de libre destinación destinados para el cumplimiento un programa de saneamiento fiscal y financiero, asistir técnicamente a entidades y organismos departamentales y se han venido actualizando los sistemas de información y del mismo modo los archivos gestionados de conformidad a la ley 594 de 2000.

Por su parte la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario realizó inversiones con ingresos corrientes de libre destinación por un valor de $**526.325** millones

aproximadamente de la fuente Ingresos Corrientes de libre destinación, dentro de la apuesta por un Boyacá ancestralmente integra, básicamente en capacitación en la OCID, en eventos de divulgación y documentos de investigación.

La Unidad Administrativa especial de asesoría y defensa jurídica del Departamento realizó inversiones por un valor de $**1.914** millones aproximadamente en la apuesta por una gestión jurídica eficaz y eficiente en el departamento recursos provenientes de las fuentes Ingresos corrientes de libre destinación un valor de $**1.909** millones y $ **5** millones de la fuente Otros Recursos, se ha venido actualizando la información que se encuentra consignada en las diferentes bases de datos en especial el de procesos judiciales; del mismo modo se actualizaron y elaboraron documentos técnicos.

En cuanto a la Lotería de Boyacá, que cuenta con recursos propios realizó inversiones por valor de $**26.230** millones, fundamentalmente en la apuesta transferencias que aportan a una Boyacá grande más saludable y las inversiones se canalizaron para implementar estrategias e incrementar la productividad, del mismo modo generar acciones de comercialización que se traducen en mayor financiación de programas sociales concretamente dirigidos al sector salud del Departamento de Boyacá.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo sostenible registró inversiones para el periodo por un valor de $**11.365** millones, de los cuales $**1.592** millones corresponden a recursos de ingresos corrientes de libre destinación y $**3** millones a ingresos corrientes de destinación específica y de recursos de Gestión un valor de $**9.708** millones. Las inversiones se realizaron dentro de las apuestas por la naturaleza vida y sostenible, por la naturaleza transformadora de residuos sólidos, por la naturaliza viva y sostenible, por la naturaleza para la protección y el bienestar animal y por la gobernanza del agua, se realizaron acciones orientadas a (levantamientos topográficos), como insumos de planeación y optimización de los sistemas de acueductos rurales, rutas contra el maltrato animal, campaña, Boyacá protege la vida con pasión, grupo de carabineros y protección ambiental del departamento capacitado en PYBA, reportes de conservación de animales silvestres , reportes de lineamientos para la implementación de plantas de sacrificio municipales del mismo modo se realizó la convocatoria fondo de incentivo a la capitalización (FINCA), la ruta de atención y denuncia para malas prácticas de sacrificio animal y la estrategia una Boyacá de pelos, espacios radiales.

Por su parte, la Secretaría de Turismo realizó inversiones por un valor de $**5.354** millones de pesos distribuidos de la siguiente forma $**4.33**3 millones de ingresos corrientes de libre destinación; de gestión un total de $**504,39** millones,

cofinanciación un valor total de $**18** millones de pesos y de la fuente otros recursos un valor de $ **56,74** millones recursos invertidos dentro de las apuestas, Boyacá es para vivirla, Boyacá turística, con enfoque integral en información, calidad e infraestructura, Boyacá turística un destino planificado y competitivo, Boyacá turística un territorio seguro inclusivo y sostenible, con un talento humano fortalecido y por una Boyacá turística, un buen gobierno para el sector, dentro de las actividades realizadas están la instalación de la señalización turística en los municipios de Sora y Paz del Río a través de bici ruta en Guacamayas y Soata mediante habladores informativos generando beneficios significativos para los visitantes y la comunidad local

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Empresarial, se observa que realizó inversiones por un valor aproximado de $**1.152** millones con recursos provenientes de ingresos corrientes de libre destinación por un valor de $**1.094** millones y de la fuente Gestión un valor de $**57** millones. Básicamente, las inversiones se realizaron en las apuestas Confianza por la innovación Empresarial, excelencia empresarial, Boyacá agroindustria motora acción de inversión e internacionalización de la economía, Gobernanza del territorio, base del desarrollo económico y social, La bioeconomía, herramienta de transformación empresarial sostenible, la agroindustria motor de la competitividad, desarrollando actividades de asesoría y asistencias técnicas a clúster del departamento, se asesoraron emprendimientos, se brindó asesoría en herramientas de crecimiento y ayuda para facilitar el cumplimiento de todo lo relacionado con licenciamiento y permisos ambientales de las empresas.

Respecto a la Unidad Administrativa especial para la Gestión del riesgo y desastres realizó inversiones en el periodo por un valor de $**3.923** millones de pesos distribuidos de la siguiente manera $**3.431** millones de ingresos corrientes de libre destinación, $**445** millones a la gestión realizada por la entidad y $**46** millones de cofinanciación, recursos invertidos primordialmente dentro de las apuestas, conocimiento integral del riesgo de desastres para una Boyacá grande, por una Boyacá grande manejo efectivo de desastres y en la apuesta reducción del riesgo de desastres para una Boyacá Grande, durante el periodo se realizaron asistencias técnicas a los Consejos Municipales para la Gestión del riesgo de desastres CMGRD y la comunidad en general.

En cuanto a la Secretaría de gobierno y acción comunal efectuó inversiones en el periodo por un valor de $**6.857** millones de pesos, de los cuales $**2.338** millones aproximadamente corresponden a ingresos corrientes de libre destinación, $**3.840** millones de Ingresos corrientes de destinación específica y $**679** millones de otros recursos, se realizaron inversiones en las apuestas grupos comunitarios como

protagonistas del desarrollo de los territorios en la Boyacá Grande, Jóvenes activos en las agendas públicas de los territorios de la Boyacá Grande, Jóvenes Boyacenses construyendo oportunidades para su proyecto de vida en la Boyacá Grande, Boyacá Grande como el territorio más seguro de Colombia y la apuesta Dignificación y reconocimiento de la población víctima y vulnerable en la Boyacá Grande, se realizaron asistencias técnicas en la formulación de proyectos a los organismos de acción comunal de algunos municipios del departamento, también se realizaron asistencias técnicas a los organismos comunales en la aplicación de la ley 2166, la actualización de estatutos y la activación de comisiones empresariales, también se realizó la cumbre de juvenil de liderazgo ambiental, guardianes del territorio

Respecto a la Secretaría Integración Social, se puede establecer que realizo inversiones por un valor de $**4.696** millones que corresponden a $**790** millones de Ingresos corrientes de libre destinación, $**1.968** millones correspondientes a ingresos corrientes de destinación específica, del Sistema general de regalías $**1.550** millones, de la fuente gestión $**292** millones y de otros recursos se invirtieron un total de $95 millones inversiones realizadas en las apuestas, Por la gestión social y la red integral de cuidado y bienestar de Boyacá “Plan abrigo”, Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes, Una Boyacá grande diversa, incluyente, diversa, incluyente y no excluyente, por el respeto y garantías de los derechos de la población LGTBIQ+/ OSIGD, Entornos seguros para la atención de la primera infancia, por las etnias en la Boyacá Grande, Mujer es Boyacá, Fortalecimiento de la Autonomía, el empoderamiento y la inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, Sembramos cuidado y reconocimiento hacia las personas mayores, tierra que cuida a las familias Boyacenses, se realizó la construcción del plan de acción departamental de familias 2025, proyección del mes de familias, actividades lúdico recreativas que validan el derecho al juego de los niños y niñas de primera infancia, también se realizó la convocatoria a los municipios del departamento sobre fortalecimiento de servicios en centros de atención de persona mayor.

En cuanto al Control Interno de gestión las inversiones realizadas en el año 2025, fueron por un valor de $**570** millones correspondientes a ingresos corrientes de libre destinación; los cuales fueron canalizados para un control interno enfocado a la prevención y la mejora continua que permita la integralidad de la Boyacá Grande, donde se asistieron a las entidades técnicamente, se realizaron informes de gestión y se elaboraron documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal y se realizaron diferentes campañas de sensibilización del fomento de la cultura del autocontrol.

Por su parte la Unidad Administrativa de relaciones Nacionales e Internacionales invirtió recursos por un valor de $**425** millones correspondientes a la fuente de Ingresos corrientes de libre destinación, dentro de la apuesta por una Boyacá grande exportadora y conectada con el mundo, donde se realizó asistencia técnica a entidades territoriales a nivel de internacionalización, del mismo modo se realizaron acciones departamentales con mayor participación y alineadas con las prioridades del gobierno.

En la Secretaría de Tic y Gobierno abierto (TIC), durante el período evaluado se realizaron inversiones por un total de $**57.012** millones, financiados con $**4.053** millones de ingresos corrientes de libre destinación, $**8.449** millones de ingresos corrientes de destinación específica, $**322** millones del Sistema General de Regalías y $**44.187** millones de Gestión. Esta inversión representó un nivel de cumplimiento del 166,90 %, superando significativamente lo programado para la vigencia. Los recursos se concentraron en la apuesta “Todos conectados por un Boyacá digital”, con una inversión superior a $**40.135** millones, logrando la consolidación del diagnóstico departamental de conectividad y la estructuración del RFI, con sus respectivas cotizaciones, para la implementación de la Red Troncal Neutra. Estos avances permitieron definir las variables técnicas y financieras necesarias para fortalecer una alianza público-privada, orientada a la ampliación y modernización de la infraestructura de conectividad del departamento de Boyacá.

Respecto a la secretaría de infraestructura pública efectuó inversiones por un valor aproximado de $**143.908** millones provenientes de recursos de libre destinación por un valor $**4.351** millones; con recursos de destinación específica corresponden inversiones por un total de $ **17.904** millones de pesos y por Gestión un valor de $**2.415** millones con recursos del Sistema General de Regalías por un valor de $**92.992** millones, otros recursos por $25.914 millones y crédito por valor de $**256** millones, con un porcentaje de cumplimiento de **28,29**%, porcentaje que, si bien se ubica por debajo de lo programado, responde a la priorización de intervenciones estratégicas y habilitantes, necesarias para garantizar la viabilidad técnica, financiera y administrativa de los proyectos..

La mayor inversión de recursos se enmarcan dentro de la apuesta “por más escenarios para la vida, el deporte, la cultura, la seguridad y convivencia ciudadana” por una inversión de $**7.943** millones de pesos, en donde se logró la elaboración de estudios y diseños para el desarrollo de equipamientos de carácter cultural y administrativo, la construcción de bibliotecas públicas con espacios lúdicos complementarios, así como la estructuración de proyectos para la implementación de parques temáticos alusivos a los procesos de transformación agroindustrial,

concebidos como estrategias para dinamizar el turismo y promover el desarrollo cultural y económico a nivel del departamento.

Por su parte la Secretaría de Educación realizó inversiones en el periodo por un valor aproximado de $**1.197** billones; correspondientes a $**17.417** millones de pesos de Ingresos corrientes de libre destinación; $**11.593** millones de pesos de ingresos corrientes de destinación específica; del sistema general de participación en educación por un valor aproximado de $**1.010** billones de pesos, al igual se realizaron inversiones por un valor de $ 67.693 millones que corresponden al sistema general de regalías; de gestión que hizo la entidad asciende a $**4.658** millones; por cofinanciaciones un total de $**25.462** millones de pesos; mientras que de otros recursos gestionados, se invirtieron un total de $**59.301** millones de pesos, con un porcentaje de cumplimiento de **109,51**%. Básicamente, las inversiones se concentraron en la apuesta “Dinamización y fortalecimiento del talento educativo, por una Boyacá Grande”, con una asignación aproximada de $**1,010** billones, a través de la cual se avanzó en la formulación e implementación de una estrategia orientada al fortalecimiento de la acción comunal. Esta iniciativa permitió identificar la necesidad de consolidar una política pública dirigida a robustecer las capacidades de las organizaciones de acción comunal en los niveles nacional, regional y local, generando impactos positivos en el desarrollo comunitario y contribuyendo a la sostenibilidad y fortalecimiento institucional de los organismos comunales.

En cuanto a Indeportes, realizó inversiones por un valor de $**39.731** millones, distribuidos en recursos de ingresos corrientes de libre destinación por $**30.118** millones, recursos de Gestión por $**2.144** millones, de recursos propios por $**7.465** millones de pesos y otros recursos por **3** millones, con un porcentaje de cumplimiento del 50.06%.

Estos recursos se distribuyeron en la apuesta “Estilos de vida en deporte social para una Boyacá Grande”, con una inversión de $**19.162** millones, mediante la cual se implementó el Programa de Atención al Adulto Mayor, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En el marco de este programa se desarrollaron sesiones de actividad física musicalizada, actividades lúdicas con implementos como pelotas, aros y bastones, así como jornadas de caminatas, contribuyendo al mejoramiento de las capacidades físicas, al fortalecimiento de las habilidades psicológicas y sociales, y a la promoción del bienestar integral de esta población.

Por su parte la Casa del Menor efectuó inversiones por un valor de $**1.014** millones de pesos, de los cuales fueron de ingresos corrientes de libre destinación por $**297** millones y recursos propios un valor de $**717** millones, con un porcentaje de cumplimiento de **95,72**%, estos recursos de recursos se canalizaron a través de la

apuesta" por una Boyacá Grande con acciones de prevención y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes" donde fueron inscritos en escuelas deportivas y en programas de recreación y deporte social y comunitario; en ella se desarrollaron procesos de formación deportiva orientados a promover el aprovechamiento adecuado del tiempo libre como estrategia de prevención de conductas de riesgo, mediante el fortalecimiento de habilidades para la vida en entornos lúdicos que favorecen un ambiente sano. La implementación de esta estrategia contó con la articulación de las organizaciones comunales, las instituciones educativas y las administraciones locales, culminando de manera exitosa y generando resultados positivos en el desarrollo integral de la población beneficiaria.

Por su parte la Nueva Licorera de Boyacá, presenta inversiones por valor de $**1.144** millones correspondientes a recursos propios de la entidad, con un porcentaje de cumplimiento de **115,13**%, un porcentaje superior a lo programado durante el año, a través de la apuesta" la nueva licorera de Boyacá como fuente de crecimiento en la Boyacá grande" por una inversión de $1.125 millones de pesos. La Nueva Licorera de Boyacá – NLB consolidó avances relevantes en la modernización y automatización de su infraestructura productiva, priorizando la optimización de la planta de agua potable tratada "Cuna Grande". Esta intervención fortalece la eficiencia operativa y la calidad de los procesos productivos, generando beneficios para el departamento de Boyacá en su conjunto. Adicionalmente, en el marco del Reinado del Torbellino realizado en el municipio de Tutazá, se llevó a cabo la entrega y el préstamo de material P.O.P., impactando de manera positiva a cerca de 3.000 personas.

En cuanto a la secretaría de agricultura, las inversiones realizadas en el periodo alcanzaron un total de $**8.236** millones con recursos provenientes de ingresos corrientes de libre destinación por un valor de $**4.852** millones; del sistema general de regalías por valor total de $**2.884** millones, recursos de gestión por un total de $**109** millones y de la fuente de financiación de cofinanciaciones un total de $**146** millones y por otros recursos por $243 millones de pesos, con un porcentaje de cumplimiento de $ **12,54**%, estos recursos invertidos en la apuesta "mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande", por valor de $**3.241** millones de pesos, en ella se desarrollaron proyectos que incluyeron la realización de diagnósticos productivos, visitas técnicas especializadas y el fortalecimiento de capacidades locales, en articulación con el Plan Departamental de Desarrollo 2024–2027. Estas acciones contribuyeron a promover la sostenibilidad agroindustrial, la inclusión productiva y la equidad de género, bajo un enfoque territorial. Asimismo, permitieron consolidar procesos de transformación y comercialización, mejorar la infraestructura productiva y avanzar

en la formulación de proyectos y el acompañamiento institucional, con énfasis en la población joven.

En cuanto a la Secretaría de salud, realizó inversiones por un valor total de $**177.106** millones de pesos correspondientes $**462** millones de ingresos corrientes de libre destinación; $**108.490** millones de pesos de ingresos corrientes de destinación específica y del Sistema general de participaciones en salud un total **$ 68.153** millones, con porcentaje de cumplimiento de **52,02**%. La secretaría de salud realizo la mayor inversión en la apuesta "Boyacá grande con atención integral en salud basada en la atención primaria centrada en la familia y en la comunidad" por una inversión de $172.078 millones, como resultado de las acciones desarrolladas, se fortalecieron los procesos de inspección, vigilancia y control (IVC) en establecimientos farmacéuticos y en los sistemas de suministro de agua para consumo humano, permitiendo identificar oportunidades de mejora y promover el cumplimiento de la normativa sanitaria. Estas intervenciones contribuyeron a la reducción de los índices de riesgo asociados al abastecimiento y a la calidad del agua, al fortalecimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y, en consecuencia, a la protección y mejora de la salud de las comunidades.

Respecto a la Unidad Administrativa de comunicaciones y protocolo, realizó inversiones por un valor total de $**1.990** millones correspondientes a ingresos corrientes de libre destinación con un total de $**1.884**, y de otros recursos por valor de $**105** millones de pesos millones, con un porcentaje de cumplimiento de **85,39**%, estos recursos se invirtieron especialmente dentro de la apuesta "Boyacá Grande de la mano de los periodistas y comunicadores", con una inversión de $**1.501** millones, permitió garantizar el acceso a información pública de primera mano, fortalecer el acercamiento con las comunidades y consolidar los lazos de confianza con los grupos de interés de la Gobernación de Boyacá, promoviendo de manera activa la participación ciudadana. En las apuestas Boyacá Grande en Sintonía con los territorios y Boyacá Grande con información para todas y todos, entre otros. Fundamentalmente en productos digitales y en iniciativas organizativas de participación ciudadana; al igual con recursos de gestión por valor de $2.149 millones se canalizaron para apoyar empresas con contenidos digitales y espacios de participación.

Por su parte la secretaría de cultura y patrimonio realizó inversiones por un valor de $**17.827** millones, correspondientes $**9.728** millones a ingresos corrientes de libre destinación; un total de recursos de ingresos corrientes de destinación específica por un valor de $**5.573** millones y de Gestión por valor de $**2.526** millones de pesos, con una participación del **85,39**%, estas inversiones se realizaron en la apuesta " Afianzamiento del dialogo cultural y la convivencia ciudadana en Boyacá Grande"

por valor de $10.167 millones, de los cuales se avanzó en el fortalecimiento y la promoción de su identidad cultural mediante procesos de formación y capacitación en música y danza, orientados a resaltar las expresiones tradicionales de la región. Estas acciones contribuyeron al desarrollo de capacidades artísticas, al mejoramiento de los niveles técnicos interpretativos y a la participación de los colectivos culturales en escenarios de alcance regional, nacional e internacional, consolidando la cultura campesina como un eje fundamental del patrimonio cultural del departamento.

En cuanto a la secretaria de minas y energía, con una inversión total de $**27.010** millones de pesos, de los cuales se distribuyeron en ingresos corrientes de libre destinación por $**718** millones, ingresos corrientes de destinación específica por $**8.751** millones, de recursos de Gestión por $**7.890** millones y de Regalías por $**7.084** millones de pesos, de fuente de cofinanciación por $877 millones y otros recursos por valor de $**1.688** millones de pesos, con un porcentaje del **87**% , estos recursos se invirtieron especialmente en la apuesta “ acceso y permanencia educativa para todas y todas en nuestra Boyacá” por valor de $**139.595** millones, en donde se avanzó en la implementación de acciones orientadas a la prevención y control de la minería ilegal, mediante espacios de articulación interinstitucional y reuniones técnicas para la revisión y retroalimentación de lineamientos que regulan el desarrollo de la actividad minera. Estas acciones, desarrolladas con la participación de las entidades competentes, fortalecen la gestión del sector minero y generan beneficios para la población del departamento, al promover la legalidad, la protección del territorio y el desarrollo sostenible.

Respecto a las empresas públicas de Boyacá (ESPB), para la vigencia fiscal de 2025 realizó inversiones por un valor de $**17.942** millones; correspondientes a $**11.714** millones del Sistema General de Participaciones APSB; recursos de cofinanciaciones por un valor de $**5.647** millones, de Regalías por $**258** millones, y por otros recursos un valor de $**322** millones, con un porcentaje de cumplimiento de 48,39%, básicamente las inversiones se realizaron en la apuesta por el manejo sostenible de los residuos sólidos para una Boyacá Grande; Estos recursos permitieron el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como la verificación y el acompañamiento en la correcta destinación y giro de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la sostenibilidad del sector a nivel departamental.

En cuanto al Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY), efectúo inversiones en el periodo de estudio por un valor de $**4.169** millones de pesos, con un porcentaje de cumplimiento de **213,17**% porcentaje superior al programado durante todo el año,

indicando destinación de recursos prioritarios, correspondientes a recursos propios del instituto. Donde su mayor inversión fue en la apuesta “Boyacá hacia un territorio sin víctimas en los siniestros viales “por un valor de $**3.528** millones de pesos, lo que permitió fortalecer las acciones de seguridad vial en el departamento mediante la implementación de estrategias de prevención, educación y control, orientadas a la reducción de la siniestralidad. A través de este programa se promovió la cultura vial, se fortalecieron las capacidades institucionales y se avanzó en la protección de la vida de los actores viales, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad y a la disminución de los riesgos en las vías del departamento.

De otra parte el Instituto de Desarrollo De Boyacá (IDEBOY), efectuó inversiones por un valor de $**1.375** millones, provenientes de recursos propios de la entidad y encaminados a desarrollar actividades de fomento para el desarrollo económico, social, cultural empresarial y turístico del Departamento de Boyacá, con un porcentaje de cumplimiento de **52,83**%, donde su inversión se dio en la apuesta “Desarrollar actividades de fomento para el desarrollo económico, social, cultural, empresarial y turístico del departamento de Boyacá”, logrando el fortalecimiento de las capacidades locales, la dinamización de la economía regional y la promoción del patrimonio cultural y turístico del departamento. Estas acciones permitieron apoyar iniciativas empresariales y culturales, fomentar el emprendimiento, fortalecer la participación comunitaria y mejorar la visibilidad de Boyacá como un territorio competitivo, diverso y atractivo para la inversión y el turismo.

Finalmente, se tiene la secretaría de Planeación, que invirtió un total de recursos de $**7.096** millones, correspondientes a $**6.812** millones de ingresos corrientes de libre destinación; $**84** millones que corresponden a Gestión; de otros recursos por un valor de $**199** millones, con un porcentaje de cumplimiento del **58,62**%, en donde su mayor inversión fue en la apuesta “ por una Boyacá Grande con visión, estrategia y acción”, por valor a $4.762 millones de pesos, permitiendo fortalecer la planeación estratégica y la articulación institucional del departamento, impulsando acciones orientadas al desarrollo integral del territorio. Estos recursos contribuyeron a mejorar la gestión pública, optimizar la toma de decisiones y consolidar procesos que favorecen el crecimiento sostenible y el bienestar de la población boyacense.

Cumplimiento de la inversión por secretarias inferior al 80%

Tabla 64 EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSION POR SERCRETARIAS VIGENCIA 2025

SECRETARIA	PROGRAMADO POR SECTORIAL	TOTAL, AÑO EJECUTADO POR SECTORIAL	% DE CUMPLIMIENTO	% PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN
Secretaría Genera	14,184,504,532	1,524,657,706	10.75%	0.09%
Secretaría de Agricultura	65,665,372,776	8,236,690,218	12.54%	0.46%

30Secretaría de Desarrollo Empresarial	5,792,920,000	1,152,073,723	19.89%	0.06%
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario	1,688,659,661	526,325,690	31.17%	0.03%
Secretaría de Cultura y Patrimonio	51,578,355,680	17,827,949,732	34.56%	1.00%
Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales	1,092,917,000	425,837,166	38.96%	0.02%
47Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	27,763,787,149	11,365,369,822	40.94%	0.64%
Empresas públicas de Boyacá	37,080,832,160	17,942,704,514	48.39%	1.01%
INDEPORTES	79,372,023,052	39,731,615,179	50.06%	2.23%
Secretaría de Salud	340,484,479,686	177,106,410,052	52.02%	9.95%
IDEBOY	2,603,750,100	1,375,571,201	52.83%	0.08%
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal	12,490,943,999	6,857,843,667	54.90%	0.39%
Secretaria de Planeación	12,104,955,002	7,096,159,688	58.62%	0.40%
Secretaría de Integración Social	7,504,488,000	4,696,709,240	62.59%	0.26%
Control Interno de Gestión	742,559,999	570,284,660	76.80%	0.03%

Fuente: Información complementaria 2025

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14 GASTOS DE INVERSION INFERIOR AL 80%.

CONDICION: En el cuadro anterior se identifican las secretarias, cuyo gasto de inversión, se encuentran por debajo del 80% de cumplimiento, situación que implica un bajo nivel de eficiencia en el desarrollo de los procesos productivos, en la vigencia 2025

CRITERIO: Incumplimiento dentro de las consideraciones de la ordenanza 038 del 12 de Diciembre del 2024 por la cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos, de la Gobernación de Boyacá en y describe la preparación y elaboración del proyecto de presupuesto de la vigencia 2024, partiendo de la realización de estimaciones y proyecciones de ingresos y gastos atendiendo al comportamiento mensual de los ingresos y rentas de la Gobernación de Boyacá y a las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno Nacional en el especial el crecimiento del IPC esperado a 31 de Diciembre y todas las consideraciones técnicas descritas en el marco fiscal de mediano plazo 2024-2033

CAUSA: Incumplimiento de la gestión financiera contemplada en el plan de desarrollo. Para la vigencia fiscal 2025

EFECTO: El plan financiero para la vigencia 2025 no tuvo un índice de inversión óptima, dentro de los cuales podemos destacar, los Sectores anteriormente descritos.

La observación señala básicamente la gestión desarrollada por las Secretarias de la Gobernación en la ejecución presupuestal de gastos de los sectores de inversión, teniendo en cuenta que dentro de la calificación que da la Contraloría, respecto de la calificación optima que se considera en la respectiva evaluación del sector, debe estar por encima del 80%, teniendo en cuenta que el valor del indicador no desestima la gestión de la ejecución del sector, únicamente determinamos la observación como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14**, para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento, que determine mejor inversión dentro del plan y mejore la meta propuesta en el plan de desarrollo.

Vigencias Futuras

Con respecto a las vigencias futuras de 2025, la Gobernación de Boyacá constituyó un presupuesto definitivo por $**31,602,836,788**, de los cuales se comprometieron **$31,229,436,517** que corresponden a los sectores educación por valor de $**936,174,184**, conjuntamente con el sector Transporte por $6,451,363,086, para la infraestructura vial, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Las vigencias futuras, fueron debidamente autorizadas por la Asamblea departamental, tal y como se presenta en los cuadros siguientes.

Tabla 65 VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZACIONES

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE VIGENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO	MONTO TOTAL APROBADO
V	**TOTAL DE VIGENCIAS FUTURAS**					**238,594,589,716**
V.I.19	**SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**					**48,124,668,362**
V.I.19.05	SALUD PUBLICA					48,124,668,362
V.I.19.05	SALUD PUBLICA	ORDINARIA	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES,	81	25-10-2025	9,772,489,481
V.I.19.05	SALUD PUBLICA	ORDINARIA	SGP-SALUD-SUBSIDIO A LA OFERTA	81	25-10-2025	13,131,315,964
V.I.19.05	SALUD PUBLICA	EXCEPCIONAL	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	81	25-10-2025	898,840,339
V.I.19.05	SALUD PUBLICA	EXCEPCIONAL	SGP-SALUD-SUBSIDIO A LA OFERTA	81	25-10-2025	24,322,022,578
V.I.22	**EDUCACIÓN**					**65,574,477,610**
V.I.22.01	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	ORDINARIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	84	04-11-2025	325,438,924
V.I.22.01	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA	ORDINARIA	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	84	04-11-2025	700,000,000
V.I.22.01	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	ORDINARIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	88	06-11-2025	1,049,957,727
V.I.22.01	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	EXCEPCIONAL	APORTES NACION - ALIMENTACION ESCOLAR	77	23-09-2025	63,499,080,959
V.I.24	**TRANSPORTE**					**95,386,653,768**

V.I.24.02	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL					90,935,357,188
V.I.24.02	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	ORDINARIA	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52	25-02-2025	11,021,000,000
V.I.24.02	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	EXCEPCIONAL	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	81	25-10-2025	9,999,969,137
V.I.24.02	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	ORDINARIA	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86	04-11-2025	69,914,388,051
V.I.24.04	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERREO	ORDINARIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85	04-11-2025	4,451,296,580
V.I.32.03	**GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO**					**8,473,000,000**
V.I.32.03	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	ORDINARIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	84	04-01-1900	340,000,000
V.I.32.03	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	EXCEPCIONAL	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84	04-11-2025	3,600,000,000
V.I.32.03	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	ORDINARIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	84	04-11-2025	2,633,000,000
V.I.32.03	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	ORDINARIA	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	84	04-11-2025	1,900,000,000
V.I.33	**CULTURA**					**1,700,000,000**
V.I.33.02	GESTION, PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	ORDINARIA				1,700,000,000
V.I.40	**VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**					**3,690,086,400**
V.I.40.01	ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA	ORDINARIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	87	04-11-2025	3,690,086,400
V.I.45	**GOBIERNO TERRITORIAL**					**15,645,703,576**
V.I.45.01	FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	ORDINARIA				15,645,703,576

FUENTE: Ejecución de gastos vigencia 2025- Gobernación de Boyacá.

De acuerdo a la Ordenanza 020 del 25 de noviembre de 2020, en su Capítulo V "ARTICULO 32. Cuando se requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá obtener autorización de la Asamblea Departamental para comprometer vigencias futuras, previa aprobación del CONFIS Territorial o el órgano que haga sus veces, conforme a la Ley 1483 de 2011, la Norma Orgánica del Presupuesto Departamental y los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 819 de 2003"

En la vigencia 2025, se expidieron vigencias futuras de acuerdo a lo establecido en la Ley 819 de 2003.

Tabla 66 COMPARATIVO VIGENCIAS FUTURAS 2025 Y 2024

VIGENCIA		2025			2024		
IDENTIFPTAL	**DESCRIPCIÓN**	**APROPIACIÓN DEFINITIVA**	**COMPROMISOS**	**% EJECUCION**	**APROPIACIÓN DEFINITIVA**	**COMPROMISOS**	**% EJECUCION**
V	**VIGENCIAS FUTURAS**	**238,594,589,716**	**171,808,223,823**	**72%**	**37,260,037,336**	**36,922,774,533**	**99%**
V.I	VIGENCIAS FUTURAS INVERSION	**238,594,589,716**	**171,808,223,823**	**72%**	**37,260,037,336**	**36,922,774,533**	**99%**
V.I.19	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	**48,124,668,362**	**23,590,523,706**	**49%**			
V.I.22	Sector Educación	65,574,477,610	65,574,477,610	**100%**	37,260,037,336	0	**0%**
V.I.24	Sector Transporte	95,386,653,768	53,134,432,531	**56%**	0	0	0%

V.I.32.03	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	8,473,000,000	8,473,000,000	**100%**			
V.I.33	CULTURA	95,386,653,768	53,134,432,531	**56%**	0	0	0%
8.3.40	Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	3,690,086,400	3,690,086,400	**100%**	3,690,086,400	3,690,086,400	0%
8.3.45	Sector Gobierno Territorial	15,645,703,576	15,645,703,576	**100%**	0	0	0%

FUENTE: Ejecución de vigencias futuras vigencias 2025 y 2024 – Gobernación de Boyacá.

Las vigencias futuras, constituidas en las vigencias *2025 y 2024*, fueron ejecutadas en un 99%.

Pasivos exigibles vigencias expiradas

Cuadro 4 PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS

9	**PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS**	**50,045,242,943**	**48,391,199,665**	**96.69%**
9.1	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2025**	**26,942,552,771**	**26,289,054,218**	**97.57%**
9.1.2	GASTOS	22,924,231,572	22,323,460,668	97.38%
9.1.8	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS FUTURAS 2023	4,018,321,199	3,965,593,551	98.69%
9.2	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2024**	**21,127,976,337**	**20,976,576,687**	**99.28%**
9.2.2	GASTOS	21,127,976,337	20,976,576,687	99.28%
9.3	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2023**	**581,702,239**	**562,817,655**	**96.75%**
9.3.2	GASTOS	581,702,239	562,817,655	96.75%
9.4	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES**	**1,393,011,597**	**562,751,105**	**40.40%**
9.4.2	GASTOS	1,254,802,356	562,751,105	44.85%
9.4.8	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS FUTURAS ANTERIORES	138,209,241	-	0.00%

FUENTE: Ejecución de egresos pasivos exigibles vigencias expiradas vigencia 2024

En el siguiente cuadro, se evidencia que, se establecen los pasivos exigibles de vigencias expiradas para un presupuesto definitivo por $**50,045,242,943**, de los cuales se comprometieron $**48,391,199,665** en el año 2024

Estos recursos corresponden a pasivos exigibles vigencia 2023 por $**26,942,552,771**, pasivos exigibles vigencias futuras 2022 por **$21,127,976,337**; pasivos exigibles vigencias futuras 2021 por $**581,702,239,** pasivos exigibles vigencias anteriores por $**1,393,011,597.**

Tabla 67 COMPARATIVO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2025 Y 2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	2025	2024	VARIACION % COMPROMISOS
		COMPROMISOS	COMPROMISOS	
9	**PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS**	**48,391,199,665**	**39,092,205,132**	**19. 22%**
9.1	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2025**	**26,289,054,218**	**17,908,635,908**	**31.88%**
9.1.2	GASTOS	22,323,460,668	17,865,172,908	19.97%

9.1.8	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS FUTURAS 2024	3,965,593,551	43,463,000	98.90%
9.2	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2023**	**20,976,576,687**	**6,173,469,202**	**70.57%**
9.2.2	GASTOS	20,976,576,687	5,567,453,215	73.46%
9.3	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2022**	**562,817,655**	**2,487,561,516**	**-341.98%**
9.3.2	GASTOS	562,817,655	2,487,561,516	-341.98%
9.4	**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES**	**562,751,105**	**12,522,538,505**	**-2125.24%**
9.4.2	GASTOS	562,751,105	7,281,487,833	-1193.91%
9.4.8	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS FUTURAS ANTERIORES	-	5,241,050,672	0.00%

FUENTE: Ejecución de gastos comparativo pasivos exigibles vigencias expiradas vigencia 2024-2023

Con respecto al cuadro comparativo de los pasivos exigibles vigencias expiradas 2025-2024, se estableció, una disminución del porcentual del **19.22%,** indica que se realizó una buena gestión, para disminuir los pasivos exigibles

Reservas Presupuestales

Vigencia actual

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 15 INCONSISTENCIAS EN RESERVAS PRESUPUESTALES.

CONDICIÓN: Para la vigencia fiscal 2025, se constituyeron Reservas presupuestales mediante la Resolución No. 005 del 05 de enero de 2026 por valor de $**267.927.793.432,53**, valor que no es concordante con el resultado de comparar en el formato F07_AGR de donde se registran compromisos por valor de $**2,538,338,724,500**, menos obligaciones por valor de $**2,106,871,743,918**, valores que determinan que se debe constituir reservas por valor de $**431,466,980,582**, las cifras anteriores generan una diferencia por valor de $**163.539.187.150**

CRITERIO: 1) Artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación (Decreto 111 de 1996)" …. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido; siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.2) Articulo 29 Parágrafo 1 2) Decreto de liquidación No. 501 del 22 de diciembre de 2020, en su Artículo 29 Parágrafo 1 *"La constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre se hará de acuerdo con su normatividad vigente por la Secretaria de Hacienda; para su constitución, estas deberán ser justificadas por las unidades ejecutoras. En todo caso estas serán constituidas para situaciones extraordinarias bajo la responsabilidad del ente ejecutor quien debe presentar la respectiva justificación*

para su constitución "3) Articulo 29 Parágrafo 1 del Decreto 501 del 22 de diciembre de 2020 concordante a lo consignado en el Concepto No 001 del 13 de julio de 2006 emitido por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.

CAUSA: La información presentada en el acto administrativo difiere de la presentada, en el formato F07_AGR de la plataforma SIA CONTRALORIAS.

EFECTO: La información no confiable para la evaluación de la gestión presupuestal

Los responsables en la respuesta a este numeral, no precisaron con objetividad la observación formulada por tanto se confirma la observación, por ser responsabilidad de las sectoriales de la Gobernación de Boyacá determinar el porqué, se constituyen reservas de poco valor, así las cosas, se configura como hallazgo administrativo **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 15** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA ANTERIOR

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 16 INCONSISTENCIAS EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL.

CONDICIÓN: Para la vigencia fiscal 2024, se constituyeron Reservas presupuestales mediante la Resolución No. 005 del 02 de enero de 2025 por valor de $**90.642.588.009**, con pagos por valor de **$63.580.747.26** quedando un saldo por pagar en la suma de $**17.942.394.021**, es decir no fueron canceladas todas las reservas.

CRITERIO: 1) Artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación (Decreto 111 de 1996)" …. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido; siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.2) Articulo 29 Parágrafo 1 2), en su Artículo 29 Parágrafo 1 "La *constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre se hará de acuerdo con su normatividad vigente por la Secretaria de Hacienda; para su constitución, estas deberán ser justificadas por las unidades ejecutoras. En todo caso estas serán constituidas para situaciones extraordinarias bajo la responsabilidad del ente ejecutor quien debe presentar la respectiva justificación para su constitución* "3) Articulo 29 Parágrafo 1 del Decreto 501 del 22 de diciembre de 2020 concordante a lo consignado en el Concepto No 001 del 13

de julio de 2006 emitido por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda

CAUSA: Falta de diligencia en el reconocimiento de sus obligaciones, máxime cuando estas por su cuantía son fáciles de atender. Evidenciándose una vez más la falta de seguimiento y revisión de las cuentas que real y legalmente se deben constituir como reserva, aunado a la falta de calidad en la información reportada.

EFECTO: Evitar posibles demandas por la mora en el respectivo pago y falta de depuración de saldos poco significativos.

Aunque la respuesta está bien sustentada, la comisión auditora considera que las cuentas por pagar de vigencias anteriores, debiera constituirse como pasivos exigibles vigencias expiradas, y formar parte de la ejecución presupuestal, dentro de este grupo, por tanto, se ratifica la observación, como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 16** para que sea incluido en el plan de mejoramiento

Cuentas por pagar

Vigencia actual.

Para la vigencia fiscal 2025, se constituyeron cuentas por pagar presupuestales mediante la Resolución No. 005 del 02 de enero de 2026 por valor de $**52.221.622.314.78**, de los cuales $**353.170149.57**, corresponde a ordenes de paga causadas, con registros presupuestales de la vigencia 2025, y $**51.868.452.165.21** valor que corresponde a cuentas por pagar, vigencia 2025. Por tanto, el valor es concordante con el resultado de comparar en el formato F07_AGR de 2025, donde se registran obligaciones por valor de $**2.106.871.743.918.08**, menos pagos por valor de $**2.055.003.291.752.87**, valores que determinan que se debe constituir cuentas por pagar por valor de **$**51.868.452.165.21, las cifras anteriores no generan diferencias.

Vigencia anterior

Se verificaron 146 cuentas por pagar por valor de **$29.773.948.903.56** tomadas de la Resolución 002 del 05 de enero de 2024, a las cuales se les hizo seguimiento del proceso presupuestal, referente a los pagos efectuados en la vigencia 2025, y se estableció que revela pagos en el formato F11_agr 202507, por valor de $**29.773.948.903.56,** encontrando que se pagó de acuerdo a lo constituido por tanto se determina un resultado satisfactorio en el proceso de revisión.

Expuesto lo anterior y respecto a la constitución de reservas y cuentas por pagar se evidencia

1. Articulación entre las dependencias involucradas de la Secretaria de Hacienda y demás, como es el caso de Presupuesto y Contratación para establecer con exactitud los compromisos que se generen como reservas presupuestales y cuentas por pagar, propiciando que se expidan actos administrativos con cifras y compromisos alejados de la realidad

2. Respecto al ejercicio de supervisión, procesos y unificación de criterios, responsabilidades, plazos de entrega de la información, requisitos para la configuración de actas de recibo a satisfacción y de liquidación; parámetros respecto a la justificación legal de las reservas presupuestales y configuración legal de las cuentas por pagar

3. seguimiento desde su constitución, términos de ejecución, de pago y cierre del proceso y depuración de las mismas, en articulación con las dependencias involucradas.

12.2.2. Gestión Contractual

La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, rindió un total de 3.887 contratos por valor de $801.367.160.860 con adiciones por valor de $43.014.026.507 para un total por valor de $844.381.187.367, reflejados en la vigencia auditada en el SIA OBSERVA y SECOP, cuya fuente de financiación con recursos propios fueron 1100 contratos por valor total de $84.000.659.612, del SGP se realizaron 336, con valor total de $14.242.502.573, de Regalías 2.112 contratos y otros 339 contratos; de los cuales para el desarrollo de la auditoría se determinó una muestra de 63 contratos, equivalente al 10.92% de la ejecución de los recursos, por la suma de $92.179.173.522.40; más los convenios interadministrativos Nos.: 0657 y 3261 de 2025, por valor total de $16.591.972.880.

Gestión Documental en Contratación

La gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientesa la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por lasentidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta están actividades a continuación se publican los Instrumentos Archivísticos implementados en el Departamento Administrativo de FunciónPública, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" y demás disposiciones emitidas por el Archivo

General de la Nación – AGN.

De conformidad con la Ley 594 de 2000, en su artículo 11, se establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos, la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original y el ciclo vital de los documentos. Asimismo, el artículo 16 ibidem, prescribe que los secretarios generales o funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos dentro del proceso de organización de archivos, deben verificar que en cada expediente los documentos se encuentren ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción ysu disposición refleje el vínculo que se establece entre el funcionario y la entidad.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 17. FALTA PROCEDIMIENTO CIERRE CONTRACTUAL.

CONDICIÓN: Se vislumbra la falta de implementar el procedimiento de cierre de expediente a fin de cumplir con la normatividad a fin de evitar riesgos en el control del vencimiento de los términos de las pólizas de garantía y en el control y seguimiento a la gestión documental.

Para la Contraloría General de Boyacá el punto central de esta observación además de lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 es el manejo y organización de la documentaciónproducida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización, control, conservación y seguridad guardando los principios de la gestión documental de la Ley General de Archivo; indiferentemente si dentro de proceso contractual haya o no constituido pólizas de aseguramiento.

CRITERIO: Analizado los expedientes que contienen la información de la contratación de LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ; se verifica que se encuentran foliados respetando el principio de orden original yconservando la integridad de la unidad documental o unidad archivística. Sin embargo, no se evidencia la elaboración del acta o constancia del cierre del expediente del proceso de contratación una vez vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes según lo preceptúa el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082, obligaciones posteriores a la liquidación.

CAUSA: Descuido y falta de implementar el procedimiento de cierre de expediente a fin de cumplir con la normatividad.

EFECTO: Riesgos en el control del vencimiento de los términos de las pólizas de garantíay en el control y seguimiento a la gestión documental.

Se confirma la Inexistencia de un lineamiento estandarizado de post-contratación para la implementación y aplicación de un procedimiento formal para el cierre de expedientes contractuales. Por lo anteriormente expuesto se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 17**, para tener en cuenta en el plan de mejoramiento.

Manual de Contratación

La actividad contractual de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ como entidad pública del orden territorial, en materia de contratación está regida por los principios rectores de la Función Administrativa consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, elEstatuto General de Contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 que reglamentó la Ley 1150 de 2007.

Analizada la información allegada a la auditoría se observa que el manual de Contrataciónde la GOBERNACION DE BOYACA se encuentra actualizado toda vez que este documento data del de agosto del año 2024, cuya reglamentación se fundamenta en normas como el Decreto 777 del 16 de mayo de 1993 el cual fue derogado por el artículo 11 del Decreto 92 de 20017; el Decreto 1510 de 2013 derogado en virtud del artículo 3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. Además, incluye la reglamentación para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de conformidad con el artículo 355 de la Constitución Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017.

Se colige que la Entidad Territorial cumple lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.5.3. delDecreto 1082 de 2015 el cual establece que las entidades estatales deben contar con un manual de contratación elaborado de acuerdo a los lineamientos señalados por la AgenciaNacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente.

Principio de Publicidad o Transparencia

El principio de publicidad en materia de contratación lo define la Corte Constitucional mediante Sentencia C-711 del 12 de septiembre de 2012 M.P. Mauricio González Cuervo en los siguientes términos*: "La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto delos derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares delejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado*

Social de Derecho (C.P. Art.209). Dicho principio permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a losciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público".

Es necesario que la administración debe dar a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información.

En desarrollo del principio de publicidad de las actuaciones de la administración pública, la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y losactos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes asu expedición o en el cumplimiento de los términos de la publicación según el cronogramadel proceso. Los representantes legales de las entidades estatales definidas en el Artículo2º de la Ley 80 de 1993 y los ordenadores del gasto, tienen la obligación constitucional y legal de dar publicidad a los procesos contractuales de conformidad con lo establecido enla Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Principio de Planeación

Uno de los principios que rigen la contratación estatal es el de la PLANEACIÓN el cual, sibien es cierto no fue nombrado como tal expresamente en el Estatuto General de la Contratación; se desprende con absoluta claridad del principio de economía consagrado en el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Numeral 12 donde se establece que *"con la debidaantelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos decondiciones o términos de referencia"*.

Los estudios previos son un documento que justifica los procesos contractuales que se desarrollan en el marco de la Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación, Ley 1150 del 16 de julio de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficienciay la transparencia en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario No 1082 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector administrativo de Planeación nacional. Normas en las cuales se detallan la información técnica, económica, financiera y jurídica del servicio o bien que se desea contratar con el objeto de suplir la necesidad identificada que da origen a la contratación.

Los errores en la aplicación del principio de planeación en los estudios previos se reflejanen la contratación evaluada, pues de ellos se desprenden la aplicación de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Nacional como guías fundamentales de la función pública. En los estudios previos se deben establecer la necesidad a satisfacer y las condiciones con las cuales semedirá o evaluará la gestión del contratista frente a las actividades pactadas; debilidades encontradas a lo largo de las etapas contractuales verificadas por el auditor.

La falta de una elaboración adecuada de los estudios previos no garantiza el cumplimientode los principios de la contratación toda vez que existen riesgos de que se incurra en altosprecios en detrimento patrimonial, pérdida de credibilidad de la entidad, baja calidad en productos adquiridos e incumplimiento del objeto contractual, entre otras. Las citadas falencias son citadas en forma precisa dentro del presente informe.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 18 CONVENIO 2344/2024 CON INCONSISTENCIAS



CÓDIGO CONTRATO	2024	(820000107) FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	$ 800.000.000	2024/11/20	9	7	77,8 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-2344-2024	Precontractual	2	2	100,0 %
CV-GB-2344-2024	Contractual	7	5	71,4 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	4	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	3	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	7	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	PE-GB-006-2024
# CONTRATO	Convenio de Asociación No. 2344/2024
CONTRATISTA	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA
OBJETO	AUNAR ESPUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y GESTIÓN

VALOR	$ 799.999.999.96
ADICIONAL	$ 391.472.745,44
VALOR TOTAL	$ 1.191.472.745,40
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación régimen especial (con ofertas)

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: Verificados los soportes de pago de la Parcial # 1. No se encuentra reflejado el Plan y plazo de inversión del Anticipo y no está validado por parte del supervisor la inversión hecha por el Fondo en cada uno de los ítems para determinar el valor a reconocer. Los soportes fueron publicador por el Proveedor en la plataforma.

Con fecha 11/09/2024; se publican 2. informes con diferente denominación y contenido idéntico en 6 folios advirtiendo extemporaneidad en la publicación de 11 días.
Con fecha 18/09/2024 se suscribe adicional equivalente al 48.9%; sin que medie un informe de la inversión del aporte del FONDO, equivalente a $ 90.000.000. Según se estableció en la cláusula Quinta del Convenio.

Los informes que dan cuenta de la ejecución son publicados por el supervisor con más de 8 días de extemporaneidad.

Dentro de las evidencias de Liquidación del Convenio, se allegan fotografías sin fecha ni descripción lo cual no permite confrontar lo planeado con lo ejecutado. Igualmente, dentro de los soportes se perciben documentos denominados Ordenes a la ejecución del del CONVENIO 2344 de 2024. En ninguno de los informes presentados por la supervisión se cuantifico el aporte del Fondo Mixto**.**

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación
EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Una vez analizados los argumentos y soportes allegados por la entidad frente a la observación notificada, la comisión auditora determina que la respuesta no desvirtúa totalmente el hallazgo; por cuanto queda plenamente demostrado la ruptura temporal del principio de publicidad; La manifestación de voluntad de la entidad de *"implementar acciones de mejora"* no subsana la irregularidad cometida durante la vigencia auditada; por tanto, se acepta únicamente como el insumo obligatorio para la construcción del Plan de Mejoramiento Institucional y se consolida como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 18** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 19 CONVENIO 3848/2024 DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Ilustración 34



Tabla 68

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-3809-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **3848/2024**
CONTRATISTA	UPTC
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ENTIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL APROVECHAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE APRENDIZAJE EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	$ 602.065.000,00
ADICIONAL	$ 284.603.150,00
VALOR TOTAL	$ 886.668.150,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria.
CONDICION: Precontractual. La propuesta que presentó la UPTC no se publicó. **Contractual**. El primer desembolso del 50% estaba condicionado a "entrega del plan operativo, cronograma de actividades y hojas de vida del personal". Verificado en plataforma este requisito no se encontraba cumplido al momento del pago.

Conforme el Estudio previo el personal corresponde a:

Ilustración 35

Coordinador del proyecto	Coordinador del proyecto con estudios doctorales que cumpla el rol de coordinación del Proyecto durante 4 meses	4	$ 3.286.500,00	$ 13.146.000,00
Profesionales con posgrado para orientación pedagógica y ejecución de los ejes	7 profesionales con estudios posgraduales (maestría y/o especialización) y experiencia académica y/o en ejecución de proyectos que acompañen la ejecución de los ejes durante 4 meses	28	$ 3.286.500,00	$ 92.022.000,00
Apoyo a la dirección y coordinación en las gestiones administrativas propias de la ejecución del proyecto	Personal con estudios técnicos, tecnológicos o profesionales con experiencia en gestión administrativa y/o ejecución de proyectos y desarrollo de actividades propias en materia de apoyo administrativo y financiero en el proyecto	8	$ 2.275.000,00	$ 18.200.000,00

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Según trazabilidad únicamente se publicaron 10 hojas de vida; no se encuentra ningún soporte de vinculación y el cargo que desempeñaron en el proyecto.

Con fecha 3 de marzo de 2025, se suscribe adicional al convenio equivalente al argumentando que su ejecución se encontraba aproximadamente en el 90% ejecución física y financiera sin que la misma se refleje en la plataforma.

En la trazabilidad de pagos el pago # 3 se encuentra rechazado es hasta por la suma de $227.682.520; no tiene soportes que permitan ver la trazabilidad del trámite; sin embargo, en el acta de liquidación se reconoce como pago realizado.

Las planillas de soporte, se encuentran borrosas, razón por la cual no se puede verificar que la cobertura y alcance se encuentre cumplido a satisfacción. Los informes y soportes de ejecución se encuentran publicados con extemporaneidad. En ninguno de los informes presentados por la supervisión se reflejó y/o valido los aportes ofrecidos por parte de la UPTC.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Se mantiene la observación; La entidad no aporta pruebas, informes, ni actas suscritas por la supervisión/interventoría que certifiquen el porcentaje de ejecución alegado a la fecha de la suscripción del adicional, configurándose un silencio documental que no desvirtúa la observación inicialmente planteada, al no aclara ni desvirtúa la observación formulada y se solicita dentro de las acciones correctivas del informe de auditoría que la entidad implemente un control estricto que impida la suscripción de prórrogas o adiciones sin la validación previa de los informes de supervisión en plataforma, se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 19** para ser incluido en el plan de mejoramiento.

Por otra parte, Al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad. **Esta condición particular se considera SUBSANADA Y UN BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA**


- **Descripción del Beneficio:** Restablecimiento del Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica del proponente **UPTC** dentro del Convenio Interadministrativo **CONVENIO 3848/2024.**

- **Impacto en la Gestión:** A partir de la observación de auditoría notificada por este despacho, el sujeto de control (**Gobernación de Boyacá**) realizó las gestiones correctivas inmediatas para el cargue de la propuesta que se encontraba oculta o ausente en el sistema.

- **Valor Agregado:** Si bien la omisión inicial existió, la intervención oportuna de la Contraloría garantizó que el proceso recuperara la transparencia requerida, permitiendo a los ciudadanos y entes de control ejercer la veeduría correspondiente sobre los requisitos que dieron origen a la contratación. Esto fortalece el control interno institucional y eleva el índice de legalidad contractual de la entidad.

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 CONVENIO 4003/2024 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 36

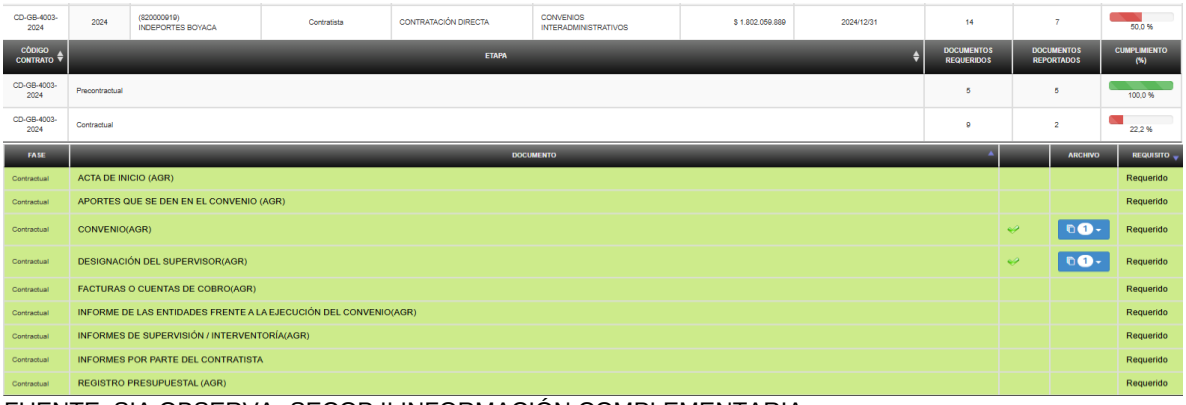

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-4003-2024	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-4003-2024	Contractual	9	2	22,2 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORME DE LAS ENTIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Tabla 69

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-3985-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 4003 DE 2024
CONTRATISTA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS DE DEPORTES CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO QUE REPRESENTAN AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES VERSIÓN I.
VALOR	$ 2.099.109.889.00
ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	$ 2.099.109.889.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación Directa

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: Una vez revisado el expediente en la plataforma SECOP II se encuentra que el gasto no está justificado, pese a que el 24 de diciembre de 2025 se firma un acta de recibido a satisfacción en la cual advierte de devolución de recursos al departamento junto con rendimientos financieros; en la plataforma no se encuentra soporte de ejecución. La supervisión e INDEPORTES incumplieron con las obligaciones señaladas en el convenio clausula novena.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni

los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.


CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

El equipo auditor constató que los recursos fueron ejecutados y se aportó evidencia del trámite de devolución de saldos no ejecutados y rendimientos financieros. Por lo tanto, se desvirtúa una posible connotación fiscal por daño al patrimonio público. No obstante, lo anterior, la respuesta de la entidad no desvirtúa la deficiencia de control interno, la inobservancia normativa, ni el incumplimiento contractual (cláusula novena**)** detallados en la condición inicial. La publicación de los soportes en la plataforma **SECOP II** se realizó de forma posterior y motivada únicamente por la acción de control fiscal, vulnerando con ello el principio de **publicidad, transparencia y oportunidad** en la contratación estatal, según los términos obligatorios fijados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Por tanto, se exhorta para que se realice el Plan de Mejoramiento Institucional y se consolida como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 20.**

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 21 CONVENIO 4270/2024 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 37

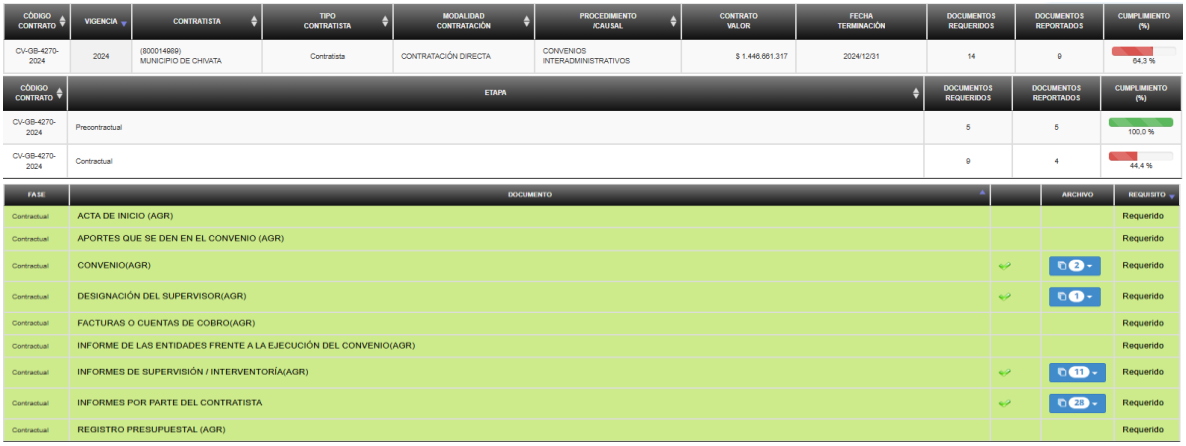

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4270-2024	2024	(800014989) MUNICIPIO DE CHIVATA	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	$ 1.446.661.317	2024/12/31	14	9	64.3 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4270-2024	Precontractual	5	5	100.0 %
CV-GB-4270-2024	Contractual	9	4	44.4 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORME DE LAS ENTIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	11	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	28	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido


Tabla 70

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4236-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4270 DE 2024
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CHIVATA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIVATA.
VALOR	$1.591.424.184,09
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$1.591.424.184,09
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: Una vez revisado el expediente en la plataforma SECOP II, se evidencia la publicación extemporánea de los informes de avance de ejecución. El acta parcial # 1 se giró sin el lleno de requisitos, por cuanto no se encuentra publicada el Acta Parcial y los informes de avance a fecha 30/05/2025.

Ilustración 38

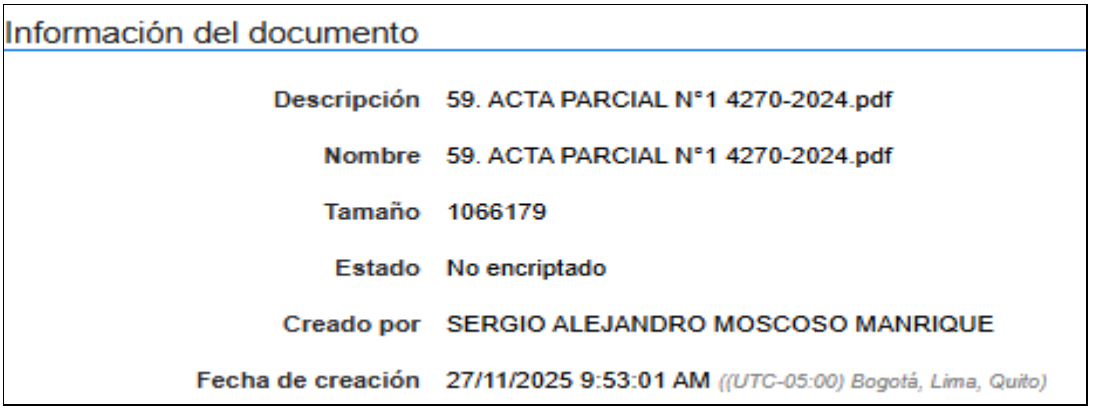

En la liquidación se dejan aclaraciones y observaciones a saber 1. Se aclara que el presente balance presupuestal no incluye el aporte adicional que el municipio de Chivatá realizó con ocasión al convenio de administración delegada C-MCHIV-CI-002-2025 por un valor de $ 47.742.725,00 con la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S. 2. De igual manera se realizó ajuste a los precios de los ítems 1.15 SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED 60W TIPO O FORMA CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 8.001 A 12.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN y el ítem 1.16 SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED 80W TIPO O FORMA CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 8.001 A 12.640 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN. de conformidad con el acta de modificación de fecha 03 de junio de 2025 por las razones allí expuestas.
Sin embargo, analizado el concepto de modificación se habla de un menor valor en los precios referentes.
CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo

5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.


EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

El equipo auditor ratifica las observaciones hechas al convenio de la referencia y se ratifica el cumplimiento de la manifestación de voluntad de la entidad de *"implementar acciones de mejora*, insumo obligatorio para la construcción del Plan de Mejoramiento Institucional y se consolida como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 21 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.**

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 22 CONVENIO 4362/2024 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 39

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4362-2024	2024	(820000107) FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	$ 14.560.000.000	2024/12/31	9	7	77,8 %

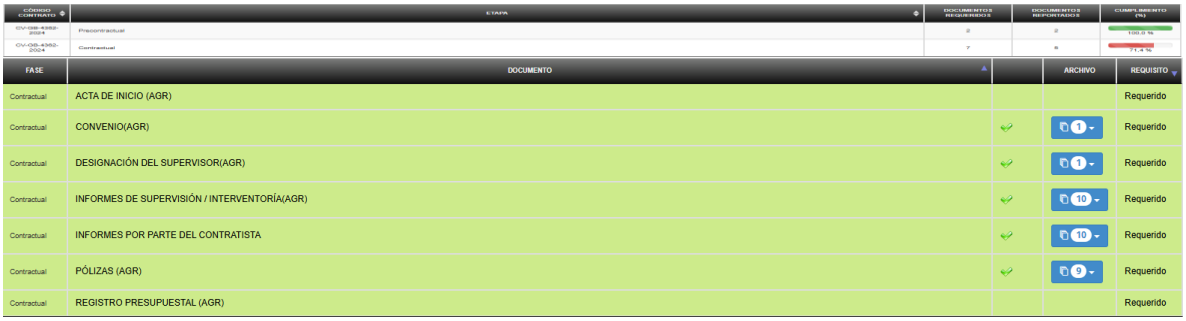

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4362-2024	Precontractual	2	2	100.0 %
CV-GB-4362-2024	Contractual	7	5	71.4 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	10	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	10	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	9	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

Tabla 71

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	PE-GB-015-2024
# CONTRATO	Convenio de Asociación No. 4362/2024
CONTRATISTA	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA
OBJETO	EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	$ 14.560.000.000.00
ADICIONAL	$ 5.200.000.000.00
VALOR TOTAL	$ 19,760,000,000.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación régimen especial (con ofertas)

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: No se exhibe la propuesta presentada por el Fondo Mixto. En desarrollo del convenio se suscriben 3 adicionales hasta por 35% del valor del contrato. Revisados los antecedentes del mismo en los informes no se encuentra reflejada la inversión de los ofrecimientos adicionales hechos por el Fondo Mixto equivalentes a $842.000.000.00. Dentro de la inversión y planeación de cumplimiento del convenio el día 28 de diciembre de 2024, se suscribe CONTRATO **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARTISTICOS CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y ARTES DE BOYACÁ Y JUAN GUILLERMO SARMIENTO VALENZUELA. Por valor de $** $ 1.004.200.000,00 MCTE y por un periodo de Del 28 de diciembre de 2024 al 20 de enero de 2025. Claramente se encuentra por fuera de los términos contractuales firmados toda vez que el Convenio 4362/2024 tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2025.

Se confirma igualmente que el Convenio 4362/2024, fue suspendido a partir de las 31/12/2024 9:26:11 AM y reiniciado el día 2/01/2025 4:09:55 PM; y en ejecución se están reconociendo eventos de las 2 fechas citadas; con los soportes

documentados no se puede confirmar la hora de los eventos de **LUIS CAMPOS** en Soatá **y RAFA PÉREZ** en Sutatenza.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Se mantiene en firme la observación No. 22 del Convenio 4362/2024 tras determinar que la respuesta de la Gobernación de Boyacá constituye una defensa genérica que no justifica la no inversión de $842.000.000 de contrapartida ni la ejecución extemporánea de un subcontrato por lo tanto se constituye un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 22** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 23 CONVENIO 4394/2024 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 40



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4394-2024	2024	(891800330) UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	$ 410.359.500	2024/12/31	14	9	64,3 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4382-2024	Precontractual	2	2	100,0 %
CV-GB-4382-2024	Contractual	7	5	71,4 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	10	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	10	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	9	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

Tabla 72

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4324-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4394/2024
CONTRATISTA	UPTC
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE POBLACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA, VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR	$ 525.146.500,00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 525.146.500,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria.

CONDICION: La propuesta que presentó la UPTC no se publicó. Documentos soporte de legalización publicados con extemporaneidad como RPC, aprobación de pólizas.

Se evidencia desgaste administrativo e incumplimiento en el trámite de pagos; se registra devolución de acta parcial y no se vuelve a tramitar; se incumple con la amortización de anticipo que refiere la cláusula cuarta del convenio.

No fue posible confirmar el cumplimiento de la obligación específica # 13. Consistente en la trasferencia de rendimientos trimestrales. Desde el 19 de diciembre de 2024. No se encuentra publicado la certificación que expidiera el Banco correspondiente. Revisados los anexos soporte de informes que se encuentran publicados se evidencia el reporte de ejecución únicamente de:

Tabla 73

ESTERILIZACIONES QUIRÚRGICAS PARA PERROS Y GATOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD							
JORNADA No	FECHA	LUGAR	CANINOS		FELINOS		
			MACHOS	HEMBRAS	MACHOS	HEMBRAS	TOTAL
1	02/12/2024	RAMIRIQUI	8	59	12	21	100
2	03/12/2024	CHIQUINQUIRA	12	47	19	47	125
3	04/12/2024	SOTAQUIRA	14	63	9	17	103
4	05/12/2024	CHIQUINQUIRA	11	51	25	32	119
5	09/12/2024	JENESANO	3	80	1	17	101
6	10/12/2024	NOBSA	5	33	21	18	77
7	11/12/2024	SAMACA	4	55	15	35	109
8	12/12/2024	NOBSA	8	33	24	23	88
TOTAL							822

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

Servicios que corresponden a un 28.34%. de los contratados. Sin embargo, el acta de liquidación reconoce pago por el 100%.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie

un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.


Se mantiene la Observación al no aclara ni desvirtúa las observaciones formuladas y se solicita dentro de las acciones correctivas del informe de auditoría que la entidad implemente un control estricto para la publicación de informes de supervisión y plataforma, los cuales deben contener los requisitos mínimos que exige el convenio suscrito, por lo que se configura como **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 23** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

De otra parte, Al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad. **Esta condición particular se considera SUBSANADA Y UN BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA**

- **Descripción del Beneficio:** Restablecimiento del Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica del proponente **UPTC** dentro del Convenio Interadministrativo **CONVENIO 4394/2024.**
- **Impacto en la Gestión:** A partir de la observación de auditoría notificada por este despacho, el sujeto de control (**Gobernación de Boyacá**) realizó las gestiones correctivas inmediatas para el cargue de la propuesta que se encontraba oculta o ausente en el sistema.
- **Valor Agregado:** Si bien la omisión inicial existió, la intervención oportuna de la Contraloría garantizó que el proceso recuperara la transparencia requerida, permitiendo a los ciudadanos y entes de control ejercer la veeduría correspondiente sobre los requisitos que dieron origen a la contratación. Esto fortalece el control interno institucional y eleva el índice de legalidad contractual de la entidad.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 24 CONVENIO 4503/2024 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 41

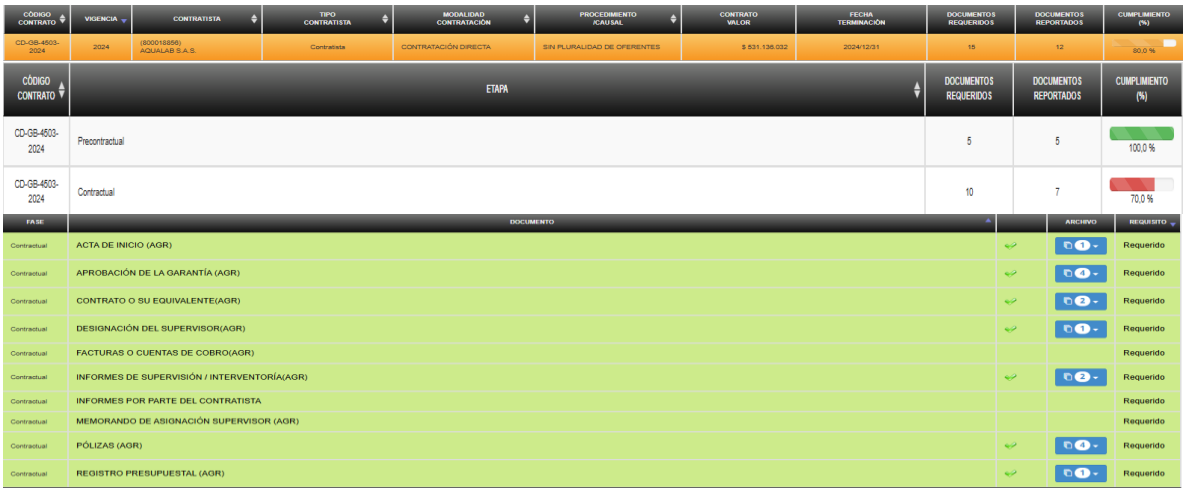

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-4503-2024	2024	(800018856) AQUALAB S.A.S.	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	SIN PLURALIDAD DE OFERENTES	$ 531.136.032	2024/12/31	15	12	80,0 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-4503-2024	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-4503-2024	Contractual	10	7	70,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓	4	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA			Requerido
Contractual	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN SUPERVISOR (AGR)			Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	4	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 74

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4354-2024
# CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4503 DE 2024
CONTRATISTA	AQUALAB SAS
OBJETO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO DE AGUAS
VALOR	$ 531.136.032.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 531.136.032.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: La propuesta no se encuentra publicada. En el módulo de ejecución se encuentran documentos cargados por el supervisor que no corresponden al contrato *(Acta de Inicio Sampler Ajustada Firmada. Pdf*). La publicación de acta de inicio se encuentra extemporánea en 8 días. La información consignada en los informes 1 y 2 respecto a la iniciación del contrato se encuentra errada. Igualmente, estos informes se publicaron por fuera de los términos de ley.

De acuerdo al Manual de Pagos de la Entidad (**CÓDIGO: A-GF-GI-M-003)**, se requiere Comprobante Entrada Almacén y acta de recibo Suministros Almacén

(Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de consumo y/o devolutivos); lo cual no se encuentra publicado. La publicación de egresos se realiza extemporánea en 11 días.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Se mantiene la Observación al no **aclara** ni desvirtúa las observaciones formuladas y se solicita dentro de las acciones correctivas del informe de auditoría que la entidad implemente un control estricto para la publicación de informes de supervisión e plataforma, los cuales deben contener los requisitos mínimos que

exige el contrato suscrito, por lo que se configura como **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 24** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

De otra parte, Al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad. **Esta condición particular se considera SUBSANADA y se configura como UN BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA**

- **Descripción del Beneficio:** Restablecimiento del Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica del proponente **AQUALAB SAS** dentro del Contrato 4503/2024.
- **Impacto en la Gestión:** A partir de la observación de auditoría notificada por este despacho, el sujeto de control (**Gobernación de Boyacá**) realizó las gestiones correctivas inmediatas para el cargue de la propuesta que se encontraba oculta o ausente en el sistema.
- **Valor Agregado:** Si bien la omisión inicial existió, la intervención oportuna de la Contraloría garantizó que el proceso recuperara la transparencia requerida, permitiendo a los ciudadanos y entes de control ejercer la veeduría correspondiente sobre los requisitos que dieron origen a la contratación. Esto fortalece el control interno institucional y eleva el índice de legalidad contractual de la entidad.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 25 CONVENIO 4586/2024 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 42



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4586-2024	2024	(804002801) GASES DEL SUR DE SANTANDER GASUR S.A.E.S.P.	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	$ 515.504.400	2024/12/31	9	7	77,8 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4586-2024	Precontractual	2	2	100,0 %
CV-GB-4586-2024	Contractual	7	5	71,4 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	1	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

Tabla 75

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4511-2024
# CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4586 DE 2024
CONTRATISTA	GASUR S.A E.S.P.

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO, PARA EL MUNICIPIO DE SOATA, VEREDAS HATILLO Y MOLINOS, MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
VALOR	$ 569.998.800.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 569.998.800
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: La propuesta no se encuentra publicada. Se evidencia falta de planeación en el tiempo de ejecución; por cuanto el proyecto fue aprobado en 3 meses y la ejecución de planea en 16 días y finalmente se ejecuta en 4 meses 16 días. En los soportes publicados no se puede confirmar los usuarios beneficiados con el proyecto.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.


Se mantiene la observación al no **aclara** ni desvirtúa las observaciones formuladas y se solicita dentro de las acciones correctivas del informe de auditoría que la entidad implemente un control estricto para la publicación de informes de supervisión en plataforma. La claridad de los beneficiarios del proyecto es una conducta de transparencia en la inversión de los recursos públicos, **imposibilidad de evaluar el impacto real y el cumplimiento de las metas del proyecto**, y el riesgo inminente de una presunta pérdida de recursos o pago por servicios no prestados, por lo tanto, se configura como **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 25** para que se tenga en cuenta en el plan de mejoramiento.

De otra parte, Al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la entidad. **Esta condición particular se considera SUBSANADA Y UN BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA**

- **Descripción del Beneficio:** Restablecimiento del Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica del proponente **GASUR S.A E.S.P** dentro del Contrato 4586/2024.
- **Impacto en la Gestión:** A partir de la observación de auditoría notificada por este despacho, el sujeto de control (**Gobernación de Boyacá**) realizó las gestiones correctivas inmediatas para el cargue de la propuesta que se encontraba oculta o ausente en el sistema.
- **Valor Agregado:** Si bien la omisión inicial existió, la intervención oportuna de la Contraloría garantizó que el proceso recuperara la transparencia requerida, permitiendo a los ciudadanos y entes de control ejercer la veeduría correspondiente sobre los requisitos que dieron origen a la contratación. Esto fortalece el control interno institucional y eleva el índice de legalidad contractual de la entidad.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 26 CONVENIO 4722/2024 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 43

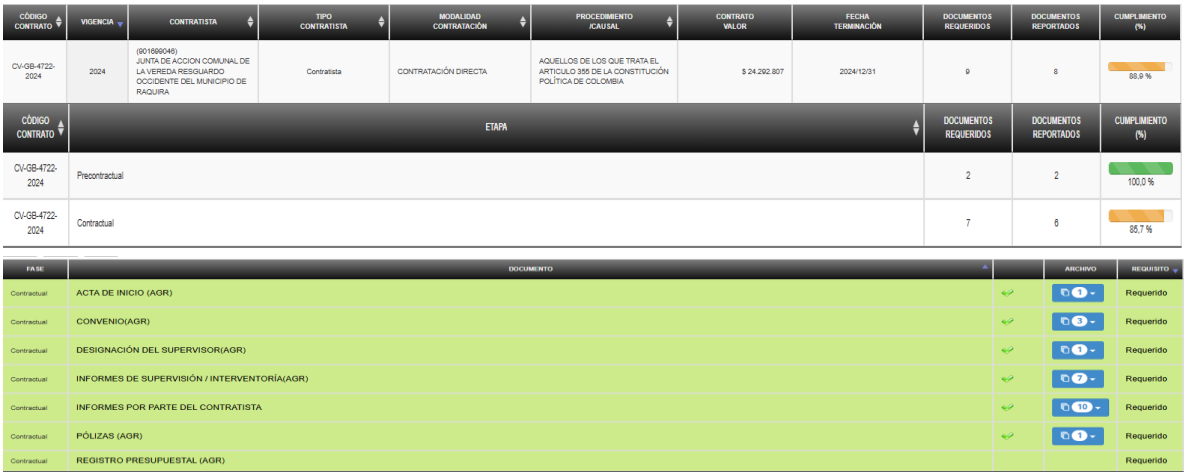

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4722-2024	2024	(901699046) JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA	$ 24.292.807	2024/12/31	9	8	88,9 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4722-2024	Precontractual	2	2	100,0 %
CV-GB-4722-2024	Contractual	7	6	85,7 %

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	3	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	7	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	10	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	1	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido

Tabla 76

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4594-2024
# CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO NO 4722 DE 2024
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
OBJETO	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR	$ 35.657.190,80
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 35.657.190,80
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: La propuesta no se encuentra publicada. Se evidencia falta de planeación en el tiempo de ejecución; por cuanto el proyecto fue aprobado en 1 mes y la ejecución de planea en 4 días y finalmente se ejecuta en tres (03) meses y veinte (20) días.

El cálculo de los rendimientos financieros reconocidos en acta de liquidación no corresponde con la certificación expedida por Banco Agrario. Los mismos se contabilizan desde el 02-07-2025. Se confirma extemporaneidad en la publicación de los informes de ejecución por parte de la Supervisión, superan los 30 días. 2094/2023 - Sin Matriz de Legalidad

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Se mantiene la observación al no aclara ni desvirtúa las observaciones formuladas y se solicita dentro de las acciones correctivas del informe de auditoría que la entidad implemente un control estricto para la publicación y revisión de informes de supervisión en plataforma, por lo que se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 26** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

De otra parte**,** Al verificarse que la oferta fue efectivamente cargada y se encuentra visible en la plataforma SECOP II de conformidad con los soportes aportados por la

entidad. Esta condición particular se considera SUBSANADA Y UN BENEFICIO CUALITATIVO DE LA AUDITORÍA

- **Descripción del Beneficio:** Restablecimiento del Principio de Publicidad y Acceso a la Información Pública en la plataforma SECOP II respecto a la oferta técnica y económica del proponente JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, dentro del Contrato 4722/2024.
- **Impacto en la Gestión:** A partir de la observación de auditoría notificada por este despacho, el sujeto de control (**Gobernación de Boyacá**) realizó las gestiones correctivas inmediatas para el cargue de la propuesta que se encontraba oculta o ausente en el sistema.
- **Valor Agregado:** Si bien la omisión inicial existió, la intervención oportuna de la Contraloría garantizó que el proceso recuperara la transparencia requerida, permitiendo a los ciudadanos y entes de control ejercer la veeduría correspondiente sobre los requisitos que dieron origen a la contratación. Esto fortalece el control interno institucional y eleva el índice de legalidad contractual de la entidad.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 27 CONVENIO 2094/2023 CON INCONSISTENCIAS.

Tabla 77

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-2085-2023
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2094-2023
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MARIPI
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MARIPI PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA
VALOR	$ 486.108.981,20
ADICIONAL	$ 124.755.266,70
VALOR TOTAL	$ 610.864.247,90
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: El concepto de viabilidad, aprobó 3 meses para su ejecución; verificada la ejecución el plazo total corresponde a 11 meses.

Los informes de supervisión se encuentran publicados con extemporaneidad, incumpliendo el Manual de Supervisión. Igualmente se confirma el incumplimiento de las obligaciones del Municipio específicamente en “El Municipio debe presentar mensualmente informe de avance del convenio a la Supervisión del Convenio a partir del acta de Inicio”. Igualmente se incumplió con la obligación de “los rendimientos Financieros deberán ser reintegrados mensualmente al departamento a la cuenta que para ello solicite la supervisión”.

No se encuentran evidencia de ejecución publicadas, para verificación de cumplimiento de beneficiarios atendidos de acuerdo al acta de concertación suscrita con el convenio.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015


CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Se mantiene la observación al no **aclara** ni desvirtúa las observaciones formuladas y se solicita dentro de las acciones correctivas del informe de auditoría que la entidad implemente un control estricto para la publicación de informes de supervisión en plataforma. La claridad de los beneficiarios del proyecto es una conducta de transparencia en la inversión de los recursos públicos, **imposibilidad de evaluar el impacto real y el cumplimiento de las metas del proyecto**, y el riesgo inminente de una presunta pérdida de recursos o pago por servicios no prestados, por lo que se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 27**, para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 28 CONTRATO 1791/2024 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 44

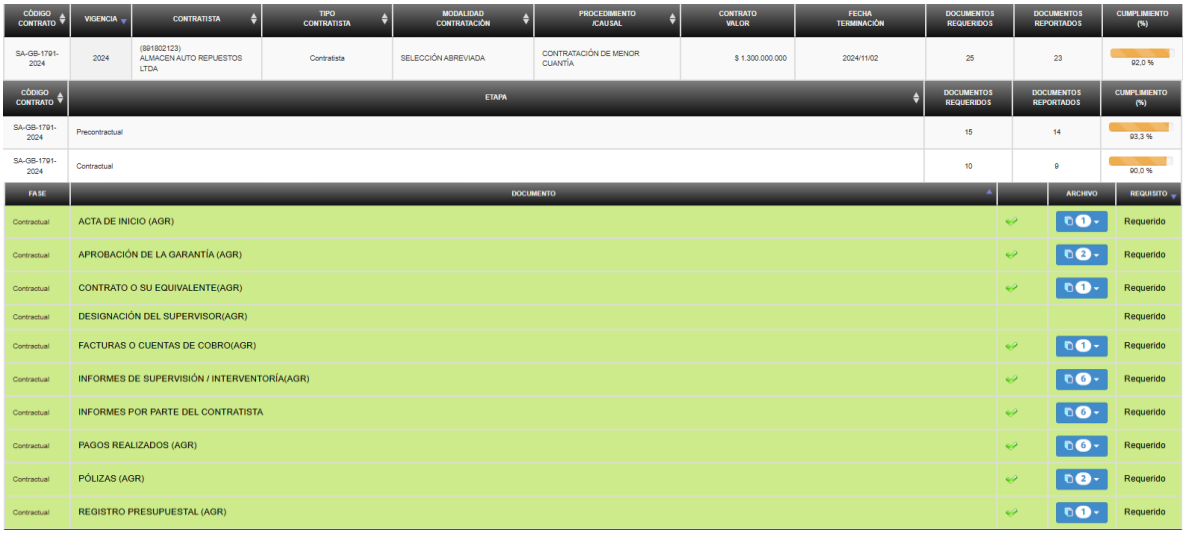

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
SA-GB-1791-2024	2024	(891802123) ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA	Contratista	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA	$ 1.300.000.000	2024/11/02	25	23	92,0 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
SA-GB-1791-2024	Precontractual	15	14	93,3 %
SA-GB-1791-2024	Contractual	10	9	90,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	6	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	6	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	6	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 78

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	SA-GB-002-202
# CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1791 DEL 2024
CONTRATISTA	**ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S**
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	$ 1.300.000.000,00
ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.300.000.000,00

MODALIDAD DE CONTRATACION	Selección abreviada menor cuantía

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: No se encuentra publicado un adecuado protocolo de control y seguimiento de los servicios autorizados para cada vehículo; se hizo un auditaje aleatorio al servicio básico MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO; encontrando que en facturas con 3 días de diferencia de un solo vehículo se reconocen hasta 5 lavadas que equivalen a $ 225.500.00. No se publican soportes que permitan verificar el recibido individual de cada servicio y/o la fecha en que se prestó.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Se evalúa la respuesta emitida por la Entidad vigilada y determina que esta NO desvirtúa las situaciones plasmadas en la condición de la observación. La Entidad omitió presentar los soportes documentales correspondientes (órdenes de servicio, planillas de control de ingreso, bitácoras de kilometraje o actas de recibido a satisfacción) que justificaran la necesidad técnica, razonabilidad y ejecución real de cinco (5) servicios de lavado y aspirado para un mismo vehículo en un lapso de tan solo tres (3) días.

Al no existir un protocolo de control y seguimiento publicado ni evidencias que respalden la trazabilidad de los gastos por valor de $225.500.00, se confirma la falta de idoneidad en la ordenación del gasto y la deficiencia en la supervisión contractual. Por consiguiente, el Ente Auditor lo configura como **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 28** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 29 CONTRATO 0108/2025 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 45

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0108-2025	2025	(23449011) MARIA DEL CARMEN BOTIA CRISTANCHO	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 109.525.110	2025/12/31	16	12	75,0 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0108-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-0108-2025	Contractual	10	7	70,0 %
CD-GB-0108-2025	Poscontractual	1	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	8	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	9	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	4	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido
FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE ENTREGA (AGR)			Requerido

Tabla 79

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-0075-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0108-2025
CONTRATISTA	MARIA DEL CARMEN BOTIA CRISTANCHO

	CESAR FABIAN GARAVITO PALACIOS OMAR ERNESTO GARAVITO PALACIOS
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nº 9-24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 070-207456, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2025
VALOR	$ 109.525.118,00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 109.525.118,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: No se encuentra publicado y confirmado el pago # 3 por valor de $ 27.381.279,50. Sin embargo en el Acta de Liquidación del 31 de diciembre de 2025, se reconoce como PAGADO y se autoriza el pago final; esto impide el cierre del expediente conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 "cierre del expediente es un acto administrativo de trámite obligatorio"

La publicación de informes de avance de ejecución se publica extemporáneas; por parte de la supervisión.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el

objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Analizada la respuesta a esta Observación por parte la Entidad vigilada la cual determina el reconocimiento del hecho establecido por el grupo auditor y reafirma la deficiencia en los controles de la supervisión, por lo tanto, se configura como un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 29** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 30 CONTRATO 0111/2025 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 46

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0111-2025	2025	(1192713815) ALONSO AVILA MONTAÑA	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 12.557.021	2025/12/31	16	12	75,0 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0108-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-0108-2025	Contractual	10	7	70,0 %
CD-GB-0108-2025	Poscontractual	1	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	8	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	9	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	4	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 80

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-0076-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0111-2025

CONTRATISTA	ALONSO AVILA MONTAÑA
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA RED RADIOCOMUNICACIONES DE EMERGENCIAS.
VALOR	$ 13.209.984,00
ADICIONAL	$0
VALOR TOTAL	$ 13.209.984,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: Se evidencia que no se dio cumplimiento a la forma de pago, acordada en el contrato; se reportan únicamente 2 pagos parciales equivalentes a $ 6.604.992.00. Lo anterior no coincide con el reporte del formato F13, que reporta pagos al 100%.

La inexactitud de la información esto impide el cierre del expediente conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 “cierre del expediente es un acto administrativo de trámite obligatorio” . La publicación de informes de avance de ejecución se publica extemporáneas; por parte de la supervisión.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie

un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Analizada la respuesta a esta Observación por parte la Entidad vigilada la cual determina el reconocimiento del hecho establecido por el grupo auditor y reafirma la deficiencia en los controles de la supervisión, por lo tanto, se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 30** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 31 CONVENIO 0177/2025 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 47

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0177-2025	2025	(891855895) ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	$ 42.000.000	2025/02/26	9	7	77,8 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0108-2025	Precontractual	6	6	100,0 %
CD-GB-0108-2025	Contractual	10	7	70,0 %
CD-GB-0108-2025	Poscontractual	1	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	8	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	9	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	4	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 81

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	
# CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACION N. 0177 DE 2025

CONTRATISTA	COTELCO BOYACA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA COTELCO, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE BOYACÁ, EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2025.
VALOR	$ 60.000.000.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 60.000.000.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Régimen Especial

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: Como compromiso de ejecución COTELCO presenta un informe final que describa las actividades realizadas y que contiene los productos definidos en la propuesta presentada, soportes, evidencias y demás documentos requeridos para la liquidación del convenio; sin embargo, el mismo no se encuentra aprobado y/o respaldado por el Supervisor, habida cuenta que no se logra identificar los delegados del departamento para participar en FITUR.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el

objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015


CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Se procedió a verificar la aclaración allegada por el sujeto de control, constatando que el informe de supervisión del 15 de mayo de 2025 se encuentra efectivamente cargado en la plataforma SECOP II. Sin embargo, dicho documento fue indexado de manera errónea en el apartado de 'Modificaciones' y no en el módulo técnico de 'Ejecución/Informes', razón por la cual no fue advertido inicialmente durante las pruebas de auditoría.
En virtud de lo anterior, y al comprobarse la existencia material del soporte y la aclaración sobre los delegados de FITUR, el Ente Auditor determina DESVIRTUAR la presunta falta de aprobación técnica. No obstante, se mantiene la observación debido al inadecuado registro de la información contractual, lo cual afecta el principio de publicidad y dificulta el control ciudadano, configurándose como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 31** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 32 CONTRATO 185/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 48

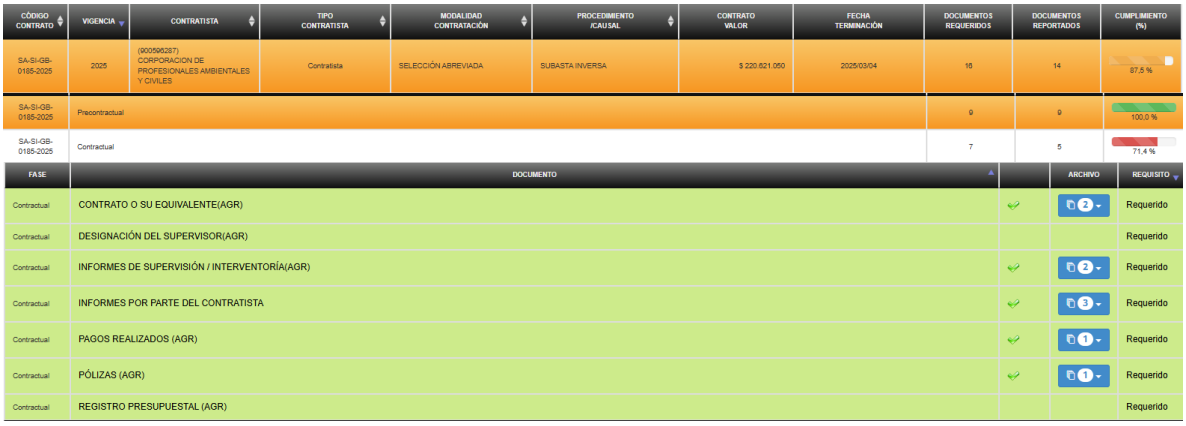

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
SA-SI-GB-0185-2025	2025	(900596287) CORPORACION DE PROFESIONALES AMBIENTALES Y CIVILES	Contratista	SELECCIÓN ABREVIADA	SUBASTA INVERSA	$ 220.621.050	2025/03/04	16	14	87,5 %
SA-SI-GB-0185-2025	Precontractual							9	9	100,0 %
SA-SI-GB-0185-2025	Contractual							7	5	71,4 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	3	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

Tabla 82

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	SA-SI-GB-012-2024
# CONTRATO	Contrato de Suministro No. 185-2025
CONTRATISTA	CORPORACION DE PROFESIONALES AMBIENTALES Y CIVILES
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA BOYACA NOS ALIMENTA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR	$ 220.621.050.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 220.621.050.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	SUBASTA INVERSA

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CONDICION: No se encuentran publicados los soportes que permitan confirmar que se logró satisfacer las necesidades de seguridad y soberanía alimentaria de productores de producción agroecológica a través del suministro de semillas orgánicas adaptadas al clima local, alternativas no químicas para mantener la salud del suelo, control de plagas biológicamente, conocimientos sobre prácticas agroecológicas y sostenibles, mejoras en los sistemas de riego para enfrentar variaciones climáticas, y autonomía en la producción con conservación de conocimientos tradicionales; teniendo en cuenta que no existe informe de beneficiarios por Municipio, ni las conclusiones de los cultivos atendidos. Si bien está la entrega a terceros que recibe el representante legal del Municipio, no se allegan los soportes de entrega a cada beneficiario.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación


EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

El grupo Auditor analiza la respuesta emitida por la Entidad vigilada y determina que los argumentos expuestos NO desvirtúan la condición descrita. La afirmación de la entidad respecto a que no se requería contractualmente la entrega directa o el reporte individualizado por beneficiario adolece de sustento legal y técnico dentro del control de la gestión pública.

En los negocios jurídicos financiados con recursos públicos orientados a sectores vulnerables (productores agroecológicos), la entrega a un tercero (representante legal del municipio) constituye una fase de distribución intermedia, pero NO demuestra el cumplimiento del objeto social ni la satisfacción de las necesidades de seguridad y soberanía alimentaria. La ausencia de planillas de entrega a los beneficiarios finales, así como la inexistencia de informes técnicos y conclusiones de los cultivos atendidos, impide a este Ente Auditor verificar la destinación real del gasto, la veracidad de la inversión y el cumplimiento de los fines estatales, configurando una grave omisión en el ejercicio de la supervisión contractual. Por lo expuesto se determina como un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 32 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA**, igualmente, para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 33 CONTRATO 0253/2025 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 49

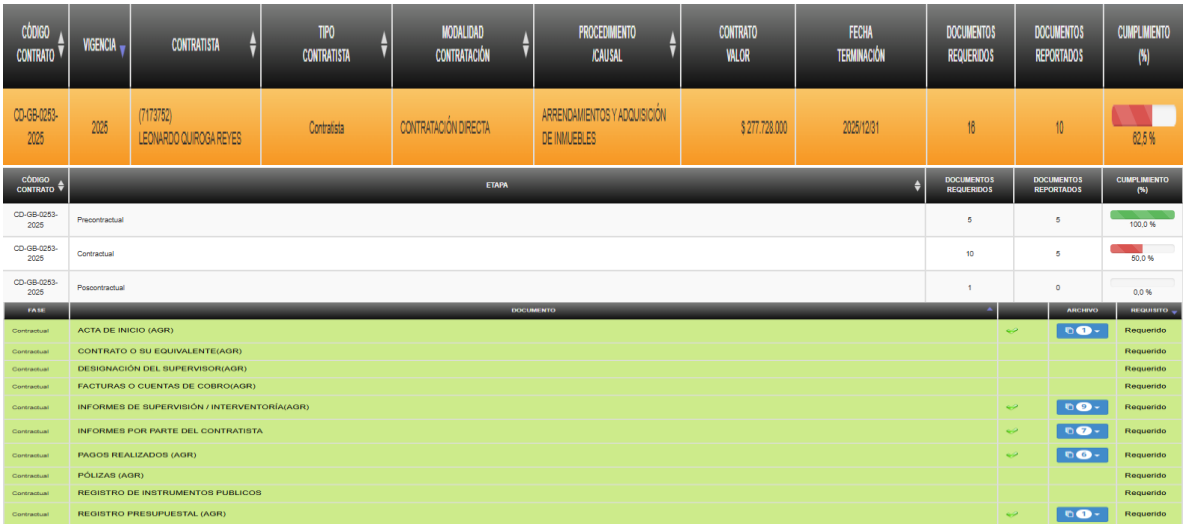

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0253-2025	2025	(7173752) LEONARDO QUIROGA REYES	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 277.728.000	2025/12/31	18	10	82,5 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0253-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-0253-2025	Contractual	10	5	50,0 %
CD-GB-0253-2025	Poscontractual	1	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)			Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	9	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	7	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	6	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 83

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-0073-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 0253 DE 2025
CONTRATISTA	LEONARDO QUIROGA REYES
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 N° 20-35 DE LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 865M2, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 070-85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2025.
VALOR	$ 277.728.000,00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 277.728.000,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CONDICION: Los informes de avance de supervisión se encuentran publicados de forma extemporánea por parte de la supervisión. Igualmente se encuentra extemporaneidad en el cargue de soporte de pago, frente a la aprobación del mismo.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación


EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Analizada la respuesta de la Entidad vigilada a la observación, determina el reconocimiento del hecho por parte de lo expuesto por el grupo auditor reafirmando la deficiencia en los controles de la supervisión, por lo se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 33** para que sea tenido en cuenta en el Plan de Mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 34 CONTRATO 0369/2025 CON INCONSISTENCIAS.

Ilustración 50

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0369-2025	2025	(7174063) JUAN MANUEL ALVAREZ CARDENAS	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 120.406.902	2025/06/30	16	12	75,0 %

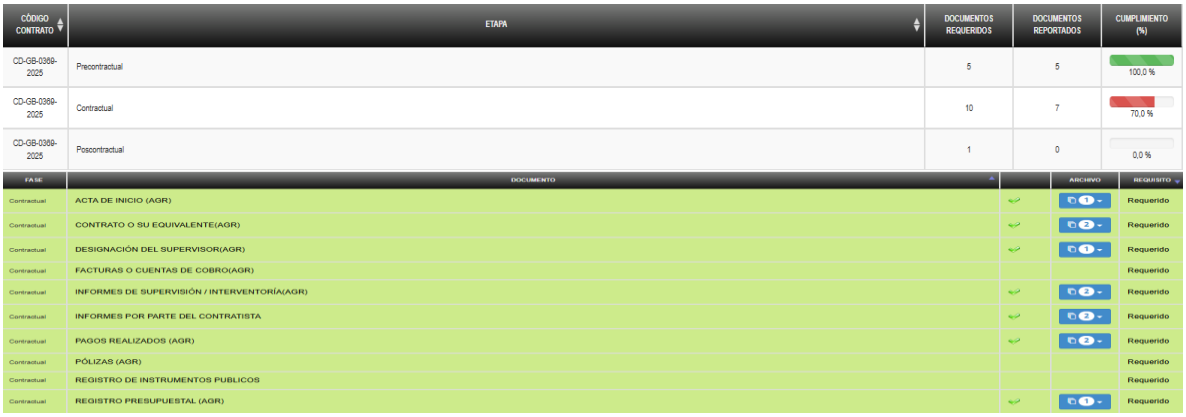

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0369-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-0369-2025	Contractual	10	7	70,0 %
CD-GB-0369-2025	Poscontractual	1	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	2	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 84

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-0119-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0369-2025
CONTRATISTA	JUAN MANUEL ÁLVAREZ CÁRDENAS
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 17 N° 14 A 72 BARRIO EL TOPO DE LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1.100 M2 APROXIMADAMENTE, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 070 142505 DESTINADO A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL AÑO 2025
VALOR	$ 120.406.902,00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 120.406.902,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CONDICION: Se evidencia que no se dio cumplimiento a la forma de pago, acordada en el contrato; se reportan únicamente 1 pago parcial equivalente a $ 40.135.634 .00. Lo anterior no coincide con el reporte del formato F13, con pagos al 100%.

La inexactitud de la información esto impide el cierre del expediente conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 “cierre del expediente es un acto administrativo de trámite obligatorio”

Los informes de avance de supervisión se encuentran publicados de forma extemporánea por parte de la supervisión. Igualmente se encuentra extemporaneidad en el cargue de soporte de pago, frente a la aprobación del mismo.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO. Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.


Analizada la respuesta de la Entidad vigilada a la observación, determina el reconocimiento del hecho por parte de lo expuesto por el grupo auditor reafirmando la deficiencia en los controles de la supervisión, por lo se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 34** para que sea incluido en el Plan de Mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 35 CONTRATO 0514/2025 CON INCONSISTENCIAS.

Tabla 85

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-0232-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0514-2025
CONTRATISTA	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070- 32448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2025
VALOR	$ 210.981.282
ADICIONAL	$0
VALOR TOTAL	$ 210.981.282
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Ilustración 51

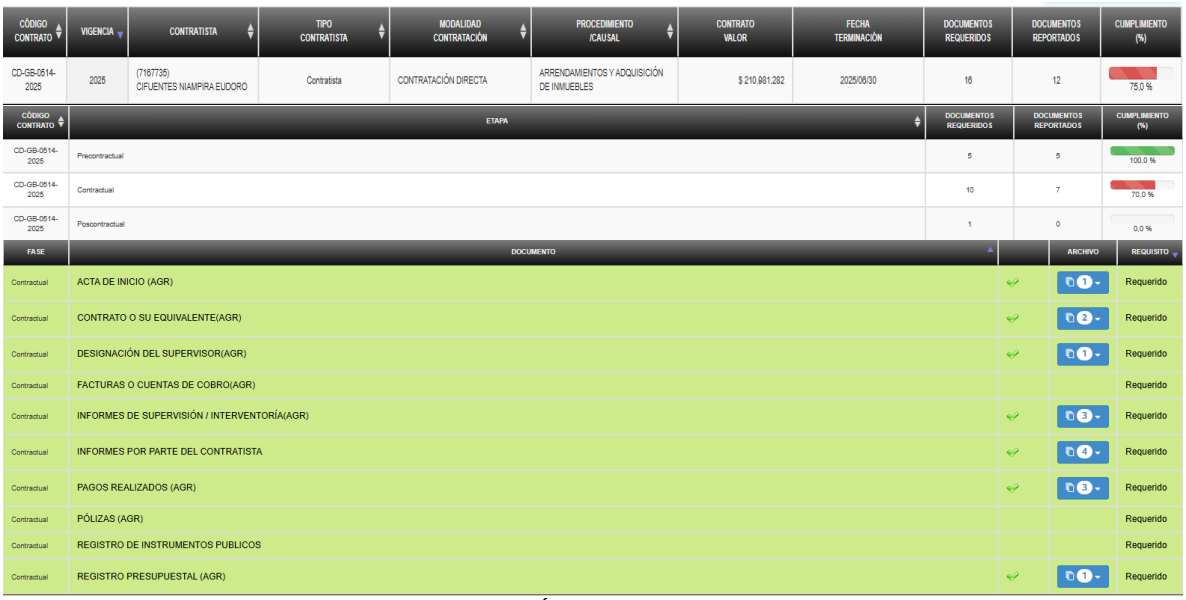

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0514-2025	2025	(7167735) CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 210.981.282	2025/06/30	16	12	75,0 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0514-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-0514-2025	Contractual	10	7	70,0 %
CD-GB-0514-2025	Poscontractual	1	0	0,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	3	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	4	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	3	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: Se evidencia que no se dio cumplimiento a la forma de pago, acordada en el contrato; se reportan únicamente 2 pagos parciales equivalentes a $ 140.654.188.00. Lo anterior no coincide con el reporte del formato F13, que reporta pagos al 100%. La inexactitud de la información esto impide el cierre del

expediente conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 “cierre del expediente es un acto administrativo de trámite obligatorio”

La publicación de informes de avance de ejecución se publica extemporáneas; por parte de la supervisión.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Analizada la respuesta de la Entidad vigilada a la observación, determina el reconocimiento del hecho por parte de lo expuesto por el grupo auditor reafirmando

la deficiencia en los controles de la supervisión, por lo se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 35** así mismo lo debe tener en cuenta en el Plan de Mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 36 CONTRATO 0537/2025 CON INCONSISTENCIAS.

Tabla 86

# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0537-2025
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-0282-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0537-2025
CONTRATISTA	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nos. 1441 1445 1447 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SE
VALOR	$ 216.390.000,00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 216.390.000,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

Ilustración 52

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0537-2025	2025	(7167735) CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 216.390.000	2025/08/30	16	12	75,0 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-0537-2025	Precontractual	5	5	100,0 %
CD-GB-0537-2025	Contractual	10	7	70,0 %
CD-GB-0537-2025	Poscontractual	1	0	0,0 %



FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		2	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		2	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)		1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)		4	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		4	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		4	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		1	Requerido

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CONDICION: Se evidencia que no se dio cumplimiento a la forma de pago, acordada en el contrato; se reportan únicamente 2 pagos parciales equivalentes a $ 144.260.000.00.
Lo anterior no coincide con el reporte del formato F13, que reporta pagos al 100%.

La inexactitud de la información esto impide el cierre del expediente conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 "cierre del expediente es un acto administrativo de trámite obligatorio", La publicación de informes de avance de ejecución se publican extemporáneas; por parte de la supervisión.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el

objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Analizada la respuesta de la Entidad vigilada a la observación, determina el reconocimiento del hecho por parte de lo expuesto por el grupo auditor reafirmando la deficiencia en los controles de la supervisión, por lo se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 36** así mismo lo debe tener en cuenta en el Plan de Mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 37 CONTRATO 0845/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Tabla 87

# CONTRATO	**CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 0845 DE 2025**
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	SA-SI-GB-015-2024
# CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 0845 DE 2025
CONTRATISTA	YESID AVILA TORRES
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	$ 2.385.617.800.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 2.385.617.800.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Selección abreviada inversa subasta

Ilustración 53



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
SA-SI-GB-0845-2025	Precontractual	12	9	75.0 %
SA-SI-GB-0845-2025	Contractual	4	2	50.0 %



FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	ACTA DE AUDIENCIA DE PRECALIFICACIÓN O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		1	Requerido
Precontractual	ACTA DE REVISIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (AGR)			Requerido
Precontractual	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓNAGR)			Requerido
Precontractual	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)			Requerido
Precontractual	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)		1	Requerido
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		1	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)		4	Requerido
Precontractual	INFORME DE HABILITACIÓN DE OFERENTES		1	Requerido
Precontractual	OFERTA SELECCIONADA		11	Requerido
Precontractual	PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA (AGR)		1	Requerido
Precontractual	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)		1	Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		1	Requerido

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: La notificación de supervisión se carga extemporánea en la plataforma del SECOP II; posterior al acta de inicio. Novedad importante al ser 8 supervisores dentro de un mismo contrato.

El objetivo del contrato determino “El proyecto se desarrollará en 14 municipios del Departamento de Boyacá: Gachantivá, Tibaná, Macanal, Tota, Socha, Guateque, Boavita, Floresta, Jenesano, Covarachía, Corrales, Zetaquira, Sora y Ramiriquí, beneficiando aproximadamente 250 hectáreas, donde se desarrollan los siguientes sistemas productivos: ganadería de leche, fruticultura (mora y caducifolios), hortalizas (cebolla, hortalizas de hoja), papa y maíz, entre otros. En total son 539 productores beneficiados junto con sus núcleos familiares, ubicados en zona rural de estos 14 municipios”. Revisados los documentos anexos como liquidación y cumplimiento, no se encuentran los soportes del recibido por parte de los 539 productores beneficiados. Solamente actas de entrega a terceros en las Alcaldías Municipales.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015


CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Evaluada la respuesta del sujeto de control se infiere que los argumentos técnicos y operativos expuestos NO desvirtúan las situaciones observadas. Respecto al componente de publicidad, la entidad acepta expresamente la extemporaneidad en la notificación de supervisión y en el cargue de sus informes en el SECOP II, configurando una transgresión a los términos perentorios de ley.
Frente al componente de fondo, el argumento defensivo institucional según el cual la finalidad del 'Fondo Finca 2024' eximía de la obligación de allegar actas individuales adolece de sustento legal. Al haberse designado un equipo de ocho (8) supervisores, la entidad contaba con la capacidad administrativa suficiente para asegurar la trazabilidad del proyecto en las 250 hectáreas y los 14 municipios de Boyacá (desde Gachantivá hasta Ramiriquí). Permitir la liquidación del contrato amparándose únicamente en actas de entrega a terceros (Alcaldías) impide a este Ente Auditor verificar de manera real, material y científica que la ayuda llegó efectivamente a los 539 productores y sus núcleos familiares, convirtiendo el gasto público en un hecho incierto y sin soporte de cumplimiento del fin estatal." por lo cual se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 37 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 38 CONTRATO 1019/2025 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 54

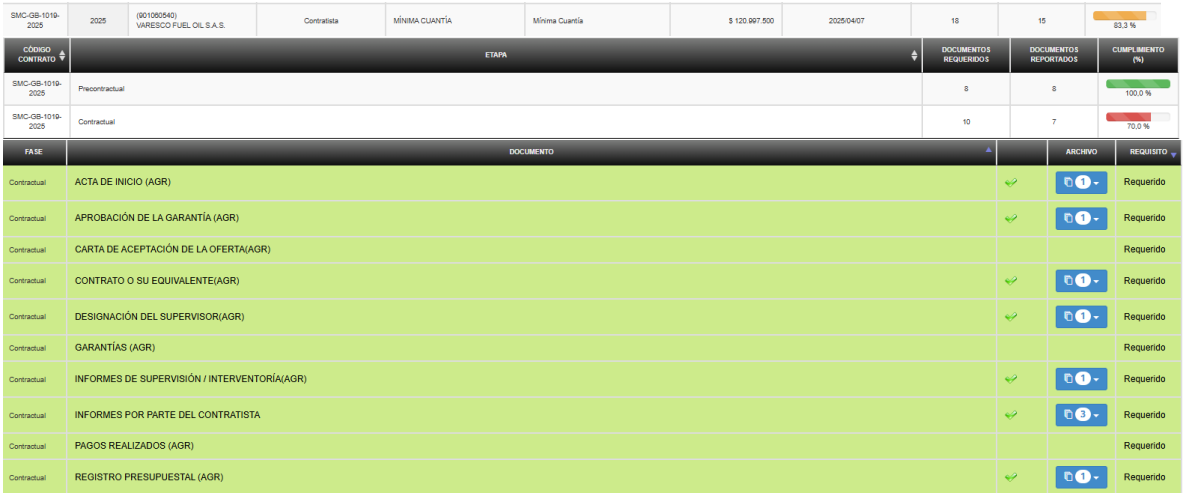

SMC-GB-1019-2025	2025	(901060540) VARESCO FUEL OIL S.A.S.	Contratista	MÍNIMA CUANTÍA	Mínima Cuantía	$ 120.997.500	2025/04/07	18	15	83,3 %

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
SMC-GB-1019-2025	Precontractual	8	8	100,0 %
SMC-GB-1019-2025	Contractual	10	7	70,0 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	GARANTÍAS (AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	3	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 88

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	SMC-GB-002-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1019 DE 2025
CONTRATISTA	VARESCO FUEL OIL S.A.S
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, DIESEL, DIESEL PREMIUM,) PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	$120.997.500.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$120.997.500.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Mínima cuantía

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: La notificación de supervisión se carga extemporánea en la plataforma del SECOP II; posterior al acta de inicio. Se deja trazabilidad de devoluciones de tramites de pago parcial, evidenciado que los cobros son posteriores a la ejecución, lo que implica “Desgaste administrativo generado por trámites sin fundamento legal o técnico es una vulneración al principio de eficiencia y al debido proceso administrativo”. Finalmente, solo se hace un cobro.

Extemporaneidad en la publicación de informes de supervisión; no se encuentra publicado un adecuado protocolo de control y seguimiento del suministro de combustible y los vehículos que obtuvieron el consumo.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni

los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Analizada la respuesta emitida por el sujeto de control y NO desvirtúan las situaciones observadas respecto al componente de publicidad, ampararse en las dinámicas operativas de la plataforma SECOP II para justificar la extemporaneidad sistemática en el cargue de informes y notificaciones resulta inaceptable, toda vez que los términos procesales y contractuales son perentorios y de obligatorio cumplimiento.
Frente al componente de control, la defensa institucional según la cual no se acreditó un perjuicio patrimonial confunde la naturaleza del control fiscal. La omisión materializada al no publicar ni contar con un protocolo idóneo de control vehicular (tales como planillas de kilometraje, bitácoras de ruta, chips de identificación o autorizaciones previas por placa) impide verificar la correspondencia real entre el combustible pagado y las misiones oficiales de la entidad. Asimismo, el rechazo y

devolución reiterada de trámites de pago parcial evidencia fallas críticas en los controles concurrentes, generando un desgaste administrativo injustificado que lesiona el principio de eficiencia: por lo expuesto se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 38 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y se debe tener en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 39 CONTRATO 1161/2025 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 55

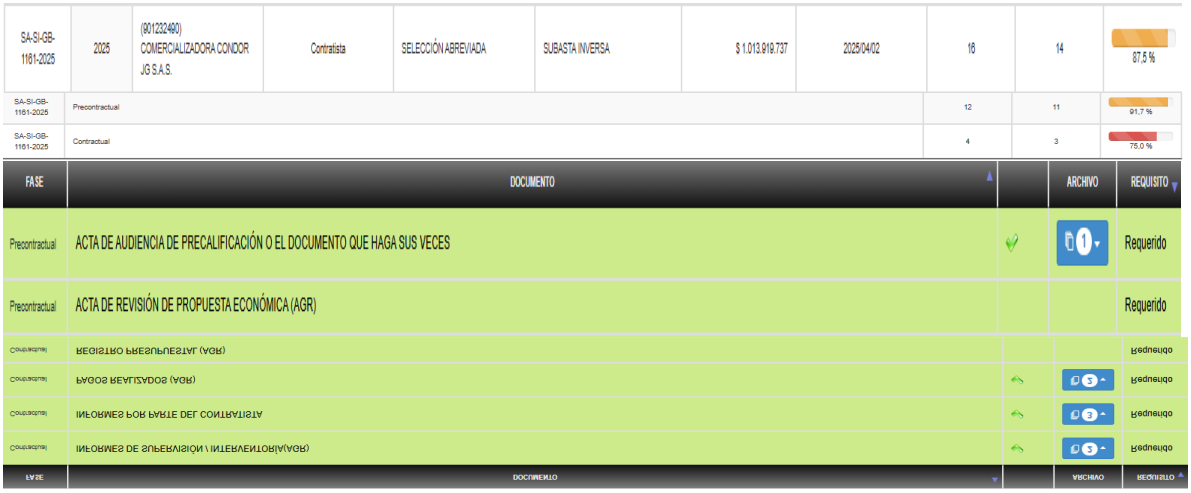


Tabla 89

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	SA-SI-GB-014-2024
# CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 1161 DE 2025
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS
OBJETO	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	$ 1.034.611.977,00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 1.034.611.977,00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Selección abreviada inversa subasta

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: Se concede anticipo y al ser dinero de la entidad estatal, los intereses o rendimientos financieros que este produzca pertenecen a la entidad contratante y deben ser reintegrados al Tesoro, no se encuentra publicado soporte de la entidad bancaria … El tiempo de causación sería del 19 de marzo de 2025 al 8-09-2025. según el Consejo de Estado, los recursos entregados como **anticipo** conservan su naturaleza de **fondos públicos** hasta que son amortizados por el contratista.

En el acta de liquidación refieren que los rendimientos financieros fueron de $ 366,23. Al ser recursos de destinación especifica, no se encuentra la entrega a Terceros (Policía Nacional) como lo indica la necesidad planteada. Únicamente se confirma por parte de la supervisión que se realizaron *ingreso al almacén general de la Gobernación de Boyacá, con el comprobante de entrada de devolutivos No. 173, un vehículo tipo Necromovil Urbano con fecha el 4 de julio de 2025.Se ingreso al almacén general de la Gobernación de Boyacá, con el comprobante de entrada de devolutivos No. 179, un vehículo tipo Necromovil Rural con fecha el 24 de julio de 2025.*

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

Evaluado el escrito de respuesta emitido por el sujeto de control y determina que los argumentos expuestos NO desvirtúan las condiciones observadas. Respecto a la destinación específica de los recursos, si bien el ingreso de los vehículos tipo Necromóvil (Urbano y Rural) al Almacén de la Gobernación mediante los comprobantes No. 173 y 179 constituye una prueba de su adquisición material, dicha actuación es insuficiente. La necesidad del gasto público radicaba en el suministro directo a un tercero específico (Policía Nacional). Al no allegarse el acta de transferencia definitiva, comodato o entrega material a dicha institución, la entidad vulnera el principio de eficiencia y destinación legal, manteniendo bienes de alta necesidad inmovilizados en un almacén central.

De otra parte, frente al componente financiero, la entidad no presentó el soporte bancario de la cuenta del anticipo ni la constancia de consignación de los rendimientos causados entre el 19 de marzo de 2025 y el 8 de septiembre de 2025 al Tesoro, configurando una apropiación extemporánea u omisión de reintegro de fondos públicos. Por lo expuesto se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 39 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA** también se debe tener en cuenta para ser incluido en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 40 CONTRATO 7545046/1163 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 56



CD-GB-1163-2025	2025	(1049636288) DIEGO EDUARDO HIGUERA GUTIERREZ	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	$ 28.623.700	2025/08/24	12	11	91,7 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	3	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	9	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	9	Requerido

Tabla 90

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-1188-2025
# CONTRATO	**CPS** CO1.PCCNTR.7545046/1163
CONTRATISTA	**DIEGO EDUARDO HIGUERA GUTIERREZ**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS, INDICADORES Y PROYECTOS DEL PLAN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**
VALOR	**$** 28.623.700,00
ADICIONAL	$ 13.085.118,00
VALOR TOTAL	$ 41.708.818,0
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación Directa

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CONDICION: Se confirman extemporaneidad, en el cargue de egreso y orden de pago.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

La Entidad ratifica la extemporaneidad en el cargue del egreso y la orden de pago; el allanamiento por parte del auditado exime de debate probatorio adicional, dejando en evidencia la vulneración de los términos perentorios para el registro de la información financiera en las plataformas, por lo que se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 40 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 41 CONTRATO 1179/2025 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 57



SA-SI-GB-1179-2025	2025	(800153102) HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	Contratista	SELECCIÓN ABREVIADA	SUBASTA INVERSA	$ 2.699.000.000	2025/04/09	16	11	68,8 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	ACTA DE AUDIENCIA DE PRECALIFICACIÓN O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	✓	1	Requerido
Precontractual	ACTA DE REVISIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (AGR)			Requerido
Precontractual	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓNAGR)			Requerido
Precontractual	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)			Requerido
FASE	**DOCUMENTO**		**ARCHIVO**	**REQUISITO**
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	1	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

Tabla 91

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	SA-SI-GB-014-2024
# CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA 1179 DE 2025
CONTRATISTA	**HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS**
OBJETO	**ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 1**
VALOR	**$2.699.000.000.00**
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	**$2.699.000.000.00**
MODALIDAD DE CONTRATACION	Selección abreviada subasta inversa

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria.

CONDICION: Se concede anticipo y al ser dinero de la entidad estatal, los intereses o rendimientos financieros que este produzca pertenecen a la entidad contratante y deben ser reintegrados al Tesoro, no se encuentra publicado soporte de la entidad bancaria … El tiempo de causación sería del 19 de marzo de 2025 al 15-08-2025. según el Consejo de Estado, los recursos entregados como **anticipo** conservan su naturaleza de **fondos públicos** hasta que son amortizados por el contratista.

En el acta de liquidación refieren que los rendimientos financieros fueron de $3.997.488,59 soportados en documento de la empresa IRIS, sin embargo, la norma exige que el reporte sea mensual y preferiblemente se indique la tasa de interés que rige para el mes.

Al ser recursos de destinación especifica, no se encuentra la entrega a Terceros (Policía Nacional) como lo indica la necesidad planteada. Únicamente se confirma por parte de la supervisión que se realizaron *ingreso al almacén general de la Gobernación de Boyacá.* En el plan de pagos se reporta, únicamente PAGADO el anticipo, por valor de $ 1.079.600.000.00; dos registros más que se encuentran rechazados. Lo anterior no coincide con el reporte del formato F13, que reporta pagos al 100%.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie

un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

La aceptación explícita de la entidad respecto a la inexistencia del acta de entrega a terceros (Policía Nacional), la omisión del monitoreo mensual de rendimientos financieros y la presencia de inconsistencias entre sus registros y el formato F13 de la Contraloría, ratifican una deficiencia grave y sistemática en los controles de la supervisión.

La solicitud de la Entidad de trasladar estas conductas exclusivamente a un plan de mejora argumentando que **'no hay pago indebido'** es improcedente. En el control fiscal territorial, la rendición de cuentas contradictoria y la inmovilización de bienes financiados con recursos de destinación específica vulneran los principios de eficiencia, oportunidad y transparencia (Art. 209 C.P.). Al liquidarse el convenio sin que los vehículos especializados presten el servicio de seguridad ciudadana para el cual fueron adquiridos, se configura una desviación de los fines del Estado y una gestión fiscal ineficaz que trasciende lo meramente administrativo. Por lo expuesto se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 41 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 42 CONTRATO 1299/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 58

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CD-GB-1299-2025	2025	(891801038) LOTERIA DE BOYACA	Contratista	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$ 238.948.599	2025/06/30	16	12	75,0 %



FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	3	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	2	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)	✓	2	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)			Requerido
Contractual	REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS			Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	1	Requerido

Tabla 92

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-1077-2025
# CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1299-2025
CONTRATISTA	LOTERÍA DE BOYACA (PROVEEDOR)
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS N° 101 ASAMBLEA, PISO CUARTO, PISO QUINTO PISO SEXTO OFICINAS 603, 604, 607, 608 Y PISO ONCE, CON UN ÁREA APROXIMADA DE 2.375,33 MTS2, UBICADAS EN LA CALLE 19 N°9-35 EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ, DE PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ, PARA EL AÑO 2025
VALOR	$ 238.948.599.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 238.948.599.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION La oferta presentada por la Lotería, no se encuentra publicada. El pago parcial # 1. Se aprobó el 04/03/2025. Se canceló el 15/05/2025 y la publicación de evidencias se realiza 05/12/2025.

No se encuentra reflejados más pagos en plataforma y en el acta de liquidación se reconocen, la cual se publica el 3 de septiembre de 2025. No hay coincidencia con los reportes del F13 y SIA OBSERVA

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo

5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.


En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

La contradicción entregada por el sujeto de control NO DESVIRTÚA la observación. Por el contrario, ratifica la extemporaneidad de la publicación y la falta de depuración y conciliación oportuna de los estados y reportes contractuales antes de la firma del acta de liquidación. El acta de liquidación es el balance final del contrato y no puede presentar inconsistencias con lo reportado a los entes de control. Por lo expuesto se configura como **HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 42 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 43 CONTRATO 1529/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 59





FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		1	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)		24	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		4	Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		4	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		1	Requerido

Tabla 93

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	LP-GB-012-2024
# CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 1529 DE 2025
CONTRATISTA	IGS INGENIERIA EU
OBJETO	EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ
VALOR	$ 2.317.593.267,37
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 2.317.593.267,37
MODALIDAD DE CONTRATACION	Licitación de Obra Pública

FUENTE: SIA OBSERVA- SECOP II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

CONDICION: La viabilidad del proyecto se aprueba en tres (3) meses sin embargo la ejecución se amplía hasta por 4 meses.

Dentro de la propuesta se proponen al Residente Leonardo Lara Lizarazo, sin embargo, en los informes de interventoría se reporta ANDERSON ZAMBRANO con cédula 74081295. No se evidencia hoja de vida publicada incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación y el de Interventoría y Supervisión; toda vez que el perfil debe cumplir mínimo con “Ingeniero Eléctrico o Electricista o ingeniero en distribución y redes eléctricas, con especialización en gerencia de Proyectos. Acreditación de formación continua (cursos, certificaciones, diplomados, seminarios) en mínimo 120 horas en RETILAP, en entrenamiento avanzado en alturas, curso de coordinador de alturas, certificado de buenas prácticas de poda de árboles mínimo 40 horas y Mínimo trece (13) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y haberse desempeñado como residente de obra en tres (3) proyectos de obra cuyo objeto corresponda a obras de modernización y expansión de infraestructura eléctrica rural y sistemas de iluminación o alumbrado público rural.

No se evidencia el cumplimiento de los trámites necesarios para la expedición de certificación RETIE y RETILAP.

No se evidencia el cumplimiento del numeral 12. De la cláusula tercera. Dar cumplimiento a lo señal1ado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportes a caja de compensación familiar, SENA e ICBF.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación.

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

La respuesta a la observación sobre contradicción en el cumplimiento de los trámites necesarios para la expedición de certificación RETIE y RETILAP, del numeral 12 de la cláusula tercera, en lo señal1ado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportes a caja de compensación familiar, SENA e ICBF y demás NO DESVIRTÚA la observación. Por lo que se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 43 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 44 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Ilustración 60



Tabla 94

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	SA-GB-012-2024
# CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0046 DE 2025
CONTRATISTA	Unión Temporal GB 24
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
VALOR	$ 1.300.000.000.00
ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 1.300.000.000.00
MODALIDAD DE CONTRATACION	Selección Abreviada de Menor Cuantía

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: Desde la suscripción del acta de inicio 14 de enero de 2025, hasta el 6/10 de 2025, no se reportan avances de ejecución del contrato. Por parte de supervisión se publican una vez firmada el acta de liquidación.
No se evidencia Planillas de seguridad social, que confirmen el pago de la misma del personal empleado durante la ejecución del contrato ofrecido.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar

elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

La respuesta del auditado no desvirtúa la observación. El fortalecimiento de los mecanismos internos anunciado es una medida de choque posterior, pero no exime el incumplimiento normativo ya consumado durante el periodo auditado. La falta de planillas de seguridad social invalida la legalidad del acta de liquidación firmada. Por lo expuesto se configura como un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 44 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA** y para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

CONTRATOS DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 45 VARIOS CONVENIOS PAE – CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

Tabla 95. CONTRATOS ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4542-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4631 de 2024
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE TOGUI

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOGUI, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 684.088.049.00	APORTE DEPARTAMENTO $ **465.013.926,20**
		APORTE MUNICIPIO $ **219.074.122,80**
ADICIONAL	$ -	
VALOR TOTAL	$ 684.088.049.00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II		CD-GB-4589-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4714 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ $ 702.627.104,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 477.605.799,20
		APORTE MUNICIPIO $ 225.021.304,80
ADICIONAL	$ $ 40.060.782,00	
VALOR TOTAL	$ $ 742.687.886,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II		CD-GB-4582-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4669 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE TIBANA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TIBANA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ $ 711.912.640,00	APORTE DEPARTAMENTO $84.664.418,40
		APORTE MUNICIPIO $ 227.248.221,60
ADICIONAL	$ $ 55.290.144,00	
VALOR TOTAL	$ $ 767.202.784,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II		CD-GB-4607-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4655 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE TASCO	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TASCO, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 724.043.548,00	APORTE DEPARTAMENTO $492.527.922,40
		APORTE MUNICIPIO $ $ 231.515.625,60
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 724.043.548,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4572-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4687 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 734.037.094,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 499.315.618,00
		APORTE MUNICIPIO $ $ 234.721.476,00
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 734.037.094,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4646-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4688 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CIENAGA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CIENAGA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 724.501.381,00	APORTE DEPARTAMENTO $492.838.886,20
		APORTE MUNICIPIO $231.662.494,80
ADICIONAL	$ 20.215.071,00	
VALOR TOTAL	$ 744.716.452,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4649-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4742 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE TURMEQUE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TURMEQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 777.704.848,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 529.351.007,20
		APORTE MUNICIPIO $ $ 248.353.840,80
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 777.704.848,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4652-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4674 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CUBARA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 786.448.822,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 534.914.078 80

		APORTE MUNICIPIO $ 251.534.743,20
ADICIONAL	$ 24.438.057 00	
VALOR TOTAL	$ 810.886.879 00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4533-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4637 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MUZO	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MUZO, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 804.873.141,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 547.803.927,00
		APORTE MUNICIPIO $ 257.069.214,00
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 804.873.141,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4604-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4664 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 823.163.736,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 559.851.139,20
		APORTE MUNICIPIO $ 263.312.596,80
ADICIONAL	$ 64.657.440,00	
VALOR TOTAL	$ $ 887.821.176,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4644-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4740 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ $ 825.962.648,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 562.128.087,20
		APORTE MUNICIPIO $ 263.834.560,80
ADICIONAL	$ 14.969.766,00	
VALOR TOTAL	$ 840.932.414,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4578-2024

# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4665 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE ARCABUCO	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE ARCABUCO, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$849.208.909,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 577.165.322,20
		APORTE MUNICIPIO $ $ 272.043.586,80
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 849.208.909,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4593-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4673 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE TIBASOSA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 898.100.181,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 611.124.471,00
		APORTE MUNICIPIO $ 286.975.710,00
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 898.100.181,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4554-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4724 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SANTANA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTANA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 913.738.314,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 620.994.205,20
		APORTE MUNICIPIO $ $ 292.744.108,80
ADICIONAL	$ 54.489.918,00	
VALOR TOTAL	$ $ 968.228.232,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4654-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4661 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SOCOTA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOCOTA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 926.556.729,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 630.076.479,00

		APORTE MUNICIPIO $ 296.480.250,00
ADICIONAL	$ 25.934.889,00	
VALOR TOTAL	$ 952.491.618,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4628-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4685 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SOCHA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOCHA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 994.010.589,00	APORTE DEPARTAMENTO $ $ 676.643.484,60
		APORTE MUNICIPIO $ 317.367.104,40
ADICIONAL	$ 28.342.074,00	
VALOR TOTAL	$ 1.022.352.663,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4631-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4731 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SABOYA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SABOYA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	1.052.947.523,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 717.425.726,60
		APORTE MUNICIPIO $ 335.521.796,40
ADICIONAL	$ 70.159.705,00	
VALOR TOTAL	$ 1.123.107.228,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4560-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4683 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE OTANCHE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 1.063.888.348,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 723.729.107,20
		APORTE MUNICIPIO $ 340.159.240,80
ADICIONAL	$ 116.432.096,00	
VALOR TOTAL	$ 1.180.320.444,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4590-2024

# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4718 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CHITA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHITA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 1.077.062.283,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 733.052.853,00
		APORTE MUNICIPIO $ 344.009.430,00
ADICIONAL	$ 50.938.445,00	
VALOR TOTAL	$ 1.128.000.728,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4524-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4699 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE TUTA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUTA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 1.102.121.090,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 750.072.993,20
		APORTE MUNICIPIO $ 352.048.096,80
ADICIONAL	$ 30.978.021,00	
VALOR TOTAL	$ 1.133.099.111,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4568-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4710 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SIACHOQUE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 1.108.906.472,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 754.305.773,60
		APORTE MUNICIPIO $ 354.600.698,40
ADICIONAL	$ 40.713.344,00	
VALOR TOTAL	$ 1.149.619.816,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4541-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4621 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE BELEN	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE BELEN, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 1.159.590.292,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 788.354.720,80

		APORTE MUNICIPIO $ 371.235.571,20
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 1.159.590.292,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II		CD-GB-4651-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4643 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SORACA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SORACA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$1.185.470.027,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 805.556.537,00
		APORTE MUNICIPIO $ 379.913.490,00
ADICIONAL	$ 91.191.176,00	
VALOR TOTAL	$ 1.276.661.203,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II		CD-GB-4518-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4677 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE GUATEQUE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$1.218.810.834,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 828.577.782,00
		APORTE MUNICIPIO $ 390.233.052,00
ADICIONAL	$ 35.261.709,00	
VALOR TOTAL	$ 1.254.072.543,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II		CD-GB-4517-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4657de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE GARAGOA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GARAGOA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$1.286.070.774,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 874.261.266,00
		APORTE MUNICIPIO $ 411.809.508,00
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 1.286.070.774,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II		CD-GB-4523-2024
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4658 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE TOCA	

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOCA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$1.313.134.532,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 893.019.089,60
		APORTE MUNICIPIO $ 420.115.442,40
ADICIONAL	$ 100.230.064,00	
VALOR TOTAL	$ 1.413.364.596,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4629-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4708 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NOBSA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$1.490.327.821,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 1.012.994.270,20
		APORTE MUNICIPIO $ 477.333.550,80
ADICIONAL	$ 41.958.225,00	
VALOR TOTAL	$ 1.532.286.046,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4526-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4728 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$1.720.070.400,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 1.169.789.059,20
		APORTE MUNICIPIO $ 550.281.340,80
ADICIONAL	$ 80.642.845,00	
VALOR TOTAL	$ 1.800.713.245,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4579-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4629 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE AQUITANIA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 1.912.381.874	APORTE DEPARTAMENTO $ 1.300.408.535**,6**
		APORTE MUNICIPIO $ **611.973.338,4**
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 1.912.381.874,00	

MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4534-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4614 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 2.529.583.885	APORTE DEPARTAMENTO $ 1.888.950.180,00
		APORTE MUNICIPIO $ 808.839.140,40
ADICIONAL	$ 168.205.436,00	
VALOR TOTAL	$ 2.697.789.321,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4558-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4705 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE PAIPA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 2.724.777.596.00	APORTE DEPARTAMENTO $ **1.853.321.859,20**
		APORTE MUNICIPIO $ **871.455.736,80**
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	2.724.777.596.00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4642-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4692 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SAMACA	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SAMACA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 3.040.225.644,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 2.066.073.052,80
		APORTE MUNICIPIO $ 974.152.591,20
ADICIONAL	$ 267.162.318,00	
VALOR TOTAL	$ 3.307.387.962,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	
PROCESO CONTRACTUAL SECOP II	CD-GB-4499-2024	
# CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4609 de 2024	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.	
VALOR	$ 3.772.215.900,00	APORTE DEPARTAMENTO $ 3.772.215.900,00
		APORTE MUNICIPIO $ 1.778.308.992,00
ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL	$ 3.772.215.900,00	
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	

Fuente: SIA observa- SECOP II información complementaria

CONDICION: Los convenios de Asociación y Contratos analizados año 2024 con ejecución 2025, equivalente a 13, se reflejan incumplimiento en el reporte de ejecución con variaciones significativas, del 22.2%; 44.4%; 55.6%; 64.3%; 71.4% y máximo el 85.7%. Lo cual obedece a la falta de cargue documental primordial como es el RPC, facturas, informes de supervisión.

De la muestra tomada (33) Convenios Interadministrativos (4637 …4742) que representan el 26.8% de los celebrados para cubrir el I Semestre PAE Vigencia 2025. Todos se encuentran incumpliendo la matriz de legalidad, su cumplimiento alcanzo al 71.4% Desarrollado de la siguiente forma:

Ilustración 61



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CV-GB-4692-2024	Precontractual	5	5	100,0 %
CV-GB-4692-2024	Contractual	9	5	55,6 %

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)			Requerido
Contractual	CONVENIO(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	1	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORME DE LAS ENTIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO(AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	3	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	3	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

MATRIZ DE LEGALIDAD AÑO 2025

Ninguno de los contratos auditados, cumple con la matriz de legalidad al 100%, La mayoría de documentos faltantes si se encuentran en la plataforma SECOP II, advirtiendo también que reiteradamente se evidencian los mismos **errores u omisiones** en el cargue de documentos definidos en la matriz.

PRECONTRACTUAL. - Los procesos auditados cumplen con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. Excepto en los procesos de Contratación Directa con Ofertas, que se omite en su totalidad la publicación de la oferta presentada por el Contratista.

CONTRACTUAL. Demora en la publicación de documentos esenciales para dar inicio al contrato especialmente. Registro Presupuestal de Compromisos, Designación de Supervisor y aprobación de pólizas. Se confirman algunos casos de cargue posterior a la suscripción del acta de inicio. No se están acatando responsabilidades en trámite de acuerdo al manual de contratación de la Gobernación y al de Supervisión e Interventoría.

CONTRACTUAL. La muestra auditada no cumplió con el 100% de publicidad en términos establecidos en la ley; ni en la parte de ejecución ni en el reporte de pagos los soportes se publican con atemporalidad al pago.

Los contratos que recibieron anticipo, no presentan plan de inversión del anticipo; seguimiento al mismo y respaldo de los rendimientos generados por el anticipo y que le pertenecen a la entidad estatal. Responsabilidad a cargo de supervisor conforme al manual de supervisión …

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN.

Los informes de seguimiento deben tener trámite y publicación mensual, dentro de los términos de ley; circunstancia que no se cumple y que se encuentra en responsabilidad del supervisor.

El trámite de pagos, debe llevar soportados los documentos básicos del contratista, aprobados por el supervisor para poder expedir de orden de pago y comprobante de egreso y cargarlo en línea en la plataforma; de la muestra auditada ninguno cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos y/o en los términos establecidos para tal fin.

Ver MANUAL-DE-INTERVENTORIA-Y-SUPERVISION-VERSION-3-1. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/MANUAL-DE-INTERVENTORIA-Y-SUPERVISION-VERSION-3-1.pdf

El informe presentado por parte de la Gobernación de Boyacá en el Formato F13, No coincide con lo reportado en la plataforma SECOP II y SIA Observa.

CRITERIO: El ítem descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, no establece la relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos ni los beneficios (técnicos, misionales, etc.) que representará para la entidad la contratación requerida. Se incumple los lineamientos de Colombia compra eficiente y el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
No se establece los criterios de selección del ofrecimiento más favorable a la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del deber de selección objetiva y ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas o procurar la mejor relación costo – beneficio. Incumple con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 y el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

En contratación directa existe mayor discrecionalidad, pero existe la obligación de determinarlos.

En el ítem estimación del valor del contrato, no indica las variables utilizadas para su cálculo y los rubros que lo componen. No existen soportes en características técnicas y de calidad y en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, no contiene la información necesaria que evidencie un estudio de mercado o un análisis en donde se tenga en cuenta factores como valores históricos que pueden ser utilizados como referencia siempre y cuando el objeto y especificaciones y condiciones técnicas actuales, correspondan de manera servicios contratados por la entidad en vigencias anteriores. Incumple el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

CAUSA: Baja gestión frente al cambio normativo, desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los responsables de los procesos contractuales. Falta de herramientas de control en los procesos de contratación

EFECTO: Deficiencias en la interpretación y aplicación de normas, errores o imprecisiones que afectarían el proceso contractual y riesgos en costos que los mismos generan.

La respuesta del auditado no desvirtúa la observación. El reconocimiento de las fallas de planeación y control confirma la debilidad del Sistema de Control Interno del sujeto vigilado. Por lo tanto, la observación se configura como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 45 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA** con el agravante de recaer sobre recursos de población vulnerable y para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 46 FICHA TÉCNICA DE INVERSIÓN AMBIENTAL INCONSISTENCIA EN LA PRESENTACIÓN (EXCEL)

CONDICIÓN: La Ficha Técnica de Inversión Ambiental (FTIA) debe ser diligenciada y presentada exclusivamente en el formato Excel establecido para tal fin de acuerdo a la clasificación de cada entidad, y el cual será el ÚNICO documento que debe ser enviado en formato PDF y Excel con copia al correo electrónico **valoraciondecostosambientales@cgb.gov.co**

Tabla 96 RESUMEN FICHA AMBIENTAL

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
FICHA TECNICA DE INVERSION AMBIENTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

SUJETO O PUNTO DE CONTROL	891800498 - GOBERNACION DE BOYACA	FECHA DE ENTREGA: DD-MM- AAAA 13/02/2026

	INVERSION	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$ 1,892,218,835	$ 1,848,358,156	$ 43,860,679
	PTAP	$ 1,300,000,000	$ 1,170,000,000	$ 130,000,000
	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	$ -	$ -	$ -
	PTAR	$ 446,776,261	$ 446,776,261	$ -
	RESIDUOS SOLIDOS	$ -	$ -	$ -
	OTROS	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL	$ 3,638,995,097	$ 3,466,134,417	$ 173,860,679
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	REFORESTACION	$ -	$ -	$ -
	MANEJO DE CUENCAS	$ 78,272,143	$ 75,668,422	$ 2,603,721
	EDUCACION AMBIENTAL	$ 402,073,039	$ 169,651,420	$ 232,421,619
	PROTECCION DE RECURSOS NATURALES	$ 2,184,556,759	$ 1,575,536,621	$ 609,020,138
	RECUPERACION DE SUELOS	$ 183,715,904	$ 62,735,904	$ 120,980,000
	ADQUISICION DE AREAS ESTRATEGICAS PARA CONSERVACION HIDRICA	$ 6,799,213,926	$ 1,559,213,926	$ 5,240,000,000
	SUB TOTAL	$ 9,647,831,771	$ 3,442,806,293	$ 6,205,026,478
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	$ 10,483,164,686	$ 7,220,394,829	$ 3,262,769,858
	SUB TOTAL	$ 10,483,164,686	$ 7,220,394,829	$ 3,262,769,858
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LOS 3 SECTORES	$ 23,769,991,554	$ 14,128,336,539	$ 9,641,656,015
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SUJETO DE CONTROL			
TRANSFERENCIAS A COORPORACION AUTONOMA REGIONAL	% Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble (PREDIAL)	$		-
	% Tasa Retributiva	$		-

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES:

SORAIDA ALICIA MARIA RUIZ GARCIA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CC. 40035301
E-mail despacho.ambiental@boyaca.gov.co
Telefono Fijo y Celular 3138853038

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
NOMBRE RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
CC. 1056436285
E-mail andres.ruiz@boyaca.gov.co
Telefono Fijo y Celular 3148477432

Fuente: Plataforma SIA contralorías – Opción: Contratación/control de legalidad

CRITERIO: Resoluciones Números: *494 del julio 24 de 2017* "por la cual se establecen los métodos y la forma de rendición de cuentas y los procedimientos para su revisión", No. 576 de 2019 por medio de la cual se modifica la Resolución No. 062 del 02 de febrero de 2022 y Resolución No. 013 de 2026, emitidas por la Contraloría General de Boyacá, en donde se establece que la información reportada debe ser de calidad, suficiente, confiable; de manera que a su vez sea veraz con los documentos y anexos.

CAUSA: Posible inadvertencia en el momento de realizar los registros, ya sea por error, negligencia o por descuido, falta de controles efectivos que aseguren el correcto diligenciamiento de los registros.

EFECTO: Informes o registros inexactos que conllevan al incumplimiento de las disposiciones generales y dificultad en el ejercicio control fiscal.

Analizada la respuesta a la observación no la desvirtúan, su respuesta no es coherente con lo que se está planteando, por tal razón se constituye en un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 46,** para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento.

La Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de esta Entidad de Control, emitió los siguientes informes técnicos solicitados como apoyo técnico a los Contratos que ameritaban su acompañamiento.

Con Oficio DOOCVCA-I 025 con fecha 22 de mayo de 2026 envían informe técnico 025, con relación a la presente auditoria, en los siguientes términos:

En atención a su solicitud de fecha 10 de abril del año en curso, mediante el cual solicita apoyo técnico con el fin, de que, se practique inspección física y se evalúen los precios, cantidad, estabilidad y calidad de las obras, esto en relación a los contratos suscritos por el Departamento de Boyacá, en la vigencia fiscal 2025 y seleccionados por el grupo auditor, a continuación, se presenta informe con el resultado del estudio documental.

El presente Informe se soporta en documentación obtenida en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, a través de Links allegados por la Gobernación de Boyacá, en parámetros de necesidad, cantidad, costos y oportunidad en la ejecución de los contratos.

Tabla 97

1. CONTRATO	OBRA PÚBLICA 1519-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA	IGS INGENIERIA EU, R/Lr JORGE EDUARDO ARRIETA ROA.
OBJETO	EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.
VALOR	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.830.792.681,77)
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES

CONCLUSIONES

- La ejecución del contrato de obra pública N° 1519-2025, suscrito por el Departamento de Boyacá, fue adecuada en términos de oportunidad, costos y calidad.
- Se evidencia el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo soportado documentalmente.

Tabla 98

2. CONTRATO	OBRA PÚBLICA 1529-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA	IGS INGENIERIA EU, R/Lr JORGE EDUARDO ARRIETA ROA.
OBJETO	EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ.
VALOR	DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.317.593.267,37),
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES

CONCLUSIONES

- La ejecución del contrato de obra pública N° 1529-2025, suscrito por el Departamento de Boyacá, fue adecuada en términos de oportunidad, costos y calidad.
- Se evidencia el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo soportado documentalmente.

Tabla 99

3. CONTRATO	COMPRAVENTA 0845-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA	YESID AVILA TORRES
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($2.385.617.800.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo observado en el presente informe, los procesos contractuales fiscalizados para la vigencia 2025, presentan en sus estudios previos, descripción de la necesidad a satisfacer, que en general, soporta técnicamente, las contrataciones realizadas por el Departamento de Boyacá.

Se constató que los objetos contractuales fueron ejecutados conforme a lo pactado en cada contrato:

- Extensión de la infraestructura eléctrica rural y del sistema de iluminación del municipio de Paipa, Boyacá. (OBRA PÚBLICA 1519-2025).

- Extensión de la infraestructura eléctrica rural y del sistema de iluminación del municipio de Tota, Boyacá. (OBRA PÚBLICA 1529-2025).
- Suministro de elementos y equipos para almacenamiento de agua y riego intrapredial mediante la convocatoria del fondo de incentivo a la capitalización -finca, en el departamento de Boyacá. (OBRA COMPRAVENTA 0845-2025).

Del estudio realizado se concluye, que la Gobernación de Boyacá, soporta los precios de los procesos contractuales en las Resoluciones números 044 del 07 de junio de 2024 y 050 de 05 de mayo de 2025, mediante las cuales el Departamento, fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en su jurisdicción, además de cotizaciones de mercado, documentos utilizados por esta Contraloría como parámetro de comparación de precios de mercado.

En la parte de cantidades y calidad de obra, para cada uno de los contratos se rindió concepto, como resultado del estudio documental. El Informe técnico forma parte del presente Informe el cual se adjunta.

12.2.3. Componente Ambiental

Evaluar y determinar si las inversiones ambientales del sujeto de control cumplen con las disposiciones constitucionales y legales aplicables asociadas al programa de Agua Potable y Saneamiento Básico y adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos, así mismo conceptuar si se realizaron bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y en concordancia con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento Básico; 13. Acción por el Clima; 15. Vida de Ecosistemas Terrestres)

En la vigencia fiscal 2025, se efectuó el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó el valor total de presupuesto ambiental por valor de **$23.769.991.554,** Valor ejecutado de **$14.128.335.539,** valor por ejecutar de **$9.641.656.015,** así:

Tabla 100 EJECUCIÓN RECURSOS COMPONENTE AMBIENTAL

VALORES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS FICHA TECNICA	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	23.769.991.554
COMPROMETIDOS	14.128.335.539
POR EJECUTAR	9.641.656.015

F*uente: FICHA TÉCNICA AMBIENTAL.*

12.2.4. Planeación Y Resultados

Mediante Ordenanza No. 009 de fecha 01 de junio de 2024, “Por la cual se adopta el plan departamental de desarrollo de Boyacá, Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024 – 2027”

La estructura General del Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2024-2027, denominado “NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÀ 2024-2027”, fue estructurado en nueve (9) capítulos así:

Tabla 101 CAPITULOS PLAN DE DESARROLLO

TITULO I	GENERALIDADES DEL PLAN
TITULO II	CONSTRUCCIÒN PLAN DE DESARROLLO
TITULO III	ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO
TITULO IV	CONVERGENCIA REGIONAL
TITULO V	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
TITULO VI	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TITULO VII	PLAN FINANCIERO
TITULO VIII	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN
TITULO IX	DISPOSICIONES GENERALES

FUENTE: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Por otra parte, la estructura del plan de desarrollo, contiene estrategias de desarrollo, líneas de inversión estratégica y sistema general de regalías, tal como se observa.

Tabla 102 ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027

CAPITULO Y/O TITULO	CONCEPTO
	ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
	ESTRATEGIA DE DESARROLLO:
I	TIERRA DE CONOCIMIENTO
II	TIERRA PARA CRECE Y PRODUCTIVA
III	TIERRA VERDE Y BIODIVERSA
IV	TIERRA PARA VIVIR DIGNAMENTE Y SEGURA
V	TIERRA DEL CUIDADO Y LA INCLUSIÓN
	LINEA DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA
I	VÍAS Y TRANSPORTE
II	EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
III	AGUA Y MEDIO AMBIENTE
IV	TURISMO Y CULTURA
V	COMPETIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
VI	VIDA Y DEPORTE
VII	SALUD Y BIENESTAR
	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
	CULTURA
	DEPORTE Y RECREACIÓN
	EDUCACIÓN
	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
	JUSTICIA Y DEL DERECHO

	MINAS Y ENERGÍA
	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
	TRANSPORTE
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
III	PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS CON LA COMUNIDAD NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS.
IV	PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS CON LA COMUNIDADES INDIGENAS.

FUENTE: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ..

Fueron evaluados las siguientes metas que se desprenden de las Líneas Estratégicas, de programas y clasifican de acuerdo al sector que pertenecen:

Tabla 103 MUESTRA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

Estrategia De Desarrollo	Dimensión De Desarrollo	Apuesta De Desarrollo
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 “Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande”
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 “Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande”
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 “Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande”
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motora de la competitividad
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motora de la competitividad
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motora de la competitividad
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.3 Derecho humano a la alimentación, engrandece a Boyacá
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.3 Derecho humano a la alimentación, engrandece a Boyacá
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.1 Agua para todos, agua para la vida por una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.1 Agua para todos, agua para la vida por una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.4 Por el manejo sostenible de los residuos sólidos para una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.4 Por el manejo sostenible de los residuos sólidos para una Boyacá Grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande

FUENTE: DOCUMENTACIÓN DE SECRETARIAS DE PLANEACIÓN Y HACIENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Lo anterior, teniendo en cuenta la ordenanza 009 de fecha 01 de junio de 2024, por la cual se adopta el plan departamental de desarrollo de Boyacá y el plan – “Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024 – 2027”.

De acuerdo al seguimiento efectuado al plan de desarrollo “Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027”, en cuanto al cumplimiento del indicador en el cuarto trimestre

2025, presenta 380 con calificación sobresaliente, 96 en blanco, 73 en estado crítico, le sigue en estado crítico 53, en revisión 28, satisfactorio 9, bajo 5, medio 1 y sobre ejecución 0.

Para el desempeño acumulado a 2025, se presenta la siguiente calificación: sobresaliente 305 indicadores, sobre ejecución 123, critico 65, en blanco 44, bajo 13 y satisfactorio 8, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 104 CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2025

RANGO DE DESEMPEÑO CUARTO TRIMESTRE 2025		*RANGO DE DESEMPEÑO ACUMULADO A 2025*	
CONCEPTO	***No. INDICADORES***	***CONCEPTO***	***No. INDICADORES***
BAJO	5	BAJO	13
CRITICO	73	CRITICO	65
MEDIO	1	MEDIO	6
REVISIÓN	28	REVISIÓN	28
SATISFACTORIO	9	SATISFACTORIO	8
SOBRE EJECUCIÓN	0	SOBRE EJECUCIÓN	123
SOBRESALIENTE	380	SOBRESALIENTE	305
EN BLANCO	96	EN BLANCO	44
TOTAL	592	TOTAL	592

FUENTE: DOCUMENTACIÓN DE SECRETARIAS DE PLANEACIÓN Y HACIENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

El cumplimiento en lo que va del cuatrenio es del 76.33%, los recursos de inversión de la muestra alcanza un valor total de $98.185.154.408, de los cuales ICLD son por $4.033.624.822, ICDE por $16.650.939.270, SGP en Educación $0, SGP Salud por $14.584.796.813, SGP APSB por valor de $7.959.698.141, Recursos propios Entidades Descentralizadas $556.836.913, SGR por valor de $5.949.153.128, Gestión por $45.840.979.117, Cofinanciación $2.478.221, Otros recursos por $130.744.982, tal como se establece en el seguimiento a la muestra seleccionada, establecido en la siguiente tabla:

Tabla 105 SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2025

Estrategia De Desarrollo	Dimensión De Desarrollo	Apuesta De Desarrollo	ICLD	ICDE	SGP Educación	SGP Salud	SGP APSB	Recursos Propios Entidades Descentralizadas	Sistema General de Regalías - SGR	Crédito	Gestión	Cofinanciación	Otros Recursos	Total Inversión
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital	$ 91,939,662	$ 1,389,263,178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,743,567,750	$ -	$ -	$ 22,224,770,590
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41,614,600	$ -	$ -	$ 41,614,600
1. Tierra del conocimiento	1.1 Transformación, conectividad e innovación digital para una Boyacá Grande	1.1.2 Todos conectados por un Boyacá digital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000,000	$ -	$ -	$ 10,300,000,000
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica	$ 14,251,080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,251,080

1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,453,600	$ -	$ -	$ 15,453,600
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,840,000	$ -	$ -	$ 1,840,000
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,774,999	$ -	$ -	$ 18,774,999
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,564,370	$ -	$ -	$ 15,564,370
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000	$ -	$ -	$ 5,000,000
1. Tierra del conocimiento	1.5 Promoción de la investigación, desarrollo e innovación aplicada al territorio	1.5.1 Donde la tradición se fusiona con la innovación científica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 662,600	$ 662,600
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 "Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande"	$ 7,932,373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,800,000	$ 2,628,000	$ 40,360,373
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 "Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande"	$ 3,749,097	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,849,153,128	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,852,902,225
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.7 "Mejor maquinaria verde y agroindustria en un campo productivo para la Boyacá Grande"	$ 205,856,689	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 876,000	$ 206,732,689
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motor de la competitividad	$ 24,990,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,990,000
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motor de la competitividad	$ 81,060,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81,060,000
2. Tierra para Crecer y Productiva	2.1 Competitividad e innovación para una Boyacá Grande	2.1.9 La agroindustria motor de la competitividad	$ 17,320,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,320,000
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,588,353,500	$ -	$ -	$ 9,588,353,500
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa	$ 48,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48,000,000

	Boyacá Grande													
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa	$ 376,680,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 376,680,000
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa	$ 78,450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,450,000
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa	$ 182,161,365	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182,161,365
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000,000	$ 20,000,000
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.1 Por la Naturaleza biodiversa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000	$ -	$ 5,000,000
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible	$ 13,611,485	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,611,485
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible	$ 12,370,468	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,370,468
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible	$ 97,680,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97,680,000
3. Tierra Verde y Biodiversa	3.2 Conservación y protección de la riqueza natural de la Boyacá Grande	3.2.3 Por la Naturaleza viva y sostenible	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,657,707	$ 6,657,707
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,105,810,299	$ -	$ -	$ 5,105,810,299
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,700,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,700,000,000
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.1 Servicio de gas natural domiciliario asequible para una Boyacá más Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400,000,000
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables	$ -	$ -	$ -	$ 41,309,897	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41,309,897
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables	$ -	$ -	$ -	$ 59,847,926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59,847,926
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables	$ -	$ 154,758,592	$ -	$ 27,346,084	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182,104,676

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.2. Boyacá grande comprometida con los entornos saludables	$ -	$ -	$ -	$ 23,857,957	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,857,957
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.3 Derecho humano a la alimentación, engrandece a Boyacá	$ -	$ 35,821,638	$ -	$ 259,501,264	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295,322,902
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.3 Derecho humano a la alimentación, engrandece a Boyacá	$ -	$ 4,783,167	$ -	$ 38,265,531	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,048,698
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 27,752,320	$ -	$ 4,338,361	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,090,681
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ -	$ -	$ 50,450,224	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,450,224
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 40,025,800	$ -	$ 97,156,192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 137,181,992
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 3,799,063,903	$ -	$ 288,124,708	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,087,188,611
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 938,007,710	$ -	$ 222,540,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,160,547,710
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 163,674,531	$ -	$ 284,072,194	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 447,746,725
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 30,767,989	$ -	$ 458,824,015	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 489,592,004
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 5,075,415	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,075,415
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 6,767,219	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,767,219

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ 127,606,754	$ 71,088,664	$ -	$ 11,881,506,975	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,080,202,393
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ 8,301,524	$ 50,157,291	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,458,815
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 145,494,458	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 145,494,458
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 7,853,045,567	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,853,045,567
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ 16,172,030	$ 195,683,988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 211,856,018
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ 42,478,230	$ 175,266,441	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 217,744,671
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 1,057,606,798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,057,606,798
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ -	$ -	$ 19,088,785	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,088,785
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 12,147,408	$ -	$ 33,878,246	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,025,654
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 4,772,194	$ -	$ 68,983,631	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73,755,825
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ -	$ -	$ 122,221,532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122,221,532
4. Tierra para	4.1 Boyacá Grande: territorio	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención	$ -	$ 4,772,196	$ -	$ 33,405,372	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,177,568

Vivir Dignamente y Segura	saludable	integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad												
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 43,225,213	$ -	$ 74,943,418	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118,168,631
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 246,592,987	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 246,592,987
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ -	$ -	$ 34,243,788	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,243,788
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 46,986,736	$ -	$ 441,157,404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 488,144,140
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.1 Boyacá Grande: territorio saludable	4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad	$ -	$ 9,622,655	$ -	$ 19,733,309	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,355,964
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.1 Agua para todos, agua para la vida por una Boyacá Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,000,000
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.1 Agua para todos, agua para la vida por una Boyacá Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,000,000
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.4 Por el manejo sostenible de los residuos sólidos para una Boyacá Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,881,698,141	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,448,581,221	$ -	$ 10,330,279,362
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.4 Por el manejo sostenible de los residuos sólidos para una Boyacá Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,000,000
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande	$ 193,736,828	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193,736,828
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86,138,000	$ 86,138,000
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande	$ 821,724,799	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 821,724,799
4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura	4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado	4.3.12 Integración regional y ordenamiento territorial para la Boyacá grande	$ 1,034,800,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,034,800,000

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,891,340	$ 3,891,340
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,891,336	$ 3,891,336
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 2,541,960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,541,960
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999,999	$ 999,999
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande	$ 3,918,448	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,918,448
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,700,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,700,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,300,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,300,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ 62,709,036	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120,833,905	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183,542,941

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ 15,040,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,040,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,121,024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,121,024
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,670,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,670,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 1,197,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,197,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 1,197,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,197,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 7,666,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,666,600
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 1,197,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,197,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 598,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 598,500
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 1,197,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,197,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 1,197,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,197,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 1,197,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,197,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 1,196,998	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,196,998
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande	$ 1,673,632	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,673,632

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande	$ 7,290,830	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,290,830
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ 65,075,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 121,508,960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 186,584,360
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ 37,600,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,600,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,558,405	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,558,405
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,660,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,660,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 5,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 5,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 12,709,845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,709,845
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 4,793,475	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,793,475
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 12,463,035	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,463,035
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 14,380,425	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,380,425

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 5,752,170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,752,170
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 5,752,170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,752,170
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande	$ 58,740,140	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,740,140
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande	$ -	$ 138,715,212	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138,715,212
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,800,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,800,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,200,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,200,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ 65,075,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,377,240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95,452,640
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ 22,560,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,560,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,437,379	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,437,379
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ 19,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,000,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,670,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,670,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.1 Por una Boyacá grande, con acciones de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 5,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000

5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 5,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 19,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 19,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.1 Boyacá Grande: tierra del cuidado	5.1.2 Por la gestión social y la Red integral de cuidado y bienestar de Boyacá "Plan Abrigo	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 1,925,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,925,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 10,053,687	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,053,687
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 10,053,687	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,053,687
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 7,700,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,700,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ 3,850,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,850,000
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.1 Tierra que reconoce el interés superior y prevalente de las niñas, niños y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5. Tierra del Cuidado y la Inclusión	5.2 Boyacá no deja a nadie atrás	5.2.10 Fortalecimiento de los procesos culturales incluyentes de los grupos con enfoque diferencial y poblacional en Boyacá Grande	$ 1,950,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,950,000
TOTAL			**$ 4,033,624,822**	**$ 16,650,939,270**	$ -	**$ 14,584,796,813**	**$ 7,959,698,141**	**$ 556,836,913**	**$ 5,949,153,128**	$ -	**$ 45,840,979,117**	**$ 2,478,381,221**	**$ 130,744,982**	**$ 98,185,154,408**

Fuente: Secretaria Planeación- Gobernación De Boyacá- Información Complementaria.

12.3.CONCEPTO DEFINITIVO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2024, y reportado a la Contraloría General de Boyacá, comprende dieciséis (16) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución interna de planes de mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones de

mejoramiento implementadas por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ fueron **Efectivas** (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 80.00, como se evidencia en la siguiente tabla:

Según lo anterior la Gobernación de Boyacá cumple con acciones de mejora del Plan de Mejoramiento; con la salvedad de que los **hallazgos No. 3** PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, cuya acción de mejora era 3.1. Realizar Solicitud de concepto a la Contaduría General de la Nación, con el propósito de establecer el criterio contable que debe aplicarse para el registro de los bienes inmuebles del Departamento, precisando si debe reconocerse el valor histórico del bien o el valor determinado en el avalúo catastral vigente y metas 3.1 Determinar contable y financieramente la situación económica real de los bienes pertenecientes al Departamento, con el fin de prevenir cualquier sobrestimación o subestimación, así como **el hallazgo 4** de la cuenta 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES cuya acción de mejora era 4.1 Elaborar un Plan de Trabajo para realizar las acciones necesaria para la identificación catastral, jurídica y geográfica de la malla vial administrada por el Departamento de Boyacá - Secretaría de Infraestructura Pública. 4.2 Realizar actualización de las fichas de los monumentos históricos por parte de Desde la Secretaria General - Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos y cuya meta era 4.1.1. Actas de Reunión y compromisos. 4.1.2. Lista Control de Asistencia. 4.1.3. Informe Plan de Trabajo.
El **hallazgo 5** de la cuenta OTROS ACTIVOS cuya acción de mejora era 5.1 Solicitar a la Secretaria de Contratación las actas de liquidación de lo diferentes convenios y contratos que tienen anticipo, para realizar la respectiva amortización. 5.1. Verificación de valores reportados con soportes de las diferencias indicadas, y en caso de identificar las mismas, proceder al ajuste. Con unas metas de: 5.1. Informe de verificación soportado, y en caso de proceder ajuste, reporte de la nota de contabilidad y sus soportes. 5.2 Nota de Contabilidad 5.3. Formato FF-P49-F01 Seguimiento Amortización y Depuración de Contratos y Convenios a diciembre 2025 y el **hallazgo 11** de control interno relacionado con las acciones de mejora tales como: Elaborar las actas o constancias de cierre de los expedientes de contratación cuyos términos de garantía ya se encuentran vencidos, dejando registro documental conforme a la normatividad vigente, con metas como 11.1. Relación de contratos con actas de cierre elaboradas.11.2. Copias de actas o constancias de cierre firmadas.

12.4. CONTROL FISCAL INTERNO

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 47 INCONSISTENCIAS CONTROL INTERNO FISCAL.

CONDICIÓN: La Contraloría General de Boyacá, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales establecidas en el numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, las concedidas en el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015, en la Ley 87 de 1993 y en especial los requerimientos establecidos en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación; procede a conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno implementado en la Gobernación de Boyacá.

Para lo cual tomó como referente principal el informe de Control Interno vigencia 2025 y la Evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad vigencia 2025, elaborados y presentados a este Ente de Control como parte integral de la cuenta anual, y los informes solicitados por la Comisión Auditora en desarrollo del proceso auditor.
Se procedió al análisis y comparación de estos informes para determinar el nivel de implementación y cumplimiento de la administración de riesgos y el diseño de controles establecidos en cada uno de los procesos y procedimientos de la Gestión Presupuestal y Gestión Financiera y de Gestión de la Gobernación de Boyacá.

Ilustración 62

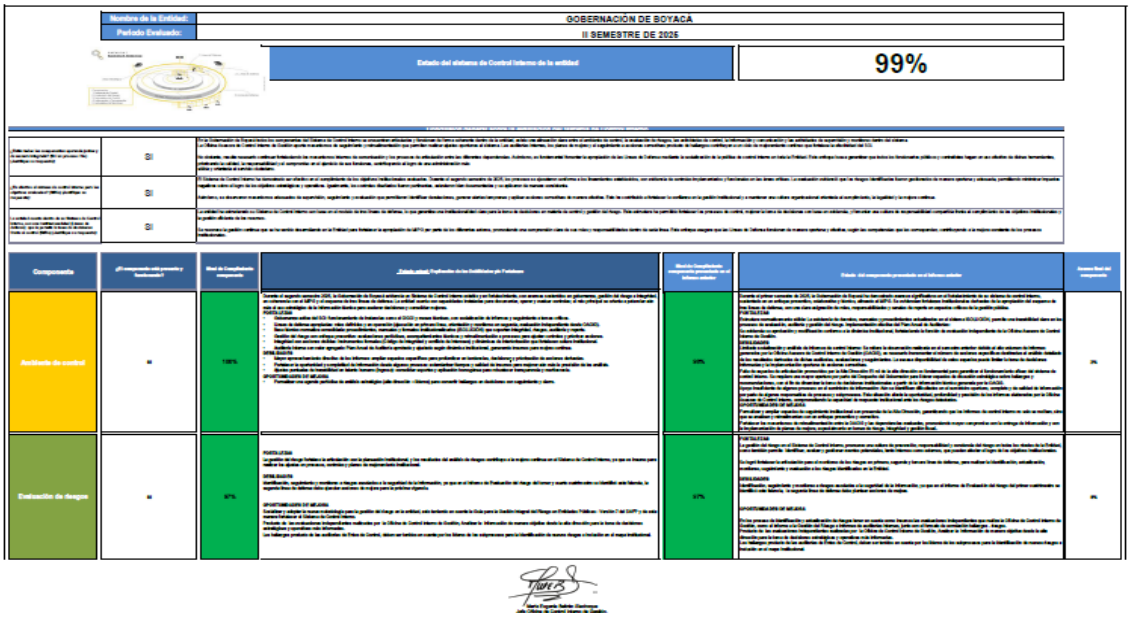


Ilustración 63



El puntaje de 99%, se advierte que el puntaje obtenido de esta evaluación ***no corresponde con la realidad***, ya que se presentan deficiencias que hacen que los riesgos continúen en los procesos realizados por la Entidad.

En el **ambiente de control** tiene en su evaluación un nivel de cumplimiento del 98%, no se ajusta a la realidad de la Gobernación toda vez que se presentan debilidades en la limitada socialización y análisis de informes de control interno, falta de espacios de articulación promovidos por la Alta Dirección, apoyo insuficiente de algunos procesos en el suministro de la información por parte de los responsables de procesos y subprocesos, así mismo la oficina asesora de control interno requiere de acreditación de personal de planta, a fin de que continúen con los procesos importantes que tienen que ver con el proceso auditor.

En la **Evaluación de riesgos** presentan en su evaluación un nivel de cumplimiento del 97% no ajustándose a la realidad de la Entidad, debido a que presenta debilidades tales como identificación, seguimiento y monitoreo a riesgos asociados a la seguridad de la información sin presenta mejora respecto a la vigencia anterior.

En las **actividades de control** presenta un nivel de cumplimiento del 100% es decir excelente, cuando la realidad de la Gobernación es diferente, en debilidades como para atender y asegurar el proceso de identificación de riesgos en cuanto a la seguridad de la información, de otra parte, debe realizar la actualización de las

tablas de retención documental a fin de establecer el tipo documental (Procesos presupuestal, financiero y de gestión).

En la **información y comunicación** en su evaluación se califican con el 96% cuando la realidad de la Entidad es diferente, presentando debilidades como: Falta de identificación en el procedimiento de identificación de las encuestas realizadas por la ciudadanía. Se encuentran Comités no logran sacar adelante los procesos establecidos por la Gobernación, por cuanto estos no se reúnen con la regularidad necesaria para cumplir con su plan estratégico. En cuanto a la publicación de la información externa no se da cumplimiento por la falta de seguimiento y control. A pesar de que cuentan con tecnología avanzada esta no está integrada en todos los procesos y su convergencia se realiza de forma manual lo que genera poca credibilidad en su producto. Poca publicidad y/o no es las más adecuada, generando baja participación ciudadana en la visualización de sus resultados para toma de decisiones.

En las **actividades de monitoreo** la calificación presentada es del 100%, lo que el grupo auditor pudo visualizar, es que no se ajusta a la realidad de la Institución toda vez que las sectoriales no cumplen como deberían su compromiso en cuanto a la entrega de la información, lo cual se presenta en un retroceso por parte de los controles establecidos, afectando su seguimiento y monitoreo.

Por otra parte, dentro del paquete de los módulos del sistema de información PCT se incluye en el Mapa de Riesgos del Subproceso de Gestión Contable, Financiera y Presupuestal la consideración del riesgo que dice “No representar fielmente y con oportunidad los hechos económicos de la Entidad", evento que se considera de alto impacto y que no permite determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto en caso de materializarse.

El Departamento de Boyacá cumple con diligenciar el Formato E-DO-DM-F 003 Monitoreo y Revisión de Riesgos de manera cuatrimestral. Sin embargo, aún no se realiza en todos los procesos, las actividades y dependencias que son fuentes de información para el proceso contable.

En el Manual de Políticas Contables A-GF-GI-M-005, se establecen puntos de control interno contable en cada una de las políticas, los cuales son relevantes para mejorar y garantizar la calidad de la información. Estos puntos de control interno deben aplicarse en todas las actividades relacionadas con la información contable.

En el sistema financiero PCT **NO** cuenta con el módulo de inventario, módulo de conciliación bancaria, por ende, hace que no se cumplen con los criterios

establecidos al momento de entrega de la información a los diferentes entes de control; corroborado por el concepto de la oficina de Control Interno de la Gobernación de Boyacá.

CRITERIO: Ante las deficiencias reseñadas anteriormente, se identifica una posible vulneración de:

Los literales a), d), e), y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 [*por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones*].

También, a lo definido en los numerales 1, 3 y 41 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019 [*por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario]*.

Además, de acuerdo con el artículo 3 y el literal a., del artículo 5 de la ley 1712 de 2014 [*por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*], las entidades públicas deben garantizar el derecho de acceso a la información como parte del proceso de gestión de la información pública.

Adicionalmente, se da incumplimiento al Decreto 035 del 28 de enero del 2021, por medio del cual se reglamenta y modifica el Decreto de aprobación del MIPG y por tal el Sistema de Administración de Riesgos de la Gobernación de Boyacá.
El incumplimiento de la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de julio de 2008 y Ley 1474 de 2011.

CAUSA: Inefectividad en el seguimiento de riesgos y aplicación de controles o no aplicación de los mismos para ejecutar el proceso financiero de una forma efectiva, ausencia de medidas tendientes a la verificación periódica del cumplimiento de las políticas contables adoptadas por la entidad, así como ineficacia del comité de coordinación de control interno de la Entidad Territorial.

EFECTO: Información financiera con deficiencias e inobservancia de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, como autoridad reguladora de la contabilidad pública.

Una vez verificada la información allegada por la Gobernación de Boyacá, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se acepta las explicaciones realizadas, pero las acciones tomadas por esta oficina no dan los resultados acordes con la

realidad de la Gobernación de Boyacá, por lo tanto, así las cosas, la observación se configura como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 47** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

12.5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

La Contraloría General de Boyacá en ejercicio de las facultades asignadas en el Artículo 272 de la Constitución Política, Ley 330 de 1996, Ley 42 de 1993 y atendiendo lo establecido en la Resolución del 494 de Julio de 2017, mediante la cual se reglamentó el proceso de auditoría, examinó la información que como cuenta consolidada la Gobernación de Boyacá, rindieron los responsables fiscales por transferencia de datos a través del Sistema Integral de Auditorias – SIA e información complementaria allegada en medio magnético, con el propósito de emitir pronunciamiento integral y articulado sobre la misma. El pronunciamiento consta de una opinión sobre las variables de ***oportunidad, suficiencia y calidad*** de la información suministrada en los diferentes formatos y anexos constitutivos de la cuenta consolidada.

Dando aplicación a la Resolución N° 494 de 2017, la cual regula la rendición electrónica de cuentas ante la Contraloría General de Boyacá, el municipio de Nobsa reportó la información de la vigencia 2025 de manera oportuna.

Verificada la información contenida en el link estado de Rendición de Formatos vigencia 202507 del Sistema Integral de Auditoria – SIA, se observa que la Gobernación de Boyacá no tiene faltante en la presentación de formatos. En virtud de la Resolución Nº 494 del 24 de julio de 2017, en el proceso de revisión se presenta una síntesis del estado de cada uno de los formatos analizados.

La Gobernación De Boyacá rindió la cuenta de la vigencia 2025, dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Boyacá, a través de la Resolución No 494 de 2017, “Por medio de la cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de Boyacá”.

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto **Favorable** de acuerdo, con una calificación de 81.4 tal como se indicó en el numeral 5.6

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Planeación y Programación Presupuestal

Dentro de las consideraciones de la ordenanza 038 de Diciembre del 2024 por la cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos, de la Gobernación de Boyacá en cuantía de $1.748.662.757.339, y describe la preparación y elaboración del proyecto de presupuesto de la vigencia 2025, partiendo de la realización de estimaciones y proyecciones de ingresos y gastos atendiendo al comportamiento mensual de los ingresos y rentas de la Gobernación de Boyacá y a las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno Nacional en el especial el crecimiento del IPC esperado a 31 de Diciembre y todas las consideraciones técnicas descritas en el marco fiscal de mediano plazo 2025-2035. Por otra parte, se verifica que, para la preparación, presentación, aprobación, liquidación, ejecución y cierre del presupuesto de la Gobernación se aplicaron los principios y normas presupuestales según lo establecido en Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras.

Se verificó que la ordenanza 038 de diciembre del 2024 de la Gobernación de Boyacá para *la vigencia fiscal 2025*", contiene las tres partes descritas en el Artículo 11 del Decreto 111 de 1996 como son: El presupuesto de rentas, El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, Disposiciones generales. Revisado el Decreto No 1200 de diciembre de 2024 "*Por medio del cual se liquida el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos* de la Gobernación *para la vigencia fiscal 2025*", se comprobó que esta discriminado al máximo nivel y clasificado de acuerdo a la naturaleza de la Entidad, utilizando la nomenclatura CHIP – CGR O FUT o Nueva Codificación de Estandarización, impartida por la Contraloría General de la Republica.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 48 INCONSISTENCIAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 106 CUADRO COMPARATIVO Y FORMATOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	ACTO ADMON	FORMATO F06_AGR	FORMATO F07_AGR	FORMATO F08A_AGR	FORMATO F08B_AGR
INICIAL (ORDENANZA 038 DE DICIEMBRE 2024)	1,699,859,308,888	1,699,859,308,888	1,699,859,308,888		
ADICIONES	1,366,535,752,456	1,414,022,027,464	1,366,535,752,456	1,414,022,027,464	1,366,535,752,456
REDUCCIONES	14,493,427,588	91,886,752,235	14,493,427,588	91,886,752,235	44,400,477,228
CREDITOS	849,771,129,145	0	849,771,129,145	0	849,771,129,145
CONTRACREDITOS	849,771,129,145	0	849,771,129,145		849,771,129,145
DEFINITIVO	***3,051,901,633,757***	***3,021,994,584,117***	***3,051,901,633,757***	***1,322,135,275,229***	***1,322,135,275,229***
DIFERENCIA ACTOS ADTIVOS EJECUCIONES SIA	0	29,907,049,639	0	0	0
DIFERENCIA ACTOS ADTIVOS MODIFICACIONES SIA	0	0	0	-47,486,275,007	0

Fuente: Actos administrativos Ejecución presupuestal de ingresos, gastos modificaciones. - SIA CONTRALORIAS.

CONDICIÓN: Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó el presupuesto de la Gobernación de Boyacá para la vigencia 2024 en la suma de $**1.699.859.308.888** mediante la ordenanza No 038 de diciembre del 2024**,** y se modificó con la adición en la suma de $**1.366.535.752.456** y reducido en $**14.493.427.588** para un presupuesto definitivo **$3.051.901633.757,** información que se confrontó con la reportada en el formato F06_AGR ejecución presupuestal de ingresos donde revelan un presupuesto inicial en cuantía de $**1.699.859.308.888** con adiciones por valor de $**1.414.022.027.464** y reducciones por valor de $91.886.752.435 para un presupuesto definitivo de $**3.021.904.584.177** y con el formato FO7-AGR ejecución de egresos donde revelan un presupuesto inicial en cuantía de $**1.699.859.308.888** con adiciones por valor de $**1.366.535.752.456** y reducciones por valor de $**14.493.427.588** para un presupuesto definitivo de $**3.051.901633.757**, presentándose diferencia de $**29.907.047.639**, y 47.486.275.007 entre el presupuesto inicial aprobado por la ordenanza No 038 y sus modificaciones y los formatos F06_AGR, F07_AGR.

CRITERIO. Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución No. 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá, Articulo 14 Parágrafo 2. Parágrafo 3, en cuanto se refiere a la veracidad de la Información.

CAUSA. Los reportes al SIA entre los actos administrativos y los formatos F06_AGR, F07_AGR son inconsistentes.

EFECTO. Determina que la información rendida por el ente territorial no sea confiable y veraz.

Aunque la respuesta está bien sustentada, la comisión auditora considera que las cuentas por pagar de vigencias anteriores, debiera constituirse como pasivos exigibles vigencias expiradas, y formar parte de la ejecución presupuestal, dentro de este grupo, por tanto, se ratifica la observación, como un **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 48** para que sea incluido en el plan de mejoramiento

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 49 INCONSISTENCIAS EJECUCIÓN DE INGRESOS.

Ejecución Presupuestal de Ingresos

Tabla 107 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO	*FORMATO F06_AGR*	*FORMATO F06_CDN*	*FORMATO F03_CDN*
INGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA	2,220,461,843,933	1,704,516,553,087	1,750,619,801,863
MENOS INGRESOS SSF	**451,393,688,080**	**0**	**0**
INGRESOS SSF	235,642,308,314	0	0
Recursos del balance	215,751,379,766	0	0
INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA	***1,769,068,155,853***	***1,704,516,553,087***	***1,750,619,801,863***
DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F06A_CDN	0	64,551,602,766	0
DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F03_CDN	0	0	18,448,353,990
DIFERENCIAS FORMATO F06A:CDN Y F03_AGR	0	0	-46,103,248,776

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos, Formatos F06-AGR- F06A_CDN y F03_CDN SIA CONTRALORIAS.

CONDICIÓN: Según la información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal de ingresos, de la Gobernación de Boyacá, presenta un total de ingresos acumulados por valor de $**2,220,461,843,933**, de los cuales descontamos la suma de $**451,393,688,080, (**reportada por la Gobernación de Boyacá**)** correspondiente a ingresos sin situación de fondos, y recursos del balance quedando ingresos efectivos por $ ***1,769,068,155,853***, valor que no guarda o coherencia con el valor reportado en el formato F06_CDN Relación de Ingresos, que registra ingresos efectivos por valor de $***1,704,516,553,087*** presentándose diferencia por valor de ***$*64,551,602,766** *entre ambos formatos*.

En el formato F03_CDN Movimiento de Bancos, se registran Ingresos efectivos por valor de $***1,750,619,801,863*,** presentándose diferencia de ***$*18,448,353,990 *con el formato* F*06_AGR,*** Igualmente se presenta diferencia de $**46,103,248,776** entre los formatos F*03_agr,* F*06-CDN.*

CRITERIO. Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución No. 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá,

CAUSA: Los reportes al SIA de los formatos F*06_AGR,* F*06A_CDN* y el formato ***F03_CDN*** son inconsistentes.

EFECTO: Determina que la información rendida por el ente territorial no sea confiable y veraz.

La diferencia establecida en la revisión de la cuenta, se determinó entre los actos administrativos, y el formato ejecución de ingresos F06_AGR, relación de ingresos F06A_CDN, y el movimiento de bancos F03_CDN, en la respuesta explican el movimiento presupuestal de ingresos, que corresponde al formato F06_AGR y no aclara la diferencia establecida, con los actos administrativos, por tanto, se considera que no existe respuesta concreta a este numeral. Por esta razón se ratifica la observación y se deja como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 49** para que sea incluido en el plan de mejoramiento.

Ejecución Presupuestal de Egresos

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 50 INCONSISTENCIAS EJECUCIÓN GASTOS.

Tabla 108 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CONCEPTO	FORMATO F07_AGR_AGR	FORMATO F07B_CDN	FORMATO F03_CDN
EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA	2,538,338,724,500	2,148,714,469,368	1,723,968,663,867
MENOS EGRESOS NO EFECTIVOS	**274,093,009,356**	**274,093,009,356**	**0**
Gastos no efectivos (sin situación de fondos)	274,093,009,356	274,093,009,356	0
Reserva Presupuestal			63,580,747,264
Cuentas por pagar			29,773,948,903
EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA	***2,264,245,715,144***	***1,874,621,460,012***	***1,817,323,360,034***
DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F07B_CDN	0	389,624,255,132	0
DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F03_CDN_CDN	0	0	446,922,355,110

Fuente: SIA CONTRALORIAS - Información Complementaria.

CONDICIÓN: Según la información reportada en el formato F07_AGR- ejecución presupuestal de Egresos, de la Gobernación de Boyacá, presenta un total de Egresos acumulados por valor de $ 2,168,880,315,886, de los cuales descontamos la suma de $524.022.839**, (**reportada por la Gobernación de Boyacá**)** correspondiente a egresos sin situación de fondos, quedando egresos efectivos por $***2.168.356.293.047***, valor que no guarda coherencia con el formato F07_CDN Relación de egresos, que registra egresos efectivos por valor de $***377.820.732.377*** presentándose diferencia por valor de ***$***1.790.535.560.670 *entre ambos formatos*.

Así mismo, se constató que en el Formato_F03_CDN, se registraron y reportaron egresos efectivos por la suma para un total de $986.499.606.316**,** valor que al confrontarlo con egresos efectivos reportados en el formato F07_AGR ejecución de egresos por $***2.168.356.293.047*** , originando una diferencia por la suma de $1.181,856,686,731 la cual no fue posible identificar a que corresponde y , ocasionada en el mal diligenciamiento del aludido formato y por ende en el incumplimiento de la Resolución No.494 de 2017.

CRITERIO: Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución No. 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá.

CAUSA: Los reportes al SIA de los formatos F*06_AGR,* F*06A_CDN* y el formato ***F03_CDN*** son inconsistentes,

EFECTO: Determina que la información rendida por el ente territorial no sea confiable y veraz.

La respuesta no explica satisfactoriamente las diferencias encontradas en la revisión de la cuenta, entre los formatos F07_AGR, F07b_CDN y F03_AGR, por valores de $389,624,255,132, y $446,922,355,110 tanto no se acepta la respuesta y se deja como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 50** para ser incluido en el plan de mejoramiento.

EVALUACION GESTION FISCAL GASTOS

Con el propósito de evaluar la Gestión Fiscal del Gasto a continuación se aplican los siguientes indicadores:
Total Compromisos / Total Presupuesto definitivo

= $2.106.871.743.918.08/ $2.538.338.724.500.26 = 84.00%

Del total del presupuesto definitivo se comprometió el 84.00% quedando por ejecutar un 18%.

Total Obligaciones / Apropiación definitiva
= $2.106.871.743.918.08/ $3.021.994.584.117.18 = 69.72%

Del total de presupuesto definitivo se adquirieron obligaciones por el 69.72% situación que se traduce en una gestión aceptable.

GESTIÓN PRESUPUESTAL.

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 51 INCONSISTENCIAS CONCILIACIÓN RECURSOS.

CONDICIÓN: Según la información reportada en la plataforma SIA contraloría, con la cual se realizaron las operaciones donde se obtuvo el resultado de los ingresos efectivos en cuantía de $1,769,068,155,853 y de los egresos efectivos por $**1,810,684,231,300** con el fin de conciliar los recursos, se encontró diferencia de $**68,267,238,803.**

Tabla 109 CONCILIACIÓN DE RECURSOS

SALDO ANTERIOR (31/12/2024)	396,245,554,811	
INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA	1,769,068,155,853	
TOTAL DISPONIBLE		2,165,313,710,664
PAGOS DE LA VIGENCIA	1,780,910,282,397	
PAGOS CUENTAS POR PAGAR	29,773,948,903	
(-) TOTAL EGRESOS		1,810,684,231,300
SALDO EXIGIBLE		354,629,479,364
SALDO DISPONIBLE		422,896,718,167
DIFERENCIA		-68,267,238,803

FUENTE: SIA CONTRALORIAS - Comisión de Auditoría.

CRITERIO: Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución No. 494 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de Boyacá.

CAUSA: Los reportes al SIA de los formatos F*06_agr,* F*06a_CDN* y el formato ***F03_CDN*** son inconsistentes.

EFECTO: Determina que la información rendida por el ente territorial no sea confiable y veraz.

La respuesta no explica satisfactoriamente las diferencias encontradas en la revisión de la cuenta, entre los formatos F07_AGR, F07b_CDN y F03_AGR, por valores de **$-68,267,238,803**, por tanto, no se acepta la respuesta y se deja como **HALLAZGO DE AUDITORIA No. 51** para ser incluido en el plan de mejoramiento

Cierre Fiscal

Tabla 110 CIERRE FISCAL

CODIGO	NOMBRE	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EXIGIBILIDADES Y RESERVAS	SUPERÁVIT O DÉFICIT
VAL	CIFRA DE CONTROL	537,933,196,327	430,829,071,732	107,104,124,595
C	TOTAL	537,933,196,327	430,829,071,732	107,104,124,595
C.1	RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	143,267,421,502	140,442,882,739	2,824,538,763
C.1.2	INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES AL SGP DE LIBRE DESTINACIÓN	143,267,421,502	140,442,882,739	2,824,538,763
C.2	RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	278,481,997,738	246,284,034,527	32,197,963,211

C.2.2	+	19,988,747,385	9,792,158,237	10,196,589,148
C.2.2.2	ESTAMPILLAS	19,988,747,385	9,792,158,237	10,196,589,148
C.2.2.2.01	ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DE ADULTO MAYOR	1,489,929,458	545,160,809	944,768,649
C.2.2.2.02	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,667,735,651	2,032,058,281	635,677,370
C.2.2.2.04	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	7,555,871,570	4,558,014,786	2,997,856,784
C.2.2.2.06	ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	8,275,210,706	2,656,924,361	5,618,286,345
C.2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIFERENTES AL SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA CONSTITUCIONAL Y LEGAL	95,900,740,290	76,554,014,941	19,346,725,349
C.2.3.3	DEMÁS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT DEL GOBIERNO GENERAL CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL	95,900,740,290	76,554,014,941	19,346,725,349
C.2.4	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - CUENTAS MAESTRAS	107,846,136,890	31,862,015,130	75,984,121,760
C.2.4.1	SGP-EDUCACIÓN-PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44,614,060,843	31,573,633,202	13,040,427,641
C.2.4.2	SGP-EDUCACIÓN-CANCELACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	2,233,827,029	288,381,928	1,945,445,101
C.2.4.10	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	60,998,249,018	-	60,998,249,018
C.2.5	RECURSOS DE CAPITAL	54,746,373,173	128,075,846,219	(73,329,473,046)
C.2.5.2	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	54,746,373,173	128,075,846,219	(73,329,473,046)
C.3	FONDOS ESPECIALES	116,183,777,087	44,102,154,466	72,081,622,621
C.3.1	FONDO LOCAL DE SALUD	104,727,735,385	34,771,105,906	69,956,629,479
C.3.1.1	CUENTA MAESTRA RÉGIMEN SUBSIDIADO	7,788,200,471	-	7,788,200,471
C.3.1.2	CUENTA MAESTRA SALUD PÚBLICA COLECTIVA	47,309,119,745	14,115,404,898	33,193,714,847
C.3.1.3	CUENTA MAESTRA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OFERTA	26,716,581,897	3,777,784,193	22,938,797,704
C.3.1.4	CUENTA MAESTRA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSIÓN	22,202,840,610	16,875,793,379	5,327,047,231
C.3.1.8	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	710,992,662	2,123,436	708,869,226
C.3.3	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	10,695,196,535	9,331,048,560	1,364,147,975
C.3.4	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO	760,845,167	-	760,845,167

Fuente: Cierre fiscal CHIP

Para determinar el resultado de la ejecución presupuestal de la Gobernación de Boyacá de la vigencia 2025, del presupuesto definitivo por la suma de $**3.051.901633.757** se tomaron el total de disponibilidades por valor de $**537,933,196,327** menos **total exigibilidades y reservas** por valor de $**430,829,071,732** lo cual nos arroja un superávit presupuestal por la suma de $**107,104,124,595**, el cual se dio porque no se ejecutó en su totalidad los gastos presupuestados, es así que en los gastos de recursos corrientes de libre destinación no se ejecutó la suma de $**2,824,538,763** que equivale al 0.13% del total presupuestado en este capítulo y en los gastos de inversión recursos con destinación especifica se dejó de ejecutar la suma de $32,197,963,211**,** que equivale al 12.79% y en fondos especiales se dejó de ejecutar la suma de $72,081,622,621 que equivale al 4.82% del total apropiado en inversión, lo cual denota eficiencia en la planeación y gestión para el logro de los objetivos propuestos en la programación y ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia. Las cifras anteriores indican que los indicadores de ejecución de la inversión es optima cómo se puede observar la cifra que quedo sin ejecutar no es representativa lo cual conlleva a determinar que la administración departamental cumplió con lo establecido en el decreto 111 Articulo 89 que dice "*Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva".*

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 52 AUSENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y DEFICIENTE CORDINACIÓN, ENTRE OTRAS.

CONDICIÓN: De la evaluación realizada dentro de este proceso de Auditoría, no resulta conforme en los aspectos significativos y frente a los criterios aplicados en los procedimientos evidenciados por el Equipo Auditor, los cuales se resumen en:

El desorden administrativo, ausencia de seguimiento y control, y deficiente coordinación entre las dependencias que originan, tramitan y reportan la contratación institucional, obstaculizan la consolidación de la información sobre los contratos y recursos que se comprometen en cada vigencia fiscal, impidiendo su reporte a las autoridades de manera oportuna y completa.

Fueron notorias las debilidades en las labores de supervisión, debido a que no se hizo control eficaz y oportuno, para asegurar que la ejecución de los contratos examinados se desarrolle observando las condiciones establecidas en el convenio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines perseguidos, en condiciones de economía y eficiencia en cuanto a la utilización de los recursos públicos destinados con ocasión del desarrollo de este tipo de iniciativas ambientales.

En el ejercicio, se evidencio que se carece de una planeación para acciones posteriores de mantenimiento y monitoreo de los procesos de restauración ecología, en clara inobservancia de los protocolos establecidos, lo cual genera incertidumbre para la supervivencia de las plantaciones, poniendo en riesgo el propósito de restablecer los ecosistemas degradados, respecto de su composición, estructura y funcionamiento para garantizar la conservación de especies del ecosistema en general y de la mayoría de sus servicios ecosistémicos asociados.

La falta de control y seguimiento al proceso de archivo, que de conformidad con los postulados de la Ley 594 de 2000, obliga a la entidad a la conformación de los expedientes y unidades documentales, expone deficiencias, que generan riesgo de pérdida o de exclusión de documentos y actuaciones que se gestionan en desarrollo del proceso contractual, afectando su ordenación, conservación, acceso y consulta, permitiendo, además que no se asegure el control de las unidades documentales en sus diferentes etapas

CRITERIO: Aplicación parcial de Ley 152 de 1994, 3°Principios Generales literal J, Decreto 1011 de 2006, Resolución 710 de 2012, y las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social

CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento a las actividades prescritas en los programas del municipio

EFECTO: Conlleva a que el porcentaje de cumplimiento de los contratos no muestren la realidad en la ejecución

No se presentó respuesta, por tanto, se deja como **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 52** para que sea incluido en el plan de mejoramiento**.**

13. RELACIÓN DE HALLAZGOS

ADTIVO: Administrativo **DISC:** Disciplinario **FISCAL:** Fiscal **PENAL:** Penal **SANC:** Sancionatorio

Cuadro 5

No.	DESCRIPCIÓN	ADTVO (Sin Incidencia)	DISCP	FISCAL (Cuantía $)	PENAL	SANC
ATENCIÓN DE DENUNCIAS						
1	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0657 DE 2025.	X				
2	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3261 DE 2025.	X				
3	HALLAZGO DE AUDITORIA No 3 CONTRATO No. 3564 DE 2023.	**X**				
MACROPROCESO FINANCIERO						
4	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 4 POR LA NO PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO.	X				
5	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 5 CUENTA 11 EFECTIVO CON INCONSISTENCIAS EN SOBRESTIMACIONES Y SUBESTIMACIONES	X				
6	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 6 CUENTA 13 CUENTAS POR COBRAR CON INCONSISTENCIAS EN SOBRESTIMACIONES.	X				
7	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 7 CUENTA 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CON INCONSISTENCIAS EN SOBRESTIMACIONES Y SUBESTIMACIONES.	X				
8	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 8 DE LA CUENTA 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- LOS CONTRATOS Nos.: SMC-GB-005-2023 y 4159 DE 2024 SOBRE AVALÚOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.		x			
9	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 9. CUENTA 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES PRESENTA INCONSISTENCIAS EN SUBESTIMACIONES.	X				
10	HALLAZGO DE AUDITORIA No.10. CUENTA 19 OTROS ACTIVOS PRESENTA INCONSISTENCIA EN SUBESTIMACIÓN.	X				
11	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11. CUENTA 23 PRESTAMOS POR PAGAR PRESENTAN INCONCISTENCIAS	X				
12	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 12. OPERACIONES RECIPROCAS PRESENTAN INCONSISTENCIAS.	X				
13	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13. CONTROL INTERNO CONTABLE PRESENTA INCONSISTENCIAS.	X				
MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS						
14	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14 GASTOS DE INVERSION INFERIOR AL 80%.	X				
15	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 15 INCONSISTENCIAS EN RESERVAS PRESUPUESTALES.	X				
16	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 16 INCONSISTENCIAS EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL VIGENIA ANTERIOR	X				
GESTIÓN CONTRACTURAL						

17	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 17. FALTA PROCEDIMIENTO CIERRE CONTRACTUAL.	X				
18	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 18 CONVENIO 2344/2024 CON INCONSISTENCIAS	X				
19	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 19 CONVENIO 3848/2024 DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA	X				
20	OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 CONVENIO 4003/2024 CON INCONSISTENCIAS.	X				
21	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 21 CONVENIO 4270/2024 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.		X			
22	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 22 CONVENIO 4362/2024 CON INCONSISTENCIAS.	X				
23	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 23 CONVENIO 4394/2024 CON INCONSISTENCIAS.	X				
24	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 24 CONVENIO 4503/2024 CON INCONSISTENCIAS.	X				
25	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 25 CONVENIO 4586/2024 CON INCONSISTENCIAS.	X				
26	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 26 CONVENIO 4722/2024 CON INCONSISTENCIAS.	X				
27	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 27 CONVENIO 2094/2023 CON INCONSISTENCIAS.	X				
28	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 28 CONTRATO 1791/2024 CON INCONSISTENCIAS.	X				
29	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 29 CONTRATO 0108/2025 CON INCONSISTENCIAS.	X				
30	OBSERVACION DE AUDITORIA No. 30 CONTRATO 0111/2025 CON INCONSISTENCIAS.	X				
31	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 31 CONVENIO 0177/2025 CON INCONSISTENCIAS.	X				
32	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 32 CONTRATO 185/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.		X			
33	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 33 CONTRATO 0253/2025 CON INCONSISTENCIAS.	X				
34	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 34 CONTRATO 0369/2025 CON INCONSISTENCIAS	X				
35	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 35 CONTRATO 0514/2025 CON INCONSISTENCIAS.	X				
36	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 36 CONTRATO 0537/2025 CON INCONSISTENCIAS.	X				
37	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 37 CONTRATO 0845/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA		X			
38	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 38 CONTRATO 1019/2025 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA		X			
39	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 39 CONTRATO 1161/2025 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA		X			
40	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 40 CONTRATO 7545046/1163 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.		X			
41	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 41 CONTRATO 1179/2025 PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA		X			
42	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 42 CONTRATO 1299/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA		X			
43	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 43 CONTRATO 1529/2025 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.		X			
44	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 44 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.		X			
45	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 45 VARIOS CONVENIOS PAE – CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.		X			
46	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 46 FICHA TÉCNICA DE INVERSIÓN AMBIENTAL INCONSISTENCIA EN LA PRESENTACIÓN (EXCEL)	X				
CONTROL FISCAL INTERNO						
47	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 52 INCONSISTENCIAS CONTROL INTERNO FISCAL.	X				
REVISION CUENTA						

48	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 47 INCONSISTENCIAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	X				
49	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 48 INCONSISTENCIAS EJECUCIÓN DE INGRESOS.	X				
50	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 49 INCONSISTENCIAS EJECUCIÓN GASTOS.	X				
51	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 50 INCONSISTENCIAS CONCILIACIÓN RECURSOS.	X				
52	HALLAZGO DE AUDITORIA No. 51 AUSENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y DEFICIENTE CORDINACIÓN, ENTRE OTRAS.	X				
	TOTAL HALLAZGOS	**40**	**12**	**0**	**0**	**0**

Fuente: Grupo Auditor – Documentos Gobernación de Boyacá – SIA CONTRALORÍAS – SECOP II SIA OBSERVA- CHIP CONTADURIA

EQUIPO AUDITOR

MYRIAM L. ARCHILA DE REINA
Auditor - Líder de Auditoría

SALVADOR PEÑA CORTES
Auditor

JOSE DOMINGO SALAZAR NIÑO
Auditor
